

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**Рекомендации по реализации проектов
государственно-частного партнерства.
Лучшие практики**

Москва, 2016

Оглавление

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.....	5
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6
1. ВВЕДЕНИЕ.....	6
2. СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА	7
2.1. Закон о КС и Закон о ГЧП. Ключевые отличия.....	9
2.2. Модели реализации проектов ГЧП.....	12
2.3. Федеральные подзаконные акты.....	13
2.4. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (рекомендации).....	14
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	16
3. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления на различных этапах реализации проекта	16
4. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА (КОНЦЕДЕНТА).....	18
III. СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП (МЧП) И КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ	21
5. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЙ	21
5.1. Стороны СГЧП (СМЧП).....	21
5.2. Стороны КС.....	22
6. ОБЪЕКТЫ КС И СГЧП (СМЧП).....	23
7. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЙ	24
8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА РИСКОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В СОГЛАШЕНИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП	26
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КС И СГЧП (СМЧП).....	28
10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОБЪЕКТ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КС, СГЧП (СМЧП), ОБРЕМЕНЕН ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ	30
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СГЧП (СМЧП) И КС.....	31
11. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	31
11.1. Банковское кредитование	31
11.2. Выпуск облигаций.....	32
11.3. Бюджетное софинансирование	32
12. ПРЯМЫЕ СОГЛАШЕНИЯ	33
V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О ГЧП	35
13. ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП ПО ЗАКОНУ О ГЧП	35
14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	35

15. ОЦЕНКА ПРОЕКТА	35
15.1. Общая схема запуска проекта	35
15.2. Рассмотрение предложения публичным партнером	36
15.3. Рассмотрение предложения уполномоченным органом	37
15.3.1. Оценка эффективности и определение сравнительного преимущества	37
15.3.2. Переговоры с уполномоченным органом	40
16. РЕШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП / МЧП	41
17. ОТБОР ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА	41
17.1. Проведение конкурса	41
17.2. Совместный конкурс	42
17.3. Заключение соглашения без конкурса	43
18. ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА	44
18.1. Общая концепция	44
18.2. Предварительные переговоры	46
18.3. Направление предложения	47
18.4. Рассмотрение предложения публичным партнером	47
18.5. Переговоры с публичным партнером	48
18.6. Особенности принятия решения о реализации проекта	49
18.7. Сбор заявок на участие в конкурсе	49
19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП	51
20. МОНИТОРИНГ СГЧП (СМЧП)	54
21. КОНТРОЛЬ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП	57
VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О КС	59
22. ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	59
23. ЧАСТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ ИНИЦИАТИВА (ЧКИ)	60
24. ОТБОР КОНЦЕССИОНЕРА	62
24.1. Проведение конкурса	62
24.2. Совместный конкурс	62
24.3. Заключение концессионного соглашения без конкурса	63
25. МОНИТОРИНГ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	64
26. КОНТРОЛЬ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	65
VII. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ	66
27. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА	66
27.1. Особенности в социальной сфере	67
27.2. Особенности в сфере здравоохранения	67
27.3. Особенности в автомобильной сфере	68

27.4. Особенности в сфере ЖКХ.....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	75
СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК.....	96
а) Проект – 6-й этап строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (Тверская и Новгородская области).....	96
б) Проект – Создание центра малой авиации (Калужская область).....	100
в) Проект – Создание крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест (Ульяновская область).....	104
г) Проект – Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в городе Отрадное Кировского муниципального района (Ленинградская область).....	108
д) Проект – Реконструкция зданий детских комбинатов (Новосибирская область).....	114
е) Проект – Реконструкция детского сада (Пермский край).....	118
ж) Проект – Реконструкция помещений в здании роддома (Новосибирская область).....	123
з) Проект – Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. Самара.....	128
и) Проект – Реконструкция полотняного завода (Калужская область).....	133
к) Проект – Создание Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества в городе Ижевске (Удмуртская Республика).....	139
СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ ЖКХ.....	144
Водоснабжение/водоотведение.....	144
а) Проект - Водоканал в г. Санкт-Петербурге.....	144
б) Проект - Водоканал в г. Тверь.....	145
Водоотведение.....	146
в) Проект - Системы водоснабжения и водоотведения г. Волгограда.....	146
Теплоснабжение.....	147
г) Проект - Твердотопливная биокотельная в д. Тургенево Владимирской области.....	147
Твердые бытовые отходы.....	149
д) Проект - Полигон ТБО в г. Новочебоксарск.....	149
ВОПРОС-ОТВЕТ.....	151
i. Блок вопросов об объектах СГЧП (СМЧП) и КС.....	151
ii. Блок вопросов о полномочиях публичной стороны.....	153
iii. Блок вопросов об участии в проектах ГУП и МУП.....	154
iv. Блок вопросов о частной инициативе.....	156
v. Блок вопросов о конкурсных процедурах.....	161

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации

ВзК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации

ВК РФ - Водный кодекс Российской Федерации

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации

ГЧП (МЧП) – государственное-частное партнерство (муниципально-частное партнерство)

Закон о ГЧП - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закон о КС - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации

КС – концессионное соглашение

Концессионный проект – проект, планируемый для реализации совместно концедентом и концессионером на основе КС

ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации

МО - муниципальные образования

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

Публичная сторона – публичный партнер по СГЧП (СМЧП) / концедент по КС

РФ - Российская Федерация

СГЧП (СМЧП) – соглашение о государственно-частном партнерстве (соглашение о муниципально-частном партнерстве)

ФЗ «О морских портах» - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ФЗ «Об автомобильных дорогах» - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Частная сторона (частный инвестор, бизнес) – частный партнер по СГЧП (СМЧП) / концессионер по КС

Частный инициатор проекта - лицо, выступающее с инициативой заключения СГЧП (СМЧП) или КС

Иные термины и обозначения, приведенные в рекомендациях, соответствуют определениям, приведенным в Законе о ГЧП и Законе о КС.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

Представленные рекомендации подготовлены Минэкономразвития России в целях обеспечения методического содействия субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в применении норм законодательства в сфере ГЧП (МЧП).

ГЧП, прежде всего, является механизмом привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества оказываемых на его базе социально-значимых услуг населению.

Рекомендации адресованы, в первую очередь, специалистам государственных и муниципальных органов, ответственных за заключение и последующее сопровождение СГЧП (СМЧП) и КС, а также за нормативное регулирование данной сферы.

Представленные рекомендации могут быть в равной степени использованы в образовательных целях, включая повышение квалификации специалистов, а также при подготовке и реализации проектов частным партнером / концессионером.

В данных рекомендациях вы найдете анализ существующей законодательной базы в сфере ГЧП и ключевых аспектов ее применения на всех этапах реализации проектов – начиная от его подготовки и заканчивая мониторингом соглашения.

В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие практики), которые позволят более подробно разобраться в существующих подходах и проблемах структурирования СГЧП (СМЧП) и КС.

2. Сущность и правовое регулирование государственно-частного партнерства

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.

Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств соответствующих бюджетов.

С юридической точки зрения речь идет о взаимоотношениях публично-правовых образований (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) и частных лиц. Данные отношения строятся на СГЧП (СМЧП) или КС, заключаемых между ними и являющихся по своей правовой природе гражданско-правовыми договорами.

СГЧП (СМЧП) и КС являются самостоятельными правовыми институтами, рассмотрение, заключение и реализация которых регулируется отдельными федеральными законами. Вместе с тем КС - это одна из форм (моделей) ГЧП.

Основанием заключения СГЧП (СМЧП) или КС всегда является решение уполномоченного публичного органа, представляющего интересы публично-правового образования, о реализации определенного проекта.

Способом заключения СГЧП (СМЧП) или КС является проведение торгов в форме конкурса на право заключения соглашения. Также в федеральных законах отдельно обозначены случаи, когда заключение соглашения возможно без конкурса.

Регулирование сферы ГЧП

Специальное законодательство РФ о ГЧП состоит из Закона о ГЧП, Закона о КС, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных правовых актов субъектов РФ.

Все правовые нормы, содержащиеся в других принимаемых в соответствии с Законом о ГЧП и Законом о КС федеральных законах, иных нормативных правовых актах РФ, а также нормативных правовых актах субъектов РФ, муниципальных правовых актах, должны соответствовать.

Общим законодательством, на котором основывается законодательство о ГЧП, является Конституция РФ, ГК РФ, БК РФ, ЗК РФ, ГрК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, ВЗК РФ, НК РФ.

Учитывая общий законодательный характер указанных кодексов, их положения должны применяться к отношениям в сфере ГЧП, если нормами специального законодательства не предусмотрено иное.

Таблица 1 – Признаки ГЧП

1.	Долгосрочный характер партнерства (для СГЧП не менее 3 лет)	В среднем по статистике КС в России заключаются на срок 13 лет. Долгосрочный характер проектов в сфере ГЧП следует из необходимости возврата частных инвестиций и комплексного характера таких проектов
2.	Распределение рисков и ответственности между партнерами за счет привлечения частного инвестора не только к созданию объекта, но и к его последующей эксплуатации и (или) техническому обслуживанию	Риски в инфраструктурных проектах – это вероятные изменения показателей проекта, влияющие на доходы и расходы сторон по проекту. Распределение рисков – обязательное условие структурирования отношений частной и публичной сторон в проектах ГЧП, и наибольшая сложность при подготовке проекта ГЧП возникает как раз при поиске оптимального распределения рисков
3.	Полное или частичное финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частной стороной	Основным отличием ГЧП от государственного заказа является обязательное финансирование создания объекта частным партнером (концессионером), при этом публичный партнер (концедент) вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта соглашения, а также осуществлять полное или частичное финансирование затрат, связанных с эксплуатацией и (или) техническим обслуживанием объекта соглашения

Таблица 2 – Преимущества механизма ГЧП

Для публичной стороны	Для частной стороны
Возможность привлечь частного инвестора к финансированию создания объекта позволяет реализовывать инфраструктурные проекты даже в условиях отсутствия бюджетных средств, по сути, «в рассрочку» без увеличения долговой нагрузки	Закрепление условий взаимодействия с публичной стороной в рамках долгосрочного соглашения
Возможность объединения в рамках одного проекта различных этапов (проектирование, строительство и эксплуатация)	Возможность предоставления земельного участка, лесного участка, водного участка и (или) участка (иных водных, лесных и пр.) без торгов для целей реализации СГЧП (СМЧП)
Возможность приобретать не объект, а услугу за счет платежей, привязанных к объему и качеству ее оказания, что также способствует развитию конкуренции на рынке социально значимых услуг	Возможность софинансирования проекта публичной стороной, получения дополнительных гарантий (в т.ч. минимальной доходности)
Возможность использовать ресурсы и компетенции частного партнера (концессионера) для оказания социально значимых услуг, повышения их качества и	Возможность увеличивать свою выручку по проекту за счет оказания дополнительных платных услуг и/или применения различных решений, снижающих затраты

удовлетворенности потребителей	
Передача части рисков по проекту частному партнеру (концессионеру)	Передача части рисков по проекту публичному партнеру (концеденту)
Снижение присутствия государства в экономике	Расширение сферы деятельности за счет секторов, традиционно занимаемых государством
В случае частной инициативы - возможность переложить затраты, связанные с разработкой проекта, на частного инициатора проекта и сократить срок отбора инвестора	В случае частной инициативы - возможность самостоятельно проработать структуру проекта и предложить проект соглашения, сократить срок заключения соглашения

2.1. Закон о КС и Закон о ГЧП. Ключевые отличия

В 2015 году Закону о КС исполнилось 10 лет. По сути, это первый в современной России нормативный акт, регулирующий отношения в сфере ГЧП.

Ключевой элемент его правового регулирования – это КС.

По КС концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, **право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту**, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) данного имущества, которое предоставляется ему для этой цели во владение и пользование на определенный соглашением срок.

В 2015 г. был принят Закон о ГЧП, который позволил использовать новые, эффективные и сбалансированные модели ГЧП в российской практике.

Ключевой элемент его правового регулирования – это СГЧП (СМЧП).

Предусмотренная Законом о ГЧП новелла – **возможность возникновения частной собственности на публичную инфраструктуру**. При этом инвестор обязан обеспечивать полное или частичное финансирование создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объекта в соответствии с его целевым назначением, которое регистрируется в качестве обременения объекта.

В интересах инвесторов Законом о ГЧП вводится механизм гарантирования неизменности основных параметров, на основании которых принималось решение о реализации проекта. В случае изменения макроэкономических условий или законодательства, напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и т.д.), вносятся обоснованные изменения в соглашение в части объема софинансирования публичной стороной проекта и сроков его реализации.

Важно !

Иное имущество, созданное в рамках реализации СГЧП (СМЧП) или КС и не входящее в состав объекта, может переходить в частную собственность. Такое имущество должно быть определено в СГЧП (СМЧП) или КС.

Ключевые отличия

- В рамках КС право собственности на объект всегда¹ сохраняется за публичной стороной (концедентом)
- В рамках КС осуществление эксплуатации всегда возлагается на концессионера
- В рамках СГЧП (СМЧП) осуществление эксплуатации может быть возложено на публичного партнера (в дальнейшем норма планируется к пересмотру)
- В рамках СГЧП (СМЧП) право собственности² на объект соглашения возникает у частного партнера

Таблица 3 – Сравнительная таблица основных положений Закона о КС и Закона о ГЧП

Особенность	Закон о КС	Закон о ГЧП
Перечень объектов	В отношении следующих объектов может быть заключено <u>только КС</u> (статья 4 Закона о КС): <ul style="list-style-type: none"> • объекты тепло- и водоснабжения / водоотведения, • федеральные, региональные и местные дороги, • метрополитен, • здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества ВС РФ. 	В отношении следующих объектов может быть заключено <u>только СГЧП (СМЧП)</u> (статья 7 Закона о ГЧП): <ul style="list-style-type: none"> • воздушные суда; • стационарные и плавучие платформы, искусственные острова; • подводные и подземные технические сооружения, переходы; • линии и иные линейные объекты связи и коммуникации; • мелиоративные системы; • объекты промышленности; • объекты охотничьей инфраструктуры.
Сферы преимущественного использования	В отношении объектов, передача которых в частную собственность невозможна / нецелесообразна Например, коммунальная инфраструктура (теплосети), транспортная инфраструктура (государственные и муниципальные дороги, дорожная инфраструктура и др.)	В отношении объектов, передача которых в частную собственность возможна / целесообразна Например, социальная инфраструктура (физкультурно-оздоровительные комплексы, дошкольные образовательные учреждения и др.)
Минимальный срок действия соглашения	Нет	3 года
Возможность передачи объекта соглашения в залог финансирующей организации	Нет* * Передача концессионером в залог объекта КС не допускается (ч. 6 ст. 3 Закона о КС). При этом права концессионера по концессионному соглашению могут	Есть* * Только при наличии прямого соглашения.

¹ Объект КС может быть выкуплен концессионером в приоритетном порядке по окончании срока действия КС, в случае его включения в прогнозный план (программу) приватизации

² Право собственности на объект сохраняется за публичным партнером после завершения проекта или переходит к нему в период реализации соглашения в срок, установленный соглашением, если объем затрат на создание объекта соглашения (в том числе стоимость передаваемых прав) публичного партнера и (или) рыночная стоимость объекта соглашения превышают затраты частного партнера на создание объекта соглашения

Особенность	Закон о КС	Закон о ГЧП
	использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами (ч. 2 и ч. 4 ст. 5 Закона о КС).	
Запрет на изменение целевого назначения реконструируемого объекта	Есть Изменение целевого назначения реконструируемого объекта КС не допускается (ч. 5 ст. 3 Закона о КС).	Есть Право собственности частного партнера на объект соглашения возникает при условии обременения (выполнение частным партнером условий соглашения).
Обязательная эксплуатация объекта соглашения концессионером / частным партнером	Есть	Нет Существует возможность осуществления частным партнером технического обслуживания объекта соглашения (ремонта, содержания), без обязательств по эксплуатации (целевому использованию), то есть, оказания услуг потребителям (соответствующие обязанности остаются за публичным партнером).
Возможность частной инициативы	Есть* * Форма и требования к инициативному предложению утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 300 (см. Рисунок 1)	Есть* * Форма и требования к инициативному предложению утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 (см. Рисунок 1)
Оценка эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества	Нет* * Минэкономразвития России в 2016г. запланировано утверждение рекомендаций по проведению такой оценки (на первом этапе не будут носить обязательный характер). Вместе с тем согласование проекта будет по-прежнему проходить в рамках регламентных процедур с органами исполнительной власти, ответственными за бюджетную сферу.	Есть* * Порядок проведения такой оценки утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1514
Соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации	Есть* * Появилась возможность осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в объекты государственной (муниципальной собственности) в соответствии с КС, а также возможность предоставления субсидий по проектам ГЧП за сроком бюджетного планирования – более трех лет (пункты 5, 6 статьи 78 БК РФ).	Есть* * Появилась возможность предоставления субсидий по проектам ГЧП за сроком бюджетного планирования – более трех лет (пункт 6 статьи 78 БК РФ).
Заключение соглашения с зарубежным юридическим лицом	Есть	Нет* * Участие зарубежных инвесторов возможно через создание российских юридических лиц



* при принятии решения о заключении на иных условиях

** УО – уполномоченный орган

Рисунок 1 – Сравнение процедур частной инициативы по Закону о КС и Закону о ГЧП

2.2. Модели реализации проектов ГЧП

В мировой практике получил распространение ряд моделей, в рамках которых возможна реализация проектов ГЧП. Существующая в Российской Федерации нормативная правовая база позволяет реализовывать проекты ГЧП в рамках любой из таких моделей.

Таблица 4 – Формы и модели ГЧП, применение которых возможно в рамках национального законодательства

Модель ГЧП	Описание	Правовые основы
ВТО	Частная сторона осуществляет строительство/реконструкцию объекта, передает объект в собственность публичного партнера, осуществляет эксплуатацию объекта и получает доход от эксплуатации	115-ФЗ
ВОТ/ДВОТ	Частная сторона осуществляет строительство/реконструкцию объекта, получает право собственности на объект, осуществляет эксплуатацию объекта и получает доход от эксплуатации, может передавать в собственность публичного партнера по окончании соглашения	224-ФЗ
ВОО/ДВОО	Частная сторона осуществляет проектирование и/или строительство / реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течение согласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуатации	224-ФЗ
ВООТ/ДВООТ	Частная сторона осуществляет проектирование и/или строительство / реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течение согласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуатации, а затем передает объект в собственность публичной стороны	224-ФЗ
ДВФО/ДФИ	Частная сторона осуществляет проектирование и/или строительство / реконструкцию объекта, который передается в собственность публичной стороны за вознаграждение	224-ФЗ, 115-ФЗ

2.3. Федеральные подзаконные акты

Закон о КС

В рамках подготовки концессионных проектов необходимо, в первую очередь, обратить внимание на постановление Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения».

Потенциальный концессионер подает предложение в федеральный, региональный или муниципальный орган власти в зависимости от того, в чьей собственности находится объект концессионного соглашения, именно по этой форме.

Также на федеральном уровне закреплены примерные формы концессионных соглашений. Отметим, что они носят рекомендательный характер и не учитывают особенностей конкретного проекта.

Закон о ГЧП

В свете принятия Закона о ГЧП Правительством Российской Федерации к 1 января 2016 года приняты все 14 нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Закона о ГЧП. В частности, приняты и опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 10 постановлений Правительства Российской Федерации и 4 приказа Минэкономразвития России (перечень актов см. в Приложении 1).

Подзаконные акты регламентируют процедуры, связанные с подготовкой, рассмотрением публичной стороной и оценкой предложений о реализации проектов ГЧП (МЧП), а также отдельные этапы конкурсных процедур, последующие контроль и мониторинг реализации СГЧП (СМЧП).

Таким образом, к настоящему времени на федеральном уровне вся нормативная правовая база для начала реализации проектов ГЧП сформирована.

2.4. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (рекомендации)

В соответствии с частью 1 статьи 47 Закона о ГЧП нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты в сфере ГЧП и МЧП подлежат приведению в соответствие с положениями Закона о ГЧП до **1 января 2025 года**. После этого срока указанные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей положениям Закона о ГЧП.

Важно !

- К соглашениям, заключенным в соответствии с региональными / муниципальными актами о ГЧП до дня вступления в силу Закона о ГЧП, а также к изменениям в такие соглашения, применяются положения указанных региональных / муниципальных актов в редакции, действовавшей до дня вступления в силу изменений в данные акты (направленных на их приведение в соответствие с положениями Закона о ГЧП).
- Соглашения, заключенные после дня вступления в силу Закона о ГЧП, должны соответствовать положениям Закона о ГЧП.

В соответствии с Законом о ГЧП субъектам Российской Федерации необходимо определить орган исполнительной власти, который будет осуществлять полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 17 Закона о ГЧП (далее – уполномоченный орган). Именно уполномоченный орган будет проводить оценку эффективности проектов ГЧП и МЧП и в его отсутствие запуск таких проектов будет невозможен.

В этой связи субъектам Российской Федерации рекомендуется принять соответствующий акт о наделении регионального органа исполнительной власти указанными полномочиями.

В целях увеличения объема инвестиций в инфраструктуру и повышения качества услуг населению субъекты Российской Федерации могут принимать дополнительные нормативные правовые акты, уточняющие или дополняющие положения Закона о ГЧП.

Для своевременного исполнения данных требований, Минэкономразвития России направлены рекомендации субъектам Российской Федерации (письмо от 28 января 2016 г. № 1817-СВ/Д13и). В частности рекомендовано:

Определить меры стимулирования частных инвесторов для применения механизмов ГЧП и МЧП;

Установить порядок межведомственного взаимодействия на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта ГЧП, а также при организации конкурсных процедур для отбора частного партнера и осуществления контроля за исполнением соглашения о ГЧП;

Интегрировать данные о потребностях субъекта Российской Федерации в инфраструктурных инвестициях и сформировать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП и МЧП. Такой перечень целесообразно размещать на инвестиционном портале региона и (или) сайте уполномоченного органа.

По вопросу принятия на уровне сельских, городских поселений правовых актов в сфере МЧП необходимо отметить следующее:

– Полномочия МО в сфере МЧП определены статьей 18 Закона о ГЧП. Согласно пункту 2 указанной статьи глава МО в соответствии с уставом МО определяет орган для реализации муниципальных полномочий в сфере ГЧП.

– Вместе с тем, в целях исключения избыточного регламентирования, как, например, в случае МО, в которых в силу тех или иных причин реализация проектов МЧП в ближайшее время представляется маловероятной, полагаем возможным придерживаться следующего подхода.

1. Уполномоченным органам субъектов Российской Федерации довести до МО информацию о контактных лицах по вопросам ГЧП / МЧП в региональном уполномоченном органе, а также типовую схему рассмотрения органами местного самоуправления предложений о реализации проектов МЧП. Указанная схема может быть представлена следующим образом:

- МО при получении предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП сообщает об этом контактному лицу в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации.
- МО организует процедуру его рассмотрения органами местного самоуправления.
- По итогам рассмотрения глава МО принимает решение о направлении данного предложения на оценку эффективности и сравнительного преимущества в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.
- При положительном заключении уполномоченного органа глава муниципалитета принимает решение о реализации проекта МЧП.

2. В МО, в которых ранее были приняты акты в сфере МЧП, считаем необходимым по согласованию с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации либо их приведение в соответствие с федеральным законодательством, либо отмену.

Кроме того, на уровне муниципальных образований могут быть также реализованы меры по развитию практики ГЧП, рекомендованные для субъектов Российской Федерации, как например, формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов, применение муниципальных налоговых и иных стимулирующих мер, отражение мероприятий по расширению практики реализации проектов ГЧП в муниципальных документах стратегического планирования и др.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления на различных этапах реализации проекта

Стадии проекта/ Орган	Правительство РФ /ВИОГВ субъекта РФ, глава МО	Публичный партнер / Концедент	Уполномоченный орган по ГЧП (УО по ГЧП)	Уполномоченный орган по ЧКИ (УО по ЧКИ)
Подготовка проекта		<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка предложения • Проведение предварительных переговоров • Размещение перечня объектов, планируемых в КС 	<ul style="list-style-type: none"> • Методическое сопровождение этапа 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение предварительных переговоров
Рассмотрение проекта публичной стороной		<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрение предложения • Проведение переговоров • Согласование предложения с заинтересованными органами • Направление предложения в уполномоченный орган по ГЧП • Публикация предложений инвесторов, сбор заявок 	<ul style="list-style-type: none"> • Согласование публичному партнеру конкурсной документации 	<ul style="list-style-type: none"> • Рассмотрение предложений и принятие решений по ним • Согласование предложения с заинтересованными органами • Согласование содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и метода регулирования тарифов • Публикация предложений инвесторов, сбор заявок • Проведение переговоров о возможности заключения КС на иных условиях

Оценка эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества		<ul style="list-style-type: none"> • Участие в переговорах, проводимых УО (только для СГЧП (СМЧП)) 	<ul style="list-style-type: none"> • Оценка эффективности проекта ГЧП (МЧП) или направление его на оценку в вышестоящий УО (для УО на муниципальном уровне направление обязательно) • Обеспечение открытости и доступности информации о соглашениях на федеральном уровне; • Проведение переговоров в процессе оценки 	<ul style="list-style-type: none"> • РЕКОМЕНДОВАНО!³
Принятие решения по проекту	<ul style="list-style-type: none"> • Принятие решения о заключении КС (о реализации проекта ГЧП) 	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка проекта решения о заключении КС (о реализации проекта ГЧП) 	<ul style="list-style-type: none"> • Согласование проекта решения о реализации проекта ГЧП (МЧП) 	<ul style="list-style-type: none"> • Согласование проекта решения о заключении КС
Отбор		<ul style="list-style-type: none"> • Проведение конкурсных процедур 		
Заключение соглашения		<ul style="list-style-type: none"> • Заключение СГЧП (СМЧП), КС 		
Реализация проекта		<ul style="list-style-type: none"> • Участие в осуществлении мониторинга СГЧП (СМЧП) и КС • Контроль СГЧП (СМЧП), КС • Изменение, прекращение СГЧП (СМЧП), КС 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение межведомственной координации • Методическое сопровождение • Осуществление мониторинга СГЧП (СМЧП) и КС • Содействие в защите прав и законных интересов сторон СГЧП • Ведение реестра заключенных СГЧП (СМЧП) 	

³ В целях накопления необходимых компетенций уполномоченным органом по ГЧП / МЧП целесообразно также проводить оценку концессионных соглашений. В 2016 году Минэкономразвития запланировано утверждение рекомендаций по проведению оценки эффективности концессионного проекта и определения его сравнительного преимущества. Указанные рекомендации в соответствии с целями Закона о КС устанавливают основные подходы к порядку расчета показателей, используемых при оценке концессионного проекта, и будут адресованы:

- органам власти (при разработке концессионного проекта);
- частным инициаторам проектов (при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений);
- органам власти (при рассмотрении указанных предложений).

4. Делегирование отдельных полномочий публичного партнера (концедента)

Законом о ГЧП и Законом о КС предусмотрена возможность передавать отдельные права и обязанности публичного партнера (концедента) иным лицам (государственным органам, органам местного самоуправления, а также юридическим лицам).

Важно !

Указанные органы и юридические лица на стороне публичной стороны не участвуют в СГЧП (СМЧП) и КС, не подписывают его.

При этом проект СГЧП должен содержать лишь перечень этих органов и юридических лиц, а также сведения о правах и обязанностях публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридическими лицами (ч. 8 ст. 12 Закона о ГЧП). **В КС рекомендуется также закреплять данные условия** (п. 1. ч. 1 ст. 5 Закона о КС).

Кто может выступать на стороне концедента

Спектр органов и организаций, имеющих право осуществлять отдельные права и обязанности концедента, не ограничен.

Кто может выступать на стороне публичного партнера

В отличие от Закона о КС, перечень юридических лиц, которые могут выступать на стороне публичного партнера в СГЧП (СМЧП), усечен - такими лицами могут быть лишь организации, не имеющие права выступать частными партнерами. Список таких организаций указан в ч. 2 ст. 5 Закона о ГЧП.

Порядок делегирования полномочий по Закону о КС

Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, **и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях.**

Порядок делегирования полномочий по Закону о ГЧП

Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются СГЧП (СМЧП) на основании решения о реализации проекта ГЧП (МЧП).

Перечень отдельных прав и обязанностей концедента

Не установлен.

Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера

Установлен постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1366 (см. Таблица 5).

Таблица 5 - Отдельные права и обязанности публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами

Этап по проекту ГЧП	Права и обязанности
Подготовка проекта	<ul style="list-style-type: none"> • участие в предварительных переговорах • предоставление инициатору проекта материалов и информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП) • разработка предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП) • обеспечение государственной регистрации права собственности публичного партнера на недвижимое имущество • осуществление подготовки территории • обеспечение сохранности объекта соглашения до его передачи частному партнеру
Рассмотрение проекта публичным партнером	не предусмотрено
Оценка эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • участие в переговорах
Принятие решения по проекту	не предусмотрено
Отбор	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение организации и проведения конкурса на право заключения соглашения на основании решения о реализации проекта, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия
Заключение СГЧП (СМЧП)	не предусмотрено
Реализация проекта	<ul style="list-style-type: none"> • разработка проектно-сметной документации (если предусмотрено решением о реализации проекта ГЧП и СГЧП (СМЧП)) • оказание частному партнеру содействия в получении обязательных разрешений и (или) согласований органов • предоставление частному партнеру объектов СГЧП (СМЧП), иного имущества и земельных участков, а также осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения у частного партнера права собственности и (или) права владения и пользования ими • осуществление частичных расходов на создание частным партнером объекта, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством РФ (если предусмотрено) • осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения ограничений (обременений) прав на объект (объекты) соглашения, а также на земельные участки

	<ul style="list-style-type: none">• осуществление эксплуатации или технического обслуживания объекта соглашения (если предусмотрено)• рассмотрение предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения• осуществление контроля соблюдения частным партнером условий СГЧП
Прекращение СГЧП (СМЧП)	<ul style="list-style-type: none">• обеспечение организации и проведения конкурса в целях замены частного партнера, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия• компенсация осуществленных в соответствии с СГЧП затрат частного партнера в случае досрочного прекращения соглашения• принятие в собственность объекта СГЧП и (или) осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения права собственности публичного партнера на объект СГЧП (если предусмотрено)• осуществление приемки объекта соглашения после окончания его строительства, а также при передаче объекта СГЧП публичному партнеру по окончании срока действия соглашения• право преимущественной покупки предмета залога, в случае обращения взыскания на предмет залога

III. СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП (МЧП) И КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

5. Стороны соглашений

5.1. Стороны СГЧП (СМЧП)

Сторонами СГЧП (СМЧП) выступают публичные партнеры и частные партнеры.

Частным партнером может быть:

- ✓ российское юридическое лицо.

Важно !

Частными партнерами в СГЧП (СМЧП) не могут быть:

- ✗ ГУПы и МУПы;
- ✗ государственные и муниципальные учреждения;
- ✗ публично-правовые компании и иные юридические лица, хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, созданные или находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, их дочерние хозяйственные общества;
- ✗ некоммерческие организации в форме фондов, созданные вышеперечисленными лицами, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями.

При этом указанные юридические лица могут выступать на стороне публичного партнера!

Публичным партнером⁴ может быть:

- ✓ Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство Российской Федерации, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган государственной власти);
- ✓ субъект Российской Федерации (от имени которого выступает высший исполнительный орган региона, уполномоченный им региональный орган исполнительной власти);
- ✓ муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального образования, уполномоченный им орган местного самоуправления).

⁴ Отдельные права и обязанности публичного партнера могут осуществляться уполномоченными органами и юридическими лицами⁴ (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации и проведения конкурса; осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта соглашения и др.). Перечень указанных прав и обязанностей установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1366

5.2. Стороны КС

Партнерами в рамках КС выступают концедент и концессионер.

Концессионером может быть:

- ✓ **индивидуальный предприниматель,**
- ✓ **российское юридическое лицо,**
- ✓ **иностранное юридическое лицо,**
- ✓ действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Концедентом⁵ может быть:

- ✓ Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган государственной власти),
- ✓ субъект Российской Федерации (от имени которого выступает высший исполнительный орган региона или уполномоченный им региональный орган исполнительной власти),
- ✓ муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального образования или уполномоченный им орган местного самоуправления).
- ✓ ГК «Автодор».

⁵ Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными органами и юридическими лицами⁵ (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации и проведения конкурса; осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта КС и др.)

6. Объекты КС и СГЧП (СМЧП)

Перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены СГЧП (СМЧП) и КС установлены статьей 4 Закона о КС и статьей 7 Закона о ГЧП. На сегодняшний день они являются исчерпывающими и закрытыми.

Объекты концессионного соглашения / соглашения о ГЧП (МЧП)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > частные автодороги, мосты, защитные дорожные сооружения, элементы обустройства автодорог, объекты для взимания платы и объекты дорожного сервиса > транспорт общего пользования > объекты железнодорожного транспорта > объекты трубопроводного транспорта > морские, речные суда и суда смешанного (река - море) плавания > объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии > аэродромы, аэропорты | <ul style="list-style-type: none"> > объекты здравоохранения, в том числе, предназначенные для санаторно-курортного лечения > объекты образования, культуры, спорта, объекты для организации отдыха и туризма, иные объекты социального обслуживания > объекты по обработке, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов > объекты благоустройства территорий, в том числе освещения > объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции |
|--|--|



Объекты (только) соглашения о ГЧП (МЧП)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова > воздушные суда > объекты охотничьей инфраструктуры* > мелиоративные системы | <ul style="list-style-type: none"> > подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и коммуникации > имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности* |
|---|--|

* с 1 октября 2016 г.

Объекты (только) концессионного соглашения

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования хранения и ремонта имущества ВС РФ... > федеральные, региональные и местные дороги | <ul style="list-style-type: none"> > объекты тепло-и водоснабжения, водоотведения > метрополитен |
|--|--|

Объекты, в отношении которых планируется реконструкция, на момент заключения соглашения (КС или СГЧП (СМЧП)) должны находиться в собственности публичной стороны. На момент передачи объект соглашения должен быть свободным от прав третьих лиц⁶.

Важно !

Данное ограничение не является запретом для заключения КС или соглашения о ГЧП/МЧП в отношении таких объектов, при условии их передачи в государственную / муниципальную казну (подробнее см. Раздел 10)

Исключение из данного правила сделано для КС в отношении автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры!

Кроме того, объектом соглашения о ГЧП /МЧП может быть только имущество, в отношении которого законодательством Российской Федерации не установлены принадлежность исключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной собственности.

⁶ Указанное ограничение, в том числе, относится к объектам (входящему в их состав имущества), которые на момент заключения соглашения принадлежат на праве хозяйственного ведения ГУПу или МУПу, либо государственному/муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

7. Существенные условия соглашений

Перечень существенных условий⁷ предусмотрен в статье 10 Закона о КС и в статье 12 Закона о ГЧП (в т.ч. обязательства сторон по созданию (финансированию создания) объекта, сведения об объекте, срок действия СГЧП (СМЧП), КС и другие).

Однако в целях наиболее полного отражения всех особенностей соглашения, а также учитывая отраслевую специфику, крайне важно включать в соглашения и иные условия. При этом их детализацию возможно осуществлять в приложении к соглашению.

Таблица 6 – Пример списка приложений к СГЧП (СМЧП) или КС

№ п/п	Приложения к СГЧП (СМЧП) или КС
1.	Термины и определения
2.	Состав, описание и технико-экономические показатели объекта соглашения
3.	Перечень и график предоставления земельных участков
4.	Форма договора аренды земельного участка
5.	Требования к проектированию
6.	Регламент согласования договоров
7.	Требования к реконструкции и строительству объекта соглашения
8.	Требования к эксплуатации
9.	График подготовки проектной документации
10.	Предварительный финансовый план
11.	Финансовый план
12.	Государственное финансирование
13.	Порядок расчета сумм уменьшения платы концедента (для КС)
14.	Отчетность концессионера (частного партнера)
15.	Необходимое страховое покрытие
16.	Основные условия соглашения о взаимодействии
17.	Неустойки
18.	Список допущений по налоговому и бухгалтерскому учету
19.	Порядок расчета и возмещения дополнительных расходов
20.	Реквизиты сторон
21.	Примерная форма банковской гарантии на инвестиционной стадии
22.	Примерная форма банковской гарантии на эксплуатационной стадии
23.	Формы актов: <ul style="list-style-type: none"> 23.1. Форма акта выполнения предварительных условий строительства 23.2. Форма акта о начале эксплуатации 23.3. Форма акта достижения финансового закрытия 23.4. Примерная форма прямого соглашения 23.5. Др.

⁷ Некоторые существенные условия содержатся в других нормах Закона о КС и Закона о ГЧП, например:

- состав и описание «иного имущества», цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата
- порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий КС
- срок, в течение которого концессионер несет перед концедентом ответственность за качество объекта КС

Кроме того, специальное законодательство, регулирующее концессионные соглашения, заключаемые в отношении конкретных объектов, может предусматривать дополнительные существенные условия концессионного соглашения (например, часть 2 статьи 38 Федерального закона «Об автомобильных дорогах» или ст. 8 Федерального закона «О морских портах»).

Важно !

Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом (статья 13 Закона о КС).

Важно !

В целях контроля результатов реализации соглашений необходимо предусматривать показатели эффективности таких соглашений, например:

- Улучшение технико-экономических показателей объекта соглашения (если результатом реализации соглашения является строительство/реконструкция);
- Уровень удовлетворенности услугой (если по соглашению предусмотрено предоставление услуг населению).

8. Рекомендуемая структура рисков, которые должны быть отражены в соглашении о реализации проекта ГЧП

Оценка рисков по проекту является первым шагом к его структурированию и разработке финансовой и правовой схемы проекта. Под рисками в целом понимаются вероятные изменения показателей проекта, связанные, прежде всего, с доходами и расходами.

В этой связи необходимо уже на этапе его структурирования распределить риски между частным партнером / концессионером и публичным партнером / концедентом. Сбалансированное распределение рисков позволяет минимизировать вероятность преждевременного завершения проекта. В частности представляется целесообразным риски, связанные непосредственно с деятельностью частного инвестора (как, например, срыв сроков и превышение сметы на этапе строительства/реконструкции и др.) закрепить за частным инвестором, риски, находящиеся в сфере ответственности публичной стороны, закрепить за публичным партнером / концедентом (например, предоставление земельных участков, увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов и т.д.)

При этом структура, объем и распределение рисков должны быть отражены в соглашении.

Минимально необходимый (но не полный!) перечень рисков, отражение которых целесообразно в рамках СГЧП (СМЧП), КС представлен в Таблице 7, типичная матрица рисков по проекту ГЧП представлена в Приложении 2. Конкретный перечень рисков будет зависеть, в том числе, от вида создаваемого и (или) реконструируемого объекта, особенностей осуществления концессионером деятельности по эксплуатации (техническому обслуживанию) объекта соглашения.

Таблица 7 – Перечень рисков, которые должны быть отражены в соглашении

№	Виды риска	Риски
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков
		Обеспечение инженерных коммуникаций
		Подготовка земельных участков
		Срыв срока проектирования объекта
		Срыв срока подготовительных мероприятий
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров
		Ликвидация экологических последствий
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности
		Падение выручки вследствие снижения объема оказания услуг
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера
		Расторжение соглашения по вине частного партнера
		Утрата объекта соглашения
		Форс-мажорные обстоятельства
		Иные риски

Распределение рисков между сторонами КС, СГЧП (СМЧП) осуществляется, в том числе, посредством включения в соглашение условий об особых обстоятельствах. Под особыми обстоятельствами понимаются различные события, которые могут наступить в ходе исполнения сторонами КС, СГЧП (СМЧП) и повлиять на ход исполнения сторонами соглашения своих прав и обязанностей.

Условия об особых обстоятельствах регулируют распределение последствий наступления таких обстоятельств (реализации рисков) между сторонами соглашения.

В соглашении могут быть закреплены следующие последствия наступления особого обстоятельства:

1) если в результате наступления особого обстоятельства публичная или частная сторона не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в установленных соглашением объемах и в установленные соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на срок, который является справедливым и разумным в данных обстоятельствах для устранения причины и последствий нарушения сроков;

2) если в результате наступления особого обстоятельства одна из сторон не исполнила или нарушила какое-либо обязательство по соглашению, другая сторона не начисляет неустойки, пени, штрафы и не требует возмещения убытков за такие нарушения;

3) в случаях, указанных в соглашении, право сторон требовать досрочного прекращения соглашения.

Конкретный перечень особых обстоятельств будет зависеть от сферы реализации соглашения, конкретных условий реализации проекта (например, на ком лежит обязанность по проектированию, является ли деятельность по эксплуатации объекта соглашения тарифицируемой и других). К общим особым обстоятельствам можно отнести следующие:

- выявление в отношении земельного участка обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением;
- нарушение срока заключения договора аренды (субаренды) земельного участка;
- досрочное прекращение договора аренды (субаренды) земельного участка по причинам, не связанным с нарушением стороной соглашения условий такого договора;
- изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
- акции протеста населения и иные неблагоприятные для реализации стороной соглашения события, происходящие не по вине другой стороны;
- обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, а также подземных инженерных сетей и коммуникаций (включая электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод, телекоммуникационные кабели), препятствующих созданию объекта соглашения, а также иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны сторонам до даты заключения соглашения.

9. Предоставление земельных участков, необходимых для реализации КС и СГЧП (СМЧП)

В рамках Закона о ГЧП предусматривается обязательство публичного партнера по предоставлению частному партнеру предназначенного для реализации соглашения объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка (участков). При этом земельный участок предоставляется частному партнеру в аренду без проведения торгов на срок, не превышающий срок действия соглашения (часть 1 статьи 33 Закона о ГЧП, подпункт 8 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ).

В рамках Закона о КС также предусмотрено предоставление концедентом концессионеру в аренду земельного участка, необходимого для создания объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на срок, не превышающий такое соглашение.

Предоставление земельного участка в аренду осуществляется на основании договора аренды земельного участка по акту приема-передачи такого участка. При этом наличие концессионного соглашения или СГЧП (СМЧП) является основанием для заключения такого договора аренды без проведения торгов (подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ).

Договор аренды может быть заключен только в отношении образованного земельного участка, то есть земельного участка, поставленного в соответствии с действующим законодательством на кадастровый учет. В случае если земельный участок не образован, в решении о реализации проекта ГЧП или о заключении КС может содержаться поручение уполномоченному органу образовать земельный участок в установленном законодательством порядке для его последующего предоставления частному партнеру или концессионеру.

Кроме того, до заключения договора аренды земельного участка необходимо удостовериться, что категория земельного участка и его вид разрешенного использования допускают его использование в целях реализации СГЧП (СМЧП) или КС. Если категория участка и (или) его вид разрешенного использования не соответствуют таким целям, такие категория и (или) вид разрешенного использования участка должны быть изменены до заключения договора аренды. В противном случае будут отсутствовать правовые основания для предоставления земельного участка без проведения торгов, так как участок на момент его предоставления должен быть готов к использованию в целях осуществления деятельности, предусмотренной КС, СГЧП (СМЧП).

Договор аренды земельного участка включает (в соответствии с соглашением):

✓ Предмет договора.

Указывается земельный участок (общая площадь, категория земель, кадастровый номер, разрешенное использование, местоположение, назначение), а также отсутствие обременений (ограничений), препятствующих его предоставлению. Указывается основание заключения договора (заключение соглашения).

✓ Срок действия договора

Окончание срока действия договора должно быть не позднее окончания срока действия КС или СГЧП (СМЧП)

✓ Порядок передачи и возврата земельных участков

Указывается порядок и срок передачи земельного участка, а также порядок и срок его возврата.

✓ Права и обязанности сторон

Указываются основные условия исполнения договора аренды (передача, беспрепятственный доступ, целевое использование, уплата арендной платы и др.)

✓ Условия изменения и прекращения договора

Указываются возможные причины досрочного прекращения договора аренды земельного участка, а также условия внесения в него изменений

✓ Порядок платежей и расчетов по договору

Указывается размер арендной платы, а также основные условия по ее выплате.

✓ Ответственность сторон по договору.

Указывается ответственность сторон по выполнению условий договора аренды земельного участка.

Согласно части 1.1 статьи 11 Закона о КС договор аренды земельного участка должен быть заключен не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о ГЧП договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией.

10. Порядок действий в случае, если объект, в отношении которого планируется заключение КС, СГЧП (СМЧП), обременен правами третьих лиц

Согласно части 4 статьи 3 Закона о КС **права третьих лиц на объект соглашения, подлежащий реконструкции, должны отсутствовать на момент заключения КС.** При этом на момент рассмотрения частной инициативы и принятия решения о возможности заключения КС в порядке частной инициативы не происходит заключение КС.

Наличие права оперативного управления или права хозяйственного ведения на потенциальный объект КС не является препятствием для принятия решения о возможности заключения КС в порядке частной инициативы, предусмотренного частью 4.4 статьи 37 Закона о КС.

Таким образом, если есть возможность прекращения права оперативного управления или хозяйственного ведения до заключения КС и необходимость заключения КС, то публичная сторона вправе принять частную инициативу и запустить процесс заключения КС.

Аналогичный подход должен быть применен в отношении объектов СГЧП / СМЧП, подлежащих реконструкции. Требование об отсутствии прав третьих лиц на такие объекты на момент заключения соглашения установлено частью 4 статьи 7 Закона о ГЧП.

Важно !

В случае если земельный участок обременен правами третьих лиц, то в решении о реализации проекта ГЧП с вовлечением такого участка необходимо предусмотреть поручение территориальному органу Росимущества, в момент заключения соответствующего соглашения, передать указанный участок концессионеру / частному партнеру и прекратить права третьих лиц на него.

Указанные действия необходимы для исключения разрыва в использовании и управлении имуществом.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СГЧП (СМЧП) И КС

11. Способы привлечения финансирования

Реализация проектов ГЧП в обязательном порядке предполагает привлечение частного финансирования. При этом Закон о КС и Закон о ГЧП допускают принятие на себя концедентом / публичным партнером части расходов на создание, а также всех или части расходов на эксплуатацию (техническое обслуживание) объекта соглашения.

Частное финансирование в проект ГЧП может быть привлечено из различных источников. Привлеченные средства включают в себя долговые обязательства в виде банковских кредитов, облигационных займов, займов от иных организаций и пр. Стоимость обслуживания долговых обязательств может быть как фиксированной, так и плавающей (например, привязанной к уровню инфляции).

11.1. Банковское кредитование

Является наиболее распространенным источником заемного финансирования, который может предполагать предоставление на этапе создания объекта соглашения отсрочки по уплате процентов, а также различные процентные ставки по кредиту – более высокие на этапе создания (когда риски проекта существенны) и более низкие – на стадии эксплуатации объекта соглашения (когда строительные риски проекта уже не актуальны).

При этом могут быть использованы механизмы привлечения льготного финансирования (отраслевые программы субсидирования).

Важно !

Понимая, что существует возможность претендовать на получение указанного льготного банковского финансирования после заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП / МЧП, необходимо уже на этапе подготовки соглашения предусмотреть условия распределения выгод от такого льготного финансирования между публичной и частной стороной. В противном случае всю выгоду от указанного льготного финансирования получает частный инвестор.

В этой связи в целях использования льготного банковского финансирования соглашением может быть предусмотрен механизм снижения объема участия публичной стороны в проекте, в случае его успешного привлечения в проект (например, уменьшение размера субсидии, предоставляемой субъектом Российской Федерации, при наличии такой субсидии).

Финансирующие организации в целях обеспечения интересов в случае изменения и прекращения соглашения, в том числе в случае дефолта проекта, используют соглашение между кредиторами, публичной стороной и концессионером, частным партнером, по которому права последнего могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед кредиторами (например, в соответствии с Законом о ГЧП объект соглашения может быть передан в залог финансирующей организации; также могут предусматриваться иные механизмы обеспечения прав финансирующих организаций, например, право финансирующей организации

участвовать в замене концессионера на основании части 4 статьи 5 Закона о КС). Наличие такого соглашения (прямого соглашения) в значительной мере определяет возможность привлечения заемного финансирования для целей реализации проекта и его условия.

Прямое соглашение во многом схоже с природой государственных и муниципальных гарантий, при этом его применение не влечет за собой необходимость включения соответствующих обязательств в расходную часть бюджета и не увеличивает размер государственного внутреннего долга, вместе с тем может содержать существенные условные обязательства субъекта.

Важно !

Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, связанные, например, с порядком распоряжения залоговым имуществом, а также обязательства сторон, которые могут содержать условные обязательства бюджетов субъектов, важно обеспечить согласование проекта прямого соглашения «в едином пакете» с проектом концессионного соглашения, соглашения ГЧП/МЧП.

11.2. Выпуск облигаций

В случае если стоимость капитальных затрат по проекту ГЧП составляет 1 млрд. рублей и более, может быть осуществлен выпуск облигаций, которые благодаря включению в котировальные списки и плавающей доходности (как правило, ставка купонного дохода по таким облигациям устанавливается как инфляция + премия за риск инвестирования) могут быть интересны институциональным инвесторам (негосударственным пенсионным фондам, страховым компаниям и пр.)

Важно !

Предусмотрен упрощенный порядок включения указанных облигаций в котировальные списки (Положение Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»).

Облигации эмитента-концессионера входят в перечень разрешённых активов для инвестирования средств страховых резервов и негосударственных пенсионных фондов (статья 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1, пункты 1.4.7 и 1.5.11 Положения Банка России от 25 декабря 2014 г. № 451-П). Причём в отношении средств негосударственных пенсионных фондов предусмотрен льготный порядок инвестирования (без обязательного соответствия рейтинга выпуска облигаций эмитента-концессионера уровню, установленному Советом директоров Банка России).

11.3. Бюджетное софинансирование

Финансовое участие концедента, публичного партнера в проекте ГЧП может состоять в:

- ✓ предоставлении бюджетных субсидий для компенсации части капитальных и текущих затрат концессионера, частного партнера;

- ✓ гарантировании минимального уровня загрузки (доходности) объекта соглашения;
- ✓ компенсации недополученного дохода частного партнера (концессионера);
- ✓ предоставлении государственных и муниципальных гарантий;

В соглашении могут быть использованы различные комбинации способов бюджетного финансирования проекта. При этом в соглашении рекомендуется устанавливать предельный объем расходов и финансовых обязательств концедента, публичного партнера.

Софинансирование концедентом, публичным партнером расходов на создание объекта соглашения (предоставление капитального гранта) позволяет повысить инвестиционную привлекательность проекта, снизить размер платежей из бюджета (если предполагается) на стадии эксплуатации, а также уровень тарифной нагрузки на пользователей, если доходы от оказания платных услуг являются источником компенсации инвестиций концессионера, частного партнера.

Важно !

В связи с долгосрочным характером реализации соглашений бюджетным законодательством предусмотрена возможность принятия высшим органом исполнительной власти решений по предоставлению финансовой поддержки проекту на всём этапе его жизненного цикла, даже когда он превышает срок бюджетного планирования (срок действия закона о бюджете и государственных программ) (Статья 78.1 БК РФ).

12. Прямые соглашения

Возможность заключения прямых соглашений в проектах ГЧП предусмотрена статьями 3 и 7 Закона о ГЧП и статьей 5 Закона о КС.

Прямое соглашение во многом схоже с механизмом действия государственных и муниципальных гарантий, при этом его применение не влечет за собой необходимость включения соответствующих обязательств в расходную часть бюджета и не увеличивает размер государственного (муниципального) внутреннего долга.

Наличие прямого соглашения позволяет получить более выгодные условия финансирования проекта благодаря минимизации рисков финансирующей организации. Прямым соглашением могут быть предусмотрены залог прав частной стороны или долей в ее уставном капитале и иные способы обеспечения обязательств частной стороны в рамках проекта, а также обязательства публичной стороны возместить непогашенную перед финансирующей организацией задолженность частной стороны (включая сумму долга и проценты) в случае ее дефолта. Прямое соглашение может также устанавливать случаи замены частной стороны, в том числе без проведения конкурса, уступки частной стороной в пользу кредиторов права получения платежей от публичной стороны и т.д.

Отличием прямого соглашения, заключаемого в рамках исполнения СГЧП (СМЧП), от аналогичного в рамках КС, является возможность передачи частным партнером объекта и прав по СГЧП (СМЧП) в залог финансирующей организации в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.

Важно !

Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, связанные, например, с порядком распоряжения заложенным имуществом, а также обязательства сторон, которые могут содержать условные бюджетные обязательства соответствующего уровня бюджетной системы, важно обеспечить согласование проекта прямого соглашения «в едином пакете» с проектом концессионного соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП.

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О ГЧП

13. Общая схема реализации проекта ГЧП по Закону о ГЧП



Рисунок 2 – Этапы реализации проекта ГЧП / МЧП

14. Предложение о реализации проекта

В соответствии с Законом о ГЧП проект ГЧП (МЧП) может быть инициирован как публичной стороной, так и частным инвестором.

В случае если инициатором проекта ГЧП (МЧП) выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. Указанный орган должен быть предварительно определен в зависимости от уровня на основании распорядительного акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или на основании устава муниципального образования⁸.

15. Оценка проекта

15.1. Общая схема запуска проекта



Рисунок 3 – Запуск проекта ГЧП / МЧП

⁸ Функции уполномоченного органа закреплены в части 2 статьи 16 Закона о ГЧП (для федерального органа исполнительной власти), в части 2 статьи 17 (для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), в части 2 статьи 18 (для органа местного самоуправления).

Важно !

Обращаем внимание, что форма предложения о реализации проекта и требования к сведениям, содержащимся в этом предложении*, применяются как к публичному партнеру, самостоятельно разрабатывающему предложение о реализации проекта, так и к инициатору проекта (частному партнеру), обеспечивающему разработку предложения о реализации проекта и направляющему его публичному партнеру.

* Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386

15.2. Рассмотрение предложения публичным партнером**Особенности рассмотрения предложения публичным партнером**

- 1** Предложение о реализации проекта может быть направлено инициатором проекта на рассмотрение в орган, который в соответствии с законодательством РФ может выступать от имени публичного партнера
- 2** В случае, если инициатором проекта предложение о реализации проекта направлено в Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ или главе муниципального образования, получатели предложения о реализации проекта определяют выступающий от лица публичного партнера федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления соответственно и направляют на рассмотрение в указанный орган поступившее от инициатора предложение о реализации проекта.
- 3** Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и принимается исключительно по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 8 Закона о ГЧП
- 4** Решение, принятое публичным партнером по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта, утверждается руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, либо органа исполнительной власти субъекта РФ, либо главой муниципального образования
- 5** Публичным партнером к рассмотрению предложения о реализации проекта могут привлекаться эксперты, экспертные организации, финансовые, юридические, технические и иные консультанты, а также специализированные советы, рабочие группы и иные совещательно-консультативные органы
- 6** Решение о направлении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, а также иные документы направляются на рассмотрение в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ главой муниципального образования

15.3. Рассмотрение предложения уполномоченным органом

Уполномоченный орган рассматривает проект ГЧП / МЧП в целях оценки его эффективности и определения его сравнительного преимущества в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления такого проекта.

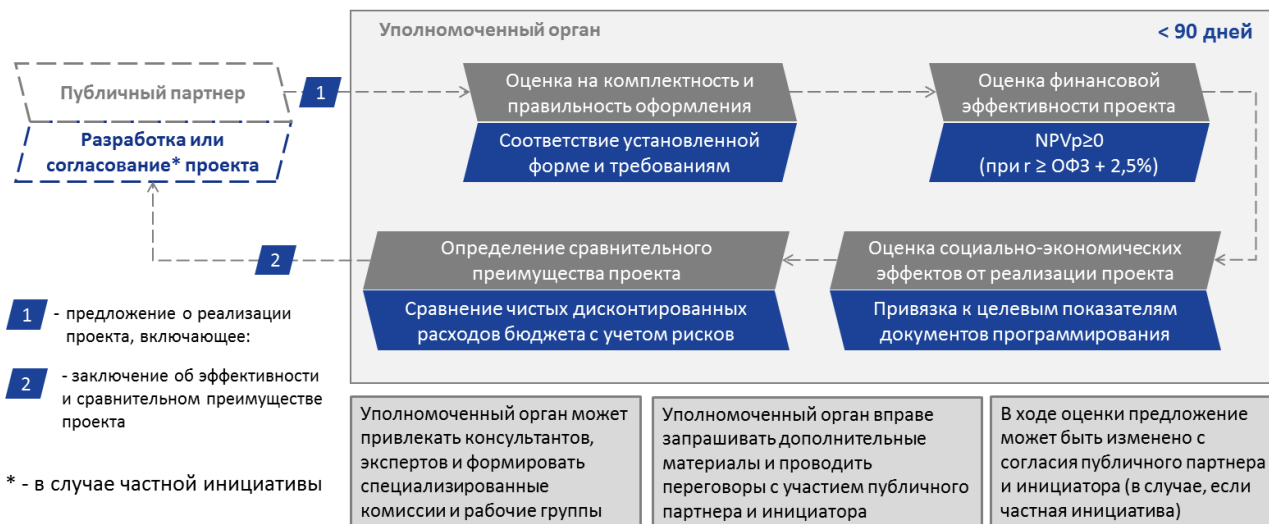


Рисунок 4 – Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП) (оценка эффективности проекта ГЧП (МЧП) и определения его сравнительного преимущества)

Важно !

- Отрицательное заключение уполномоченного органа не является запретом для доработки проекта и его повторного рассмотрения в порядке, установленном Законом о ГЧП
- Положительное заключение уполномоченного органа не гарантирует запуск проекта (окончательное решение принимает высший исполнительный орган государственной власти соответствующего уровня)

15.3.1. Оценка эффективности и определение сравнительного преимущества

Оценку эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества проводят:

- ✓ федеральный уполномоченный орган (Минэкономразвития России) – в отношении проектов федерального уровня;
- ✓ уполномоченный орган субъекта Российской Федерации – в отношении проектов регионального и муниципального уровня.

Оценка эффективности проекта проводится перед определением его сравнительного преимущества. В рамках оценки эффективности определяется:

- 1) финансовая эффективность проекта;
- 2) социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования.

Важно !

Облигации, значения доходностей к погашению которых используются для целей оценки финансовой эффективности и сравнительного преимущества проекта, должны иметь постоянный купонный доход (облигации типа ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД). Необходимая информация по таким облигациям размещена на сайте Московской Биржи в разделе «Индексы» / «Индикаторы денежного рынка» (<http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/>), сайте Rusbonds.ru в разделе «Поиск облигаций» (<http://www.rusbonds.ru>), сайте cbonds.ru и в иных информационных источниках (Bloomberg, Reuters).

Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из указанных критериев, определяется его сравнительное преимущество на основании соотношения следующих показателей:

1) чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта ГЧП / МЧП и чистые дисконтированные расходы при реализации государственного контракта, муниципального контракта;

2) объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП / МЧП и объем принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального контракта.

Важно !

Для целей адекватной оценки объёма принимаемых на себя публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта необходимо внимательное изучение условий соглашения. Например, риск увеличения стоимости создания объекта соглашения (если таковой лежит на публичном партнёре) может быть отнесен как на расходы публичного партнёра по софинансированию создания объекта (капитальный грант), так и на субсидии, выплачиваемые на стадии эксплуатации в целях возмещения капитальных затрат частного партнера.

Важно !

Точные значения вероятных отклонений, учитываемых при расчете объема принимаемых публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта и государственного (муниципального) контракта определяются инициатором проекта самостоятельно на основании технико-экономических параметров проекта.

Отрицательный результат оценки проекта является основанием для доработки проекта или отказа от его реализации.

Положительный результат оценки проекта является основанием для реализации проекта.

Важно !

Фактически в уполномоченный орган предоставляется предварительный расчет оценки эффективности и сравнительного преимущества, сделанный по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 ноября 2015 г. № 894.

Уполномоченный орган осуществляет лишь верификацию данного расчета.

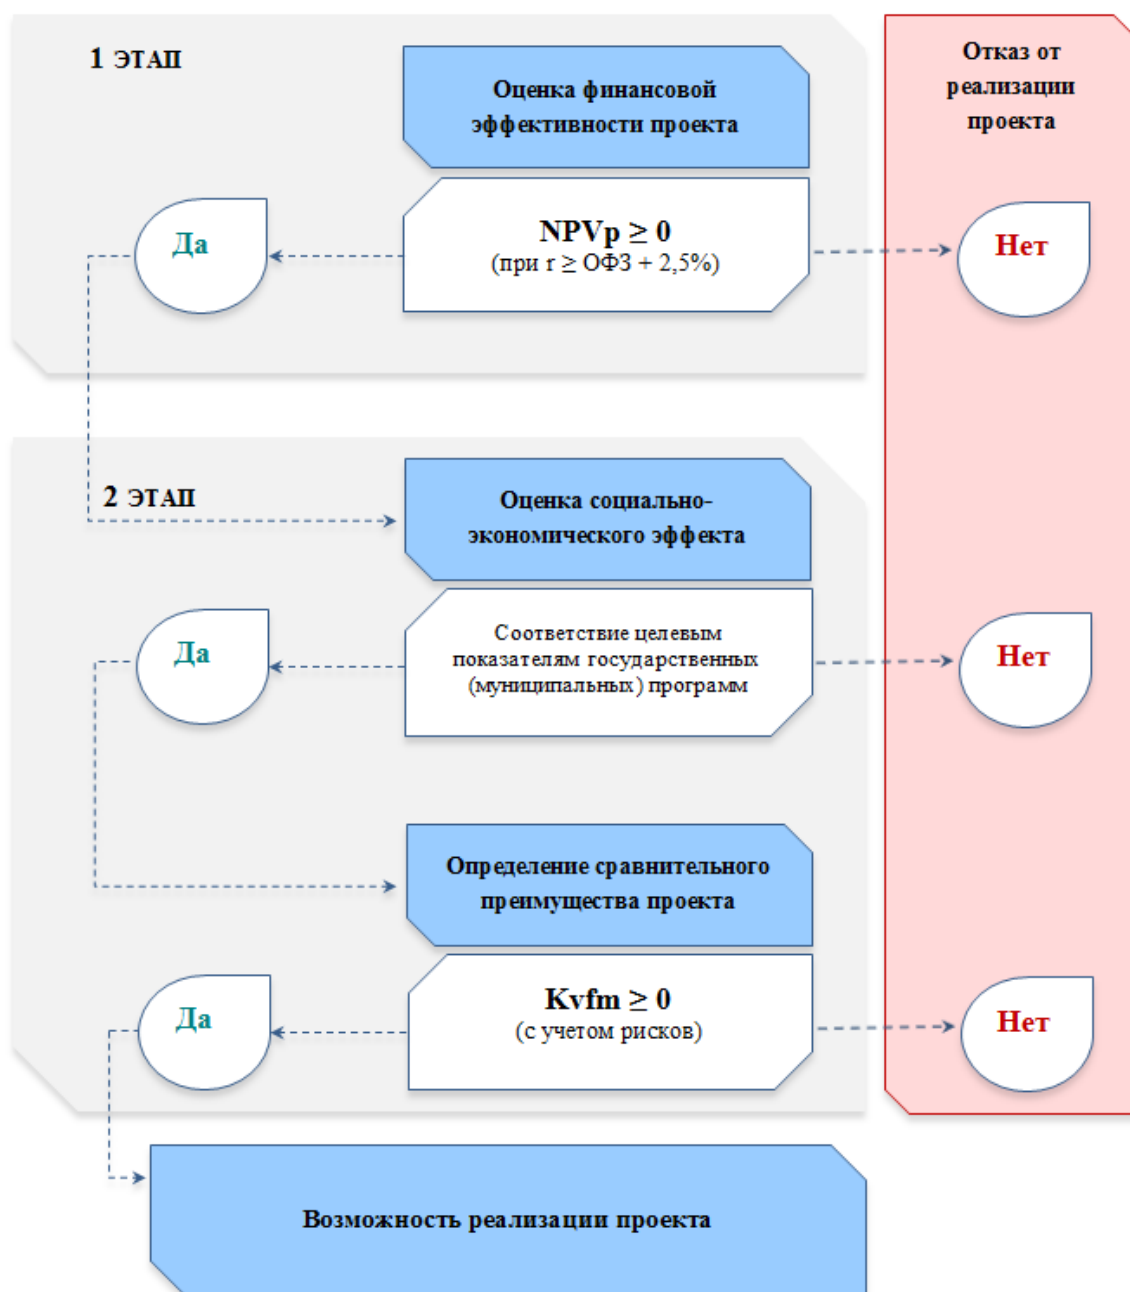


Рисунок 5 - Алгоритм проведения оценки эффективности проекта ГЧП/МЧП и определения его сравнительного преимущества

15.3.2. Переговоры с уполномоченным органом

При рассмотрении проекта ГЧМ /МЧП уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта (Рисунок 6, Рисунок 7).

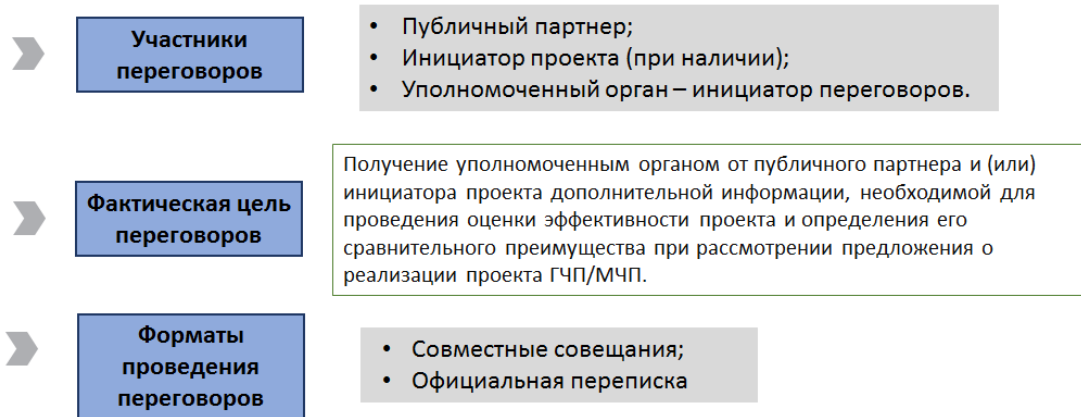


Рисунок 6 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (1)

Важно !

- Участники переговоров вправе привлекать консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц. При этом публичный партнер и инициатор проекта обеспечивают неразглашение привлеченными лицами информации о ходе переговоров.
- Переговоры проводятся в пределах общего срока оценки предложения о реализации проекта.



Рисунок 7 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (2)

16. Решение о реализации проекта ГЧП / МЧП

При наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий 60 дней, принимается решение о реализации проекта соответственно:

- ✓ Правительством Российской Федерации,
- ✓ высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
- ✓ главой муниципального образования.

На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

17. Отбор частного партнера

17.1. Проведение конкурса

Конкурс может быть как открытым, так и закрытым (в случае, если сведения об объекте соглашения составляют государственную тайну). Организация и проведение конкурса на право заключения СГЧП (СМЧП) должны быть обеспечены публичным партнером в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия решения о реализации проекта.

Основные этапы организации и проведения конкурса отражены на Рисунке 8.



Рисунок 8 - Этапы организации и проведения конкурса на заключение СГЧП (СМЧП)

Важно !

Форма и порядок направления заявления на участие в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП / МЧП утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1387.

Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера в следующих случаях:

- ✗ представлено менее 2 заявок на участие в конкурсе;
- ✗ менее чем 2 лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками конкурса;
- ✗ представлено менее двух конкурсных предложений;
- ✗ в течение установленного срока соглашение не было подписано победителем конкурса, либо в случае его отказа от заключения соглашения.

17.2. Совместный конкурс

Допускается проведение совместного конкурса, в случае если необходимо заключение СГЧП (СМЧП) с двумя и более публичными партнерами, например, когда строительство / реконструкция одного объекта связано со строительством / реконструкцией другого объекта, и при этом указанные объекты находятся в собственности различных публично-правовых образований.

Публичные партнеры обязаны заключить соглашение о проведении совместного конкурса, в рамках которого определяют взаимные права и обязанности, ответственность, а также конкретного публичного партнера, который выступит организатором совместного конкурса. По итогам совместного конкурса каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного конкурса. Порядок проведения совместного конкурса по соглашениям о ГЧП / МЧП регулируется статьей 20 Закона о ГЧП.

17.3. Заключение соглашения без конкурса

Соглашение о ГЧП / МЧП заключается по итогам проведения конкурса на право заключения такого соглашения. В отдельных случаях допускается заключение соглашения без конкурса:

- 1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения предложения о реализации проекта, подготовленного в порядке частной инициативы, на сайте torgi.gov.ru, не поступили заявления об участии в конкурсе от иных лиц или если такие заявления не соответствуют требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона о ГЧП;
- 2) с лицом, единственным представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником (при отсутствии заявок других лиц, конкурс не проводится);
- 3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе;
- 4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение.

18. Частная инициатива

18.1. Общая концепция

Законом о ГЧП предусмотрено право частной стороны выступить с инициативой о реализации проекта ГЧП (МЧП).

Кто может выступать инициатором проекта ГЧП

Инициатором может выступить только российское юридическое лицо, которое соответствует определенным в Законе о ГЧП требованиям:

- ✓ наличие банковской гарантии (не менее 5 %),
- ✓ непроведение ликвидации и отсутствие решения о банкротстве,
- ✓ неприменение административного приостановления деятельности,
- ✓ отсутствие недоимки по налогам, сборам и иной задолженности по обязательным платежам,
- ✓ наличие необходимых лицензий.

Порядок заключения **соглашения о ГЧП** в порядке частной инициативы



Рисунок 9 – Процедура заключения СГЧП (СМЧП) в порядке частной инициативы

18.2. Предварительные переговоры

Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения предварительных переговоров между инициатором проекта и публичным партнером до направления предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП.

Важно !

Порядок проведения указанных переговоров, включая повестку и форму протокола, установлен приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 864

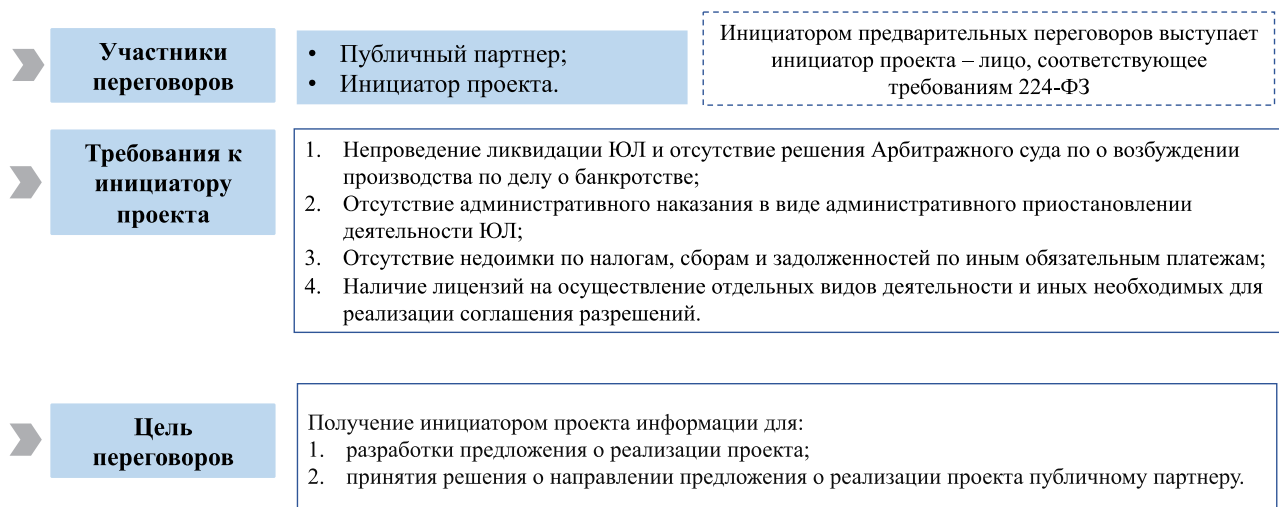


Рисунок 10 – Основные положения предварительных переговоров



Рисунок 11 – Общая процедура проведения предварительных переговоров

18.3. Направление предложения

Предложение о реализации проекта ГЧП направляется инициатором такого проекта публичному партнеру. При этом инициатор одновременно с направлением предложения предоставляет публичному партнеру независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта, выданную банком или иной кредитной организацией.

Таблица 8 – Содержание предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП

Разделы формы предложения о реализации проекта:	
1	Описание проекта, а также обоснование его актуальности
2	Цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования
3	Срок реализации проекта или порядок определения такого срока
4	Сведения о публичном партнере
5	Сведения об органе / юридическом лице, обеспечившем разработку предложения
6	Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции
7	Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода
8	Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта
9	Сведения о финансовой эффективности проекта
10	Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта
11	Сведения о сравнительном преимуществе проекта
12	Описание рисков, связанных с реализацией проекта
Обязательные приложения к предложению о реализации проекта:	
› проект соглашения	› задание на проектир. / проектная документация
› финансовая модель	› обоснование сравнит. преимущ. + опис. рисков

Важно !

Форма предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП и порядок его направления утверждены постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1386.

18.4. Рассмотрение предложения публичным партнером

Публичный партнер проводит первичную оценку проекта на предмет необходимости и возможности его реализации в отношении предлагаемого объекта, а также проверяет полноту и достоверность представленных данных⁹. Срок такого рассмотрения не может превышать 90

⁹ Полный перечень критериев, учитываемых при рассмотрении предложения публичным партнером, установлен пунктом 5 Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП,

дней (со дня поступления предложения). По итогам рассмотрения публичный партнер принимает одно из следующих решений:

1. решение о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2. решение о невозможности реализации проекта.


Публичный партнер при рассмотрении предложения о реализации проекта вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также провести с ним переговоры.

18.5. Переговоры с публичным партнером

Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения переговоров между инициатором проекта и публичным партнером в процессе рассмотрения последним предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП.

Важно !

Порядок проведения указанных переговоров, включая форму протокола, установлен приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 863

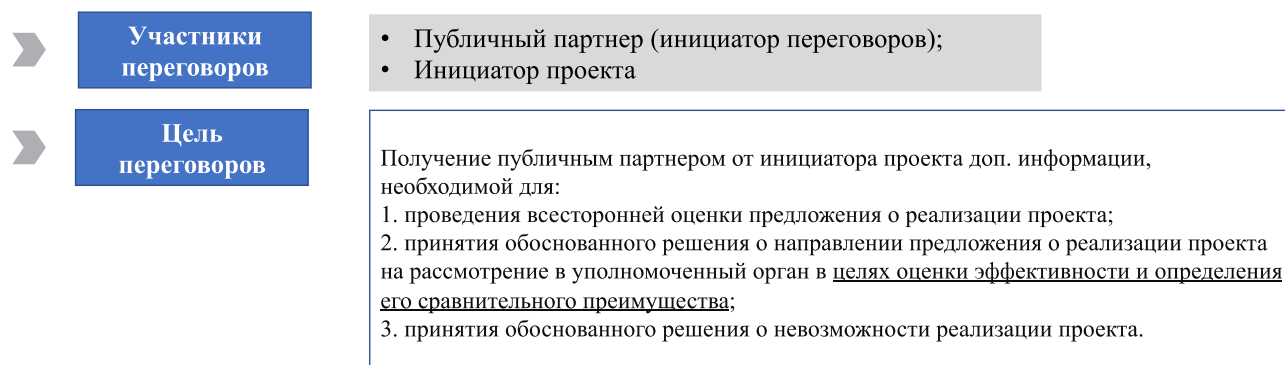

Участники переговоров вправе привлекать консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц. *При этом публичный партнер и инициатор проекта обеспечивают неразглашение привлеченными лицами информации о ходе переговоров.*

Переговоры проводятся в пределах общего срока рассмотрения предложения о реализации проекта.

Рисунок 12 – Основные положения переговоров



Рисунок 13 – Общая схема проведения переговоров

18.6. Особенности принятия решения о реализации проекта

Законом о КС установлены требования к содержанию решения о заключении КС, которое принимается в случае заключения КС без проведения конкурса.

Поскольку конкурс на право заключения КС не проводится, определяется гораздо меньший состав сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС (меньший по сравнению с перечнем сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС путем проведения конкурса).

Такое решение должно устанавливать:

- 1) условия концессионного соглашения;
- 2) порядок заключения концессионного соглашения;
- 3) требования к концессионеру.

18.7. Сбор заявок на участие в конкурсе

Решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса должно быть мотивированным и принимается в случае, если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта на torgi.gov.ru, публичному партнеру не поступили от иных лиц заявления (в письменной форме) с приложением банковской гарантии, либо если заявления поступили от лиц, не соответствующих требованиям.

Важно !

Порядок направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, включая форму такого заявления, утвержден постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1387.

➤ Данный порядок применяется если решение о реализации ГЧП/МЧП принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного лицом, которое в соответствии с 224-ФЗ может быть частным партнером

➤ Цели разработки	Регламентация возможности участия в конкурсе на право заключения соглашения иных лиц, которые могут быть частным партнером	<ul style="list-style-type: none"> • в соответствии с нормами ФЗ-224; • предоставившие банковскую гарантию; • подавшие заявление о намерении участвовать в конкурсе.
➤ Банковская гарантия	Не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования проекта	
➤ Заявитель	Гарантирует компенсацию расходов инициатору проекта в случае выигрыша на конкурсе	
➤ Приложения к заявлению о намерении	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банковская гарантия; 2. Нотариально заверенные копии учредительных документов; 3. Выписка из ЕГРЮЛ; 4. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельства о допуске саморегулируемых организаций к выполнению работ и иные разрешения; 5. Справки налогового органа, терр. органа ПФР, терр. органа ФСС РФ о состоянии расчетов заявителя. 	

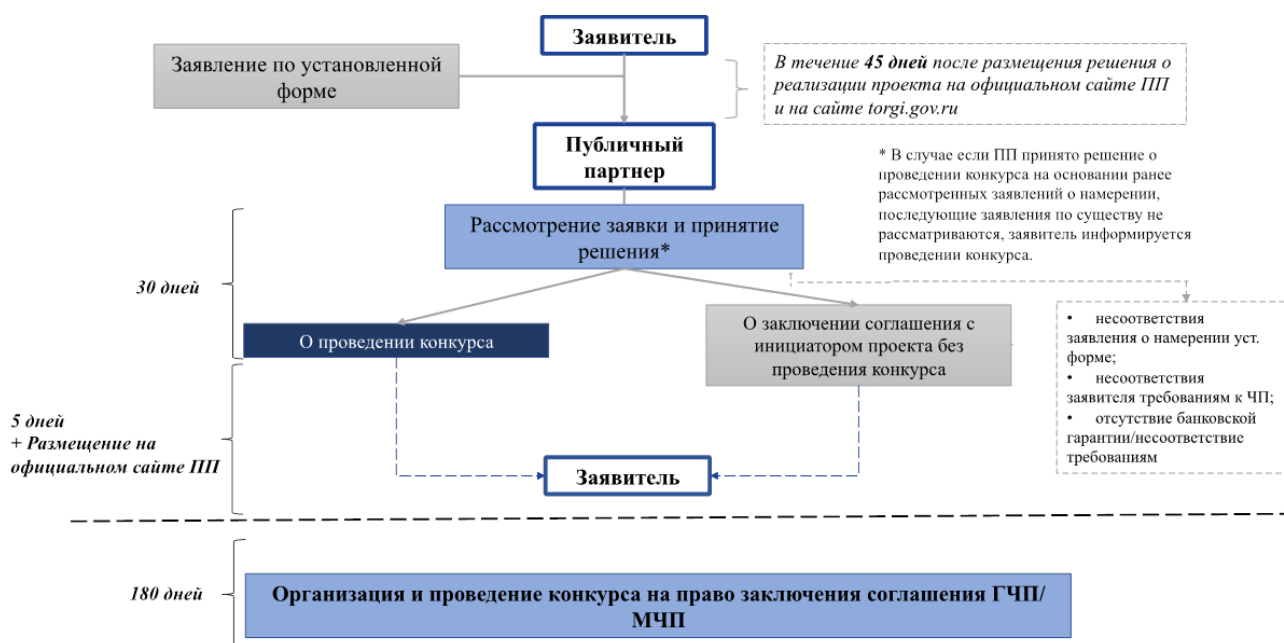


Рисунок 14 – Порядок направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе

Таблица 9 – Существенные положения формы заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП / МЧП

I. Сведения о решении о реализации проекта ГЧП/МЧП	
Правовой акт об утверждении решения о реализации проекта	
II. Сведения о заявителе	
Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица – заявителя	Выписка из ЕГРЮЛ
Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица - заявителя	Выписка из ЕГРЮЛ
Сведения о наличии / отсутствии административного приостановления деятельности юридического лица – заявителя	Выписка из ЕГРЮЛ
Сведения о наличии / отсутствии необходимых лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению работ и иных решений	Выписка из ЕГРЮЛ; лицензии и разрешения
Сведения о наличии / отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам	Справки налогового органа, терр. органа ПФР, терр. органа ФСС РФ
III. Сведения о предлагаемом порядке компенсации (в объеме, установленном решением) расходов лицу, которое подготовило предложение о реализации проекта, на основании которого принято решение	
Описание предлагаемого порядка компенсации затрат инициатора проекта	

19. Заключение, изменение, прекращение соглашения о ГЧП

СГЧП (СМЧП) заключается с победителем конкурса или с инициатором проекта ГЧП (МЧП) при соблюдении им определенных условий.

В отличие от КС, для СГЧП (СМЧП) не рекомендованы примерные или типовые формы. В таком подходе воплощен принцип свободы заключения соглашения.

Об изменении СГЧП (СМЧП)

По общему правилу изменение условий СГЧП (СМЧП) возможно по соглашению сторон.

Важно !

Условия СГЧП (СМЧП), определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного предложения частного партнера относительно критериев конкурса (технические, финансово-экономические и юридические критерии), **могут быть изменены в одностороннем порядке** лицом, принявшим решение о реализации проекта.

Специальные правила установлены в отношении изменения существенных условий СГЧП (СМЧП), если его реализация стала невозможной в установленные сроки в результате наступления определенных обстоятельств:

- обстоятельства непреодолимой силы,
- существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении СГЧП (СМЧП),
- в случаях, когда вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных СГЧП (СМЧП) обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий

(бездействия) органов власти и (или) их должностных лиц.

Такие изменения должны быть инициированы частным партнером и являются важной гарантией его защиты от изменения экономических, политических и иных условий реализации проекта.

Механизм изменения выглядит следующим образом – частный партнер вносит предложение об изменении существенных условий соглашения, которое публичный партнер **обязан** рассмотреть в 30-дневный срок.

При этом если предложение частного партнера об изменении существенных условий соглашения затрагивает доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, публичный партнер вправе либо представить частному партнеру мотивированный отказ, либо уведомить его о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, эта группа существенных условий может быть изменена только по соглашению сторон.

Бездействие публичного партнера дает частному партнеру право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств до принятия соответствующего решения или предоставления мотивированного отказа.

СГЧП (СМЧП) также может быть изменено на основании решения суда по требованию одной из сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

О прекращении СГЧП (СМЧП)

СГЧП (СМЧП) прекращается:

- по истечении срока его действия,
- по соглашению сторон,
- в случае досрочного расторжения на основании решения суда,
- по иным предусмотренным СГЧП (СМЧП) основаниям.

В случае досрочного прекращения СГЧП (СМЧП), которым предусмотрена обязанность частного партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта соглашения, такой объект подлежит передаче частным партнером публичному партнеру при условии компенсации затрат частного партнера по СГЧП (СМЧП) за вычетом понесенных публичным партнером и третьими лицами в связи с досрочным прекращением соглашения убытков.

Важно !

Условия о порядке и сроках возмещения расходов и об иных обязательствах сторон СГЧП (СМЧП) в случае его досрочного прекращения являются существенными.

В случае досрочного расторжения СГЧП (СМЧП) по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения:

- объект соглашения подлежит передаче публичному партнеру,
- компенсация частному партнеру не выплачивается,
- права частного партнера на земельный, лесной участок, участок недр, водный объект или его часть недр, предоставленных ему в целях реализации соглашения, прекращаются (с момента вступления в силу решения суда).

Переход прав и обязанностей частного партнера по СГЧП (СМЧП)

Такой переход допускается в двух случаях.

1. Реорганизация частного партнера. Если реорганизованное (возникшее в результате реорганизации) юридическое лицо соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией, переход прав и обязанностей частного партнера по СГЧП (СМЧП) допускается. Ситуацию несоответствие таким требованиям Закон о ГЧП специально не урегулирует, однако стороны могут установить последствия самостоятельно в СГЧП (СМЧП). Например, по аналогии с Законом о КС, это может являться основанием для расторжения СГЧП (СМЧП).

2. Замена частного партнера. Вследствие серьезного нарушения обязательств частным партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом в целях предотвращения прекращения проекта допускается замена частного партнера.

Данный механизм позволяет сохранить интересы кредиторов, главным обеспечением которых являются поступления, получаемые от реализации проекта, а также публичного партнера, поскольку в противном случае ему необходимо будет принять на себя ответственность за реализацию проекта и самостоятельно продолжить его осуществление.

Нужно отметить, что Закон о ГЧП, в отличие от Закона о КС, не обуславливает возможность замены частного партнера наличием прямого соглашения.

Замена частного партнера может быть проведена либо путем проведения публичным партнером конкурса, либо без конкурса. Последний случай обусловлен рядом обстоятельств:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств по СГЧП (СМЧП), которое влечет нарушение существенных условий СГЧП (СМЧП), или причинение либо угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, или должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве в отношении частного партнера.
- принято решения о замене частного партнера без проведения конкурса с учетом мнения в письменной форме финансирующего лица (если имеется прямое соглашение).

Важно !

Новый частный партнер должен соответствовать предъявляемым к частным партнерам требованиям, установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией.

Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя такого конкурса осуществляются по общим правилам, установленным в Законе о ГЧП.

Между публичным партнером и победителем конкурса - новым частным партнером заключается соглашение о замене лица по соглашению. В этот момент права и обязанности первоначального частного партнера по СГЧП (СМЧП) прекращаются.

Вследствие замены частного партнера изменяются условия СГЧП (СМЧП) согласно фактически исполненным первоначальным частным партнером обязательствам с учетом предложений по улучшению СГЧП (СМЧП), представленных победителем конкурса (в случае его проведения).

Объект СГЧП (СМЧП) передается первоначальным частным партнером новому частному партнеру по акту приема-передачи. Указанный акт является основанием прекращения

и возникновения права собственности на объект у первоначального и нового частного партнера соответственно.

20. Мониторинг СГЧП (СМЧП)

Мониторинг СГЧП (СМЧП) проводится ежегодно, начиная с даты принятия решения о реализации проекта, в целях обеспечения открытости и доступности информации о таких проектах, а также совершенствования законодательства о ГЧП / МЧП. Порядок мониторинга утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888.

В целях проведения мониторинга публичный партнер размещает сведения о соглашениях ГЧП / МЧП в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – Система).

Важно !

Информация об изменении статуса проекта (о юридически значимых действиях), должна размещаться в Системе публичным партнером в течении 10 рабочих дней со дня совершения соответствующих действий с приложением копий соответствующих документов.

Мониторинг проводят:

- ✓ Минэкономразвития России – соглашения, в которых публичным партнером является Российская Федерация, (включая соглашения, заключенные по результатам совместного конкурса с участием Российской Федерации);
- ✓ Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – если публичным партнером является субъект Российской Федерации (включая соглашения, заключенные по результатам совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации);
- ✓ Уполномоченный орган местного самоуправления – если публичным партнером является муниципальное образование.

Указанные органы обеспечивают текущую проверку на достоверность внесенных публичными партнерами сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты мониторинга.

Важно !

На основе данных, предоставленных в Системе в рамках мониторинга, в дальнейшем будет рассчитываться рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы ГЧП.

Осуществляется с использованием гос. автоматизированной системы «Управление» («ГАСУ»), а также в общедоступных официальных сведениях. Отчетным периодом признается один календарный год.

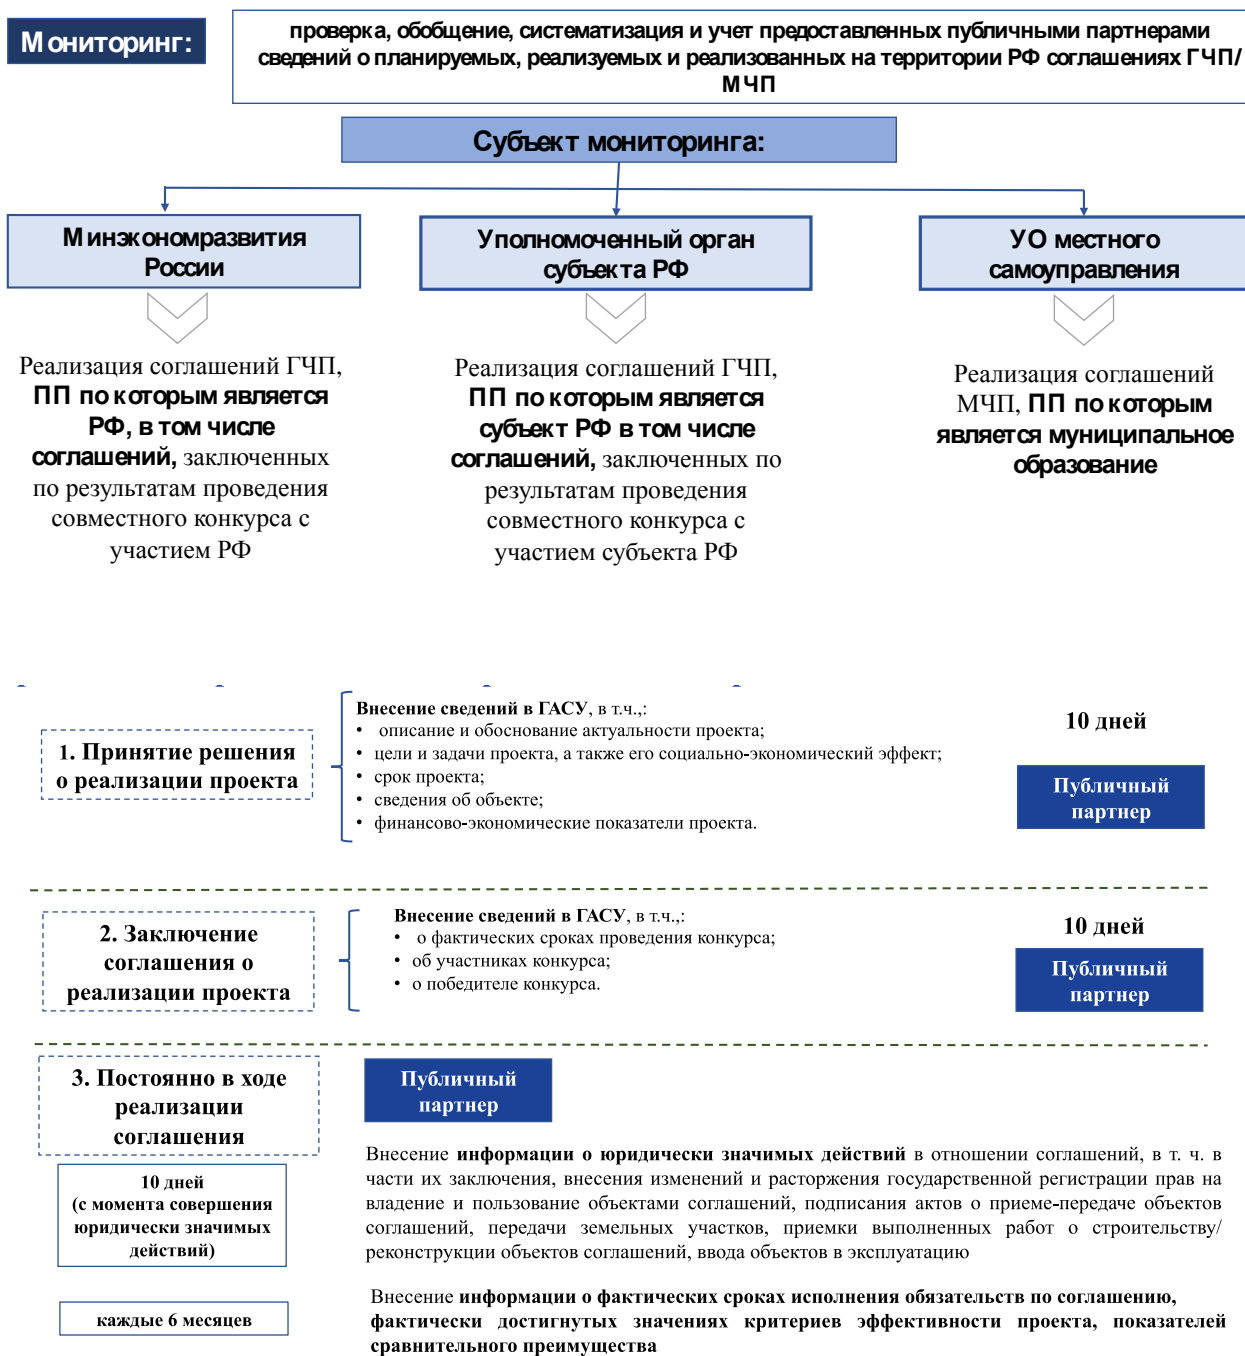


Рисунок 15 – Организация проведения мониторинга по этапам реализации соглашения



Рисунок 16 – Последовательность проведения мониторинга

21. Контроль соглашений о ГЧП

Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения публичным партнером контроля за исполнением СГЧП

Важно !

Порядок контроля установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490.

Цель проведения контроля:

Выявление и предотвращение нарушений условий соглашения частным партнером

Субъект контроля:

Публичный партнер (ПП), органы и ЮЛ, выступающие на стороне ПП (в лице представителей, имеющие право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации на основании ФЗ-224).

В качестве контрольных лиц могут привлекаться организации и/или независимые эксперты, ответственность за деятельность которых несет ПП).

1. Перечень органов и ЮЛ, объем и состав функций определяется соглашением ГЧП/МЧП на основании решения о реализации проекта.
2. Представители ПП, органов и ЮЛ не вправе:
 - вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера, не связанной с реализацией соглашения;
 - разглашать конфиденциальные сведения, коммерческую и государственную тайну.

Предмет контроля на этапе проектирования

- ✓ Соблюдение установленных сроков проектирования;
- ✓ Соответствие предоставляемой документации **требованиям соглашения, заданию на проектирование, требованиям законодательства.**

Для проверки соответствия заданию на проектирование и требованиям соглашения могут создаваться комиссии, экспертные группы, в т. ч. с участием представителей частного партнера, а также могут привлекаться сторонние организации.

Предмет контроля на этапе создания и эксплуатации и/или технического обслуживания

Соблюдение обязательств, в т.ч.:

- ✓ по созданию объекта соглашения и соблюдении сроков;
- ✓ по обеспечению соответствия установленным технико-экономическим показателям;
- ✓ по осуществлению полного и частичного финансирования объекта соглашения;
- ✓ по эксплуатации и/или тех. обслуживанию объекта в соответствии с целями, уст. в соглашении;
- ✓ по достижению результатов, указанных в соглашении, в т.ч. значений КРП и показателей сравнительного преимущества;
- ✓ по передаче объекта соглашения в собственность ПП;
- ✓ по целевому использованию земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр, а также технологически связанного движимого и недвижимого имущества.

1. Контроль осуществляется на основании утверждаемого ПП **Плана контрольных мероприятий** на календарный год;
2. Возможно проведение **плановых (не реже 1 раза в квартал) и внеплановых проверок (оповещение за 14 дней);**
3. **Предмет контроля на каждом этапе утверждается соглашением о ГЧП, МЧП;**
4. **Максимальный срок контрольного мероприятия = 14+14 календарных дней;**
5. **Акт о результатах контрольного мероприятия оформляется ПП в течение 5 дней после завершения проверки;**
6. **Выявление факта неисполнения ЧП условий соглашения – основание уведомления об устранении выявленных нарушений;**
7. **Неисполнение предписания уведомления – основание досрочного расторжения соглашения в судебном порядке.**

Важно !

Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что **контроль публичного партнера за исполнением СГЧП не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), муниципального контроля.**

Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Стоит также подчеркнуть, что согласно Закону о ГЧП по окончании осуществления контрольных мероприятий должен быть составлен акт о результатах контроля, который подлежит размещению публичным партнером на своем официальном сайте в сети Интернет. Исключение из этого правила предусмотрено лишь для объектов, сведения о которых составляют государственную тайну либо имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Акт должен быть размещен в течение пяти дней с даты его составления и доступен в течение всего срока действия СГЧП и три года после дня окончания данного срока. Указанное правило основывается на принципе открытости и доступности информации о ГЧП, закрепленного в самом Законе о ГЧП.

VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О КС

22. Общая схема реализации концессионного соглашения

В соответствии с Законом о КС концессионное соглашение может быть заключено как по инициативе публичной стороны, так и по инициативе инвестора.

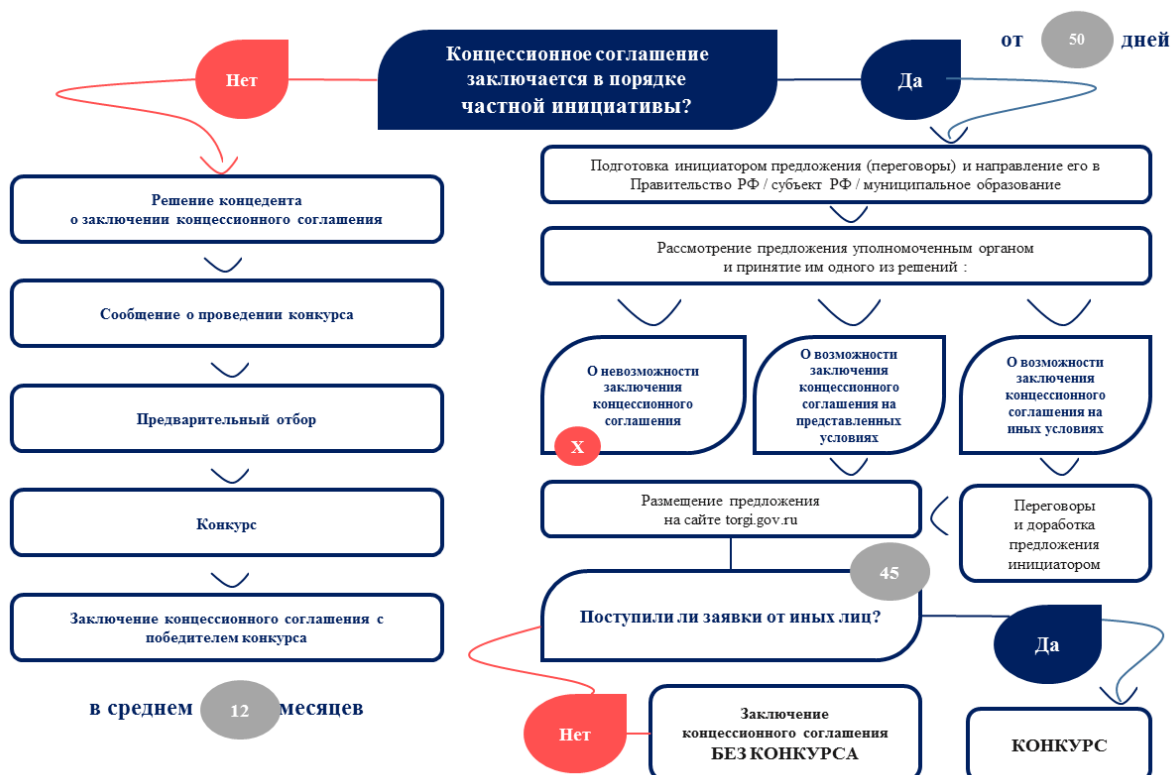


Рисунок 17 – Порядок заключения концессионного соглашения

23. Частная концессионная инициатива (ЧКИ)



Инициатором проекта может выступить как российское, так и иностранное юридическое лицо, либо консорциум, которые соответствуют определенным в Законе о КС требованиям (наличие банковской гарантии, отсутствие решения о ликвидации и определения о возбуждении производства по делу о банкротстве, а также задолженности по обязательным платежам в бюджеты).

Важно !

Форма и требования к предложению утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 300.

Рассмотрение предложения уполномоченным органом

Орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения, в течение 30 календарных дней со дня поступления предложения рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

1. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на представленных условиях – уполномоченный орган в течение 10 дней размещает предложение на сайте torgi.gov.ru для сбора заявок на конкурс;

2. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях – уполномоченный орган проводит переговоры с инициатором, после рассматривает доработанное предложение (в течение 3-х дней) и в течение 10 дней с момента согласования предложения размещает предложение на сайте torgi.gov.ru для сбора заявок на конкурс;

3. Решение о невозможности заключения концессионного соглашения – уполномоченный орган указывает основание отказа.

Важно !

Минэкономразвития России будут разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по проведению оценки проектов, инициируемых в рамках Закона о КС.

24. Отбор концессионера

24.1. Проведение конкурса

Конкурс на заключение концессионного соглашения может быть как закрытым, так и открытым. Вид конкурса, а также его критерии и параметры устанавливаются решением о заключении КС. Порядок проведения конкурса на заключение концессионного соглашения, а также требования к конкурсной документации установлены Главой 3 Закона о КС.

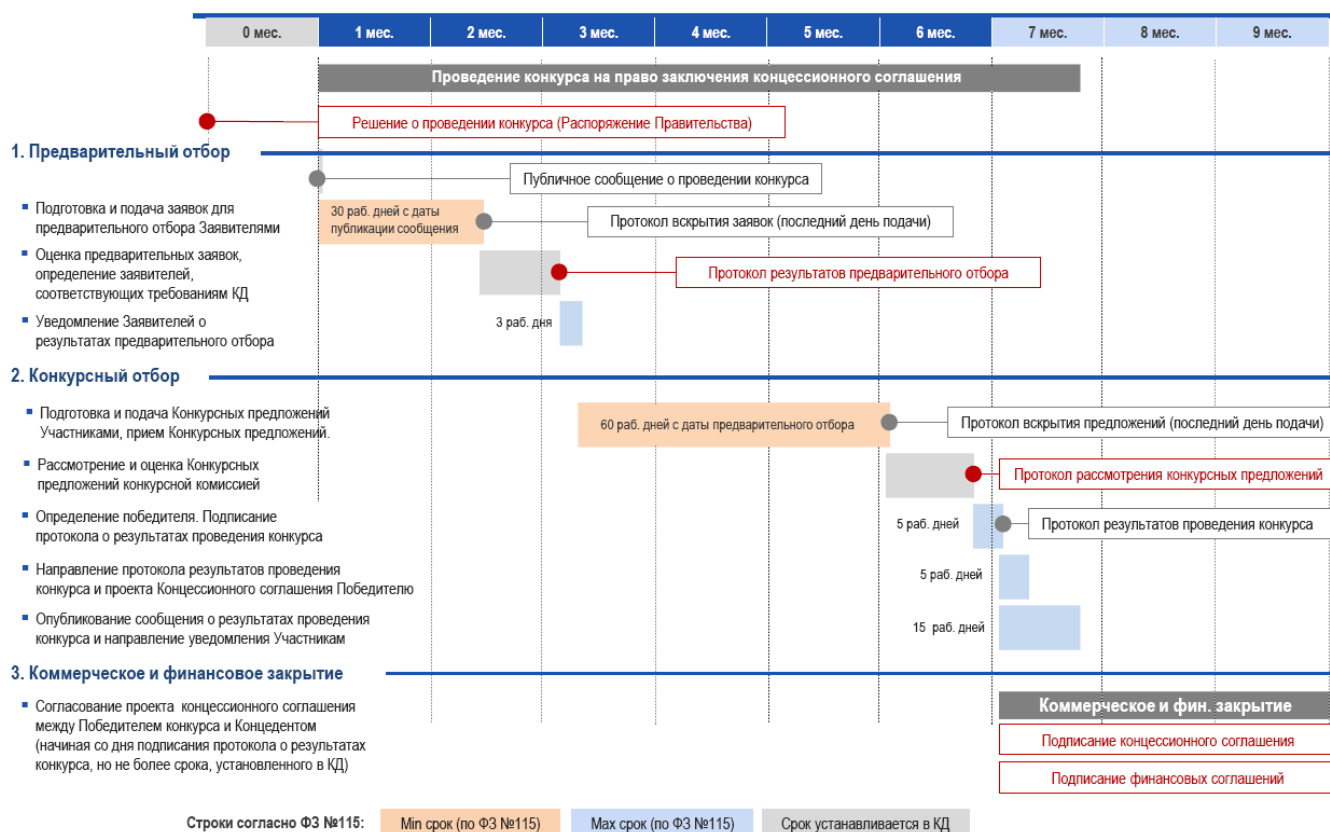


Рисунок 18 – Конкурс на заключение концессионного соглашения

24.2. Совместный конкурс

Допускается проведение совместного конкурса в случае если необходимо заключение КС с двумя и более концедентами. Это может быть необходимо, например, когда строительство / реконструкция одного объекта связано со строительством / реконструкцией другого объекта, и при этом указанные объекты находятся в собственности различных публично-правовых образований.

По итогам совместного конкурса каждый концедент заключает соглашение с победителем совместного конкурса. Порядок проведения совместно конкурса по КС регулируются частью 1.3 статьи 5 Закона о КС.

24.3. Заключение концессионного соглашения без конкурса

Если в течение 45 дней не поступило таких заявок, КС заключается без конкурса. После указанного срока в течение 30 дней принимается решение о заключении КС (до этого времени инициатор должен представить банковскую гарантию), затем в течение 5 дней уполномоченный орган направляет концессионеру проект КС со сроком подписания – не больше месяца.

Если в течение 45 дней после размещения предложения (ЧКИ) на сайте torgi.gov.ru поступили заявки от иных лиц, которые отвечают установленным требованиям, проводится конкурс в общем порядке Закона о КС.

25. Мониторинг концессионного соглашения

В настоящее время мониторинг реализации КС осуществляется в рамках сбора сведений об уровне развития сферы ГЧП в субъектах Российской Федерации в соответствии с:

✓ распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)»,

✓ распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № 642-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации».

Техническая возможность предоставления данных о перечне, характеристиках и статусе реализации КС в субъектах Российской Федерации и соответствующие формы будет реализована в составе государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Кроме того, с 1 января 2017 г.¹⁰ мониторинг заключения и реализации заключенных КС будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации. Предметом данного мониторинга являются существенные условия КС, в том числе:

✓ соблюдение сторонами КС взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, установленных в КС,

✓ соблюдение сроков реализации КС,

✓ объем привлекаемых инвестиций,

✓ иные существенные условия КС.

Порядок такого мониторинга будет дополнительно утвержден Правительством Российской Федерации.

¹⁰ Вступление в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях»

26. Контроль концессионного соглашения

Законом о КС предусмотрена возможность проведение контроля за исполнением КС.

Следует отметить, что общие положения о таком контроле во многом схожи с положениями о контроле за СГЧП (см. Раздел 21). Однако имеет место ряд существенных различий между ними:

- (i) Право публичного партнера на осуществление контроля следует из СГЧП (СМЧП), тогда как аналогичное право концедента закреплено Законом о КС.
- (ii) Закон о КС не регламентирует цели контроля.
- (iii) Контроль концедента осуществляется органами или юридическими лицами, которые уполномочены конcedesентом на основании Закона о КС на осуществление прав и обязанностей концедента по концессионному соглашению, в то время как в по Закону о ГЧП контроль может осуществляться не только органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, но и самим публичным партнером.

(iv) Порядок осуществления контроля за исполнением СГЧП установлен Правительством РФ. Применительно к контролю концедента такой порядок предусматривается каждым конкретным концессионным соглашением.

Важно !

Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что **контроль концедента за исполнением КС не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), муниципального контроля.**

Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

VII. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ

27. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства

Для успешной реализации проектов ГЧП необходимо, прежде всего, определить реальную потребность субъекта Российской Федерации или конкретного муниципалитета в соответствующих объектах публичной инфраструктуры.

На сегодняшний день в Российской Федерации для ряда сфер отсутствует корректная методика оценки обеспеченности территорий объектами публичной инфраструктуры. Вместе с тем представляется целесообразным сформировать перечень уже существующих объектов, имеющих коммерческий потенциал (пользующихся спросом у населения), но требующих реконструкции и (или) модернизации. К таким объектам могут относиться детские сады, больницы, спортивные сооружения, кинотеатры, дороги, иные объекты публичной инфраструктуры.

Кроме того, представляется необходимым проведение анализа стратегических документов на предмет существующих целей и задач по развитию инфраструктуры. Также возможно проведение комплексных маркетинговых исследований, опросов населения и общественных организаций в целях выявления потребности в новых объектах.

По итогам указанной подготовительной работы должно быть реализовано:

- Формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов, на инвестиционных порталах субъекта Российской Федерации, на сайте уполномоченного органа / профильного органа исполнительной власти;
- Отражение задач по развитию публичной инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов ГЧП, в региональных и муниципальных стратегических документах целеполагания (стратегия социально-экономического развития, инвестиционная стратегия и др.);
- Закрепление мер по обеспечению потребности в объектах публичной инфраструктуры в документах планирования и программирования (регионального и муниципального уровней), в том числе, формирование указанных перечней объектов;
- Отражение планов по развитию публичной инфраструктуры в документах территориального планирования регионального и муниципального уровня.
- Реализация стимулирующих мер (в т.ч. налоговых) при реализации проектов ГЧП, в том числе в социальной сфере.

Важно !

Обязательства субъекта РФ в отношении заключенных концессионных соглашений, соглашений ГЧП, должны найти отражение не только в решении об их реализации, но и в региональных программных документах

Также обращаем внимание на важность качественной проработки проекта на подготовительном этапе, в рамках которой необходимо обеспечить:

- ✓ Выявление и детальный анализ рисков;
- ✓ Сбалансированное распределение рисков между сторонами и закрепление в соглашении;
- ✓ Соответствие условий соглашения нормам Закона о КС и Закона о ГЧП соответственно;
- ✓ Максимальная детализация соглашения о ГЧП;
- ✓ Соответствие проекта приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, наличие положительных социальных и бюджетных эффектов;
- ✓ Наличие четкой проработанной технической концепции проекта;
- ✓ Гарантированные денежные потоки в рамках проекта;
- ✓ Привлекательность показателей финансовой эффективности для частного инвестора (в случае разработки предложения публичной стороной);
- ✓ Предварительное обсуждение условий реализации проекта с потенциальными инвесторами, а также финансирующими организациями.

27.1. Особенности в социальной сфере

Для ряда проектов ГЧП в социальной сфере, в частности для объектов спортивной инфраструктуры, характерен высокий риск спроса на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации объекта. При этом проекты ГЧП должны быть структурированы с учетом необходимости обеспечения возврата инвестиций частной стороне, экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала и доходности деятельности по эксплуатации. Риск спроса на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации объекта, может быть минимизирован путем включения в КС, в соглашение о ГЧП / МЧП следующих механизмов:

- право частной стороны осуществлять оказание платных услуг с использованием объекта соглашения;
- участие публичной стороны в расходах на создание и (или) эксплуатацию объекта соглашения.

Кроме того, указанные проекты могут быть структурированы с обязанностью частного партнера/концессионера предоставлять объект для социальных нужд: проведение некоммерческих мероприятий (соревнования, культурные события и др.), использование объекта социально-ориентированными общественными организациями (например, спортивными школами). В этом случае объем предоставления таких услуг и их стоимость должны быть учтены при структурировании проекта (в финансовой модели) для целей обеспечения окупаемости инвестиций частной стороны и экономически обоснованного уровня дохода на инвестиции и доходности деятельности по эксплуатации.

27.2. Особенности в сфере здравоохранения

Привлекательная для частного сектора инфраструктура здравоохранения, которая может рассматриваться в качестве объектов КС и СГЧП (СМЧП), как правило, закреплена за медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной

системы здравоохранения (далее – государственные учреждения здравоохранения) и формирует единый имущественный комплекс таких учреждений (единая территория, инженерные коммуникации, подъездные пути и т.д.).

В этой связи при рассмотрении возможности заключения КС и СГЧП (СМЧП) в отношении инфраструктуры, закрепленной за государственными учреждениями здравоохранения:

– учредитель медицинской организации должен обосновать, что данное недвижимое имущество является у медицинской организации излишним, или неиспользуемым, либо используемым не по назначению, и принять решение о его изъятии;

– медицинская организация в результате передачи недвижимого имущества по КС и СГЧП (СМЧП) не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены ее уставом;

– органы государственной власти субъектов Российской Федерации при оценке целесообразности реализации проектов ГЧП и заключении КС и СГЧП (СМЧП) обеспечивают сохранение объемов, видов и условий оказываемой населению конкретного субъекта Российской Федерации медицинской помощи, а также доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Поскольку ключевым фактором, определяющим форму и условия проектов ГЧП в сфере здравоохранения, является, прежде всего, потребность пациентов в услугах, которые будут оказываться инвестором (концессионером, частным партнером), решения о реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения принимаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения.

При структурировании проектов ГЧП в сфере здравоохранения и принятии управленческих решений о заключении КС и СГЧП (СМЧП) в отношении объектов здравоохранения органы государственной власти субъектов Российской Федерации руководствуются, в том числе Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», приказом Минздрава России от 08 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

27.3. Особенности в автодорожной сфере

К настоящему моменту практика реализации автодорожных проектов, накопленная ГК «Автодор», предполагает реализацию проектов в рамках Закона о КС. Основные виды заключаемых КС: концессия с прямым сбором платы и концессия с платой концедента.

Предметом КС с прямым сбором платы является выполнение концессионером комплекса работ по строительству (реконструкции) и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, участка автомобильной дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств. Данный договор допускает возможность участия концедента в расходах по созданию объекта КС.

Право собственности на создаваемый объект КС после завершения строительства (реконструкции) возникает у концедента, а объект КС передается концедентом концессионеру во временное владение и пользование на период действия КС. Источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации, а также источником возвратности инвестиции концессионера, осуществленных на стадии строительства, является сбор концессионером платы с пользователей объекта концессионного соглашения в свою пользу. Соглашения по данной модели заключаются, как правило, на срок от 20 до 30 и более лет.

Предметом КС с платой концедента является выполнение концессионером комплекса работ по строительству и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, участка автомобильной дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств.

Концессионер осуществляет сбор платы с пользователей объекта КС в пользу концедента. Источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации является эксплуатационный платеж, выплачиваемый концессионеру со стороны концедента. Возврат вложенных концессионером инвестиций осуществляется поэтапно в течение оговоренного в соглашении срока возврата инвестиций с оговоренной в соглашении нормой доходности. При этом размер такой доходности варьируется в зависимости от достижения установленных целевых транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги, качества оказываемой пользователям автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) транспортной услуги, а также доступности автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) для пользователей. Соглашения по данной модели заключаются, как правило, на срок от 20 до 30 и более лет.

27.4. Особенности в сфере ЖКХ

Оптимальным инструментом ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является передача объектов коммунальной инфраструктуры частным операторам на основании заключенных КС, в которых присутствуют четко поставленные перед инвестором задачи по повышению качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, а также ответственность за их невыполнение. Данный механизм детально законодательно проработан с учетом специфики отрасли ЖКХ.

Кроме того, концессионная модель ГЧП обеспечивает баланс интересов публичной и частной сторон, а также потребителей коммунальных услуг.

Основными особенностями заключения КС в сфере ЖКХ являются:

1. Отсутствие обязанности по установлению концессионной платы.

Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения.

2. Критерии конкурса.

Победителем конкурса признается участник, предложение которого содержит минимальный размер дисконтированной выручки. В случае, если значения дисконтированной

выручки двух лучших участников конкурса отличаются менее, чем на 2 процента, победителем признается участник, предложивший наибольшее количество наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера.

3. Необходимость согласования с органом регулирования тарифов долгосрочных параметров регулирования и целевых значений показателей качества, надежности и энергетической эффективности до объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения.

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ вводятся новые особенности заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ:

4. Обязательное участие субъекта Российской Федерации в качестве самостоятельной стороны КС.

5. Возможность передачи в концессию имущества, часть которого не была зарегистрирована в установленном порядке.

Кроме того, в соответствии с Законом о КС передача в концессию объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться одним из трех способов:

1. На общих основаниях посредством проведения конкурса.
2. Без конкурса путем трансформации действующего договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Без конкурса с применением механизма частной инициативы.

Заключение концессионного соглашения путем проведения конкурса

1. Принятие решения о заключении КС (статья 22 Закона о КС).
2. Направление организатором конкурса в адрес органа регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется заключение КС, заявления о подготовке конкурсной документации (п. 90 Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 510).
3. Согласование органом регулирования долгосрочных параметров регулирования (15 рабочих дней с момента поступления заявления).
4. Опубликование и размещение на сайте <http://torgi.gov.ru/> сообщения о проведении конкурса.
5. Первый этап конкурса – подача заявок на участие в конкурсе.
Минимальный срок подачи заявок – 30 раб. дней с момента опубликования сообщения на сайте <http://torgi.gov.ru/> (статья 27 Закона о КС).
6. Подведение итогов первого этапа конкурса:
 - 6.1 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, опубликование протокола вскрытия конвертов;
 - 6.2 Предварительный отбор участников (статья 29 Закона о КС), опубликование протокола предварительного отбора участников.
7. Уведомление о втором этапе конкурса – для организаций, прошедших предварительный отбор в течение 3 рабочих дней с момента опубликования протокола предварительного отбора.
8. Второй этап конкурса – предоставление конкурсных предложений.

Важно !

В конкурсных предложениях указываются значения и параметры, являющиеся критериями конкурса. Конкурсное предложение содержит:

- объем финансовой поддержки концедента;
- объем расходов концессионера;
- базовый уровень операционных расходов;
- норма доходности, норматив чистого оборотного капитала (нормативный уровень прибыли);
- показатели энергоэффективности и энергосбережения.

Минимальный срок подачи конкурсных предложений – 60 рабочих дней с момента поступления уведомления (статья 30 Закона о КС).

9. Завершение конкурса. Сопоставление и оценка конкурсных предложений, определение победителя конкурса (статьи 31-33 Закона о КС).

Важно !

Общий минимальный срок заключения концессионного соглашения с момента принятия решения, указанного в статье 22 Закона о КС, составляет порядка 140 дней.

Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса путем трансформации действующего договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры

Основные условия для проведения трансформации договора аренды (часть 2.1 статьи 37 Закона о КС):

- договор аренды заключен до 1 января 2010 года;
- срок действия заключаемого КС не превышает срок действия действующего договора аренды.

Важно !

1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», в соответствии с которым допускается трансформация договоров аренды, заключенных в срок до 1 января 2015 года.

Заключение КС без проведения конкурса по частной инициативе

В данном случае предусмотрен следующий алгоритм:

1. Направление предложения инвестора о заключении КС в адрес публично-правового образования, являющегося собственником объекта коммунальной инфраструктуры. К данному предложению прикладывается проект КС (части 4.1, 4.2 статьи 37 Закона о КС).

2. Принятие собственником объекта коммунальной инфраструктуры решения (часть 4.4 статьи 37 Закона о КС):

2.1 о возможности заключения КС на предлагаемых условиях;

2.2 о возможности заключения КС на иных условиях (*в случае принятия данного решения собственником объекта коммунальной инфраструктуры организуются переговоры с инициатором в целях согласования условий КС*);

2.3 о невозможности заключения КС (*в случае принятия данного решения в адрес инициатора направляется ответ с указанием причины отказа*).

3. Согласование собственником объекта с органом регулирования тарифов долгосрочных параметров регулирования.

4. Опубликование собственником объекта коммунальной инфраструктуры предложения о заключении КС по частной инициативе на сайте <http://torgi.gov.ru/>.

5. В случае если в течение 45 дней с момента опубликования соответствующего предложения в адрес собственника объекта коммунальной инфраструктуры поступили уведомления о готовности к заключению концессионного соглашения от иных организаций, собственник обязан инициировать проведение конкурсных процедур в отношении объекта коммунальной инфраструктуры (часть 4.9 статьи 37 Закона о КС).

6. В случае если соответствующие уведомления в течение 45 дней не поступили, КС заключается собственником объекта коммунальной инфраструктуры с инициатором (часть 4.10 Закона о КС).

Статистическая информация

На сегодняшний день уже заключено 736 КС, из них за 2015 год 271 КС, что в 2,5 раза больше показателя 2014 года – 112 концессионных соглашений. По 255 концессионным конкурсам на сегодняшний день открыт прием заявок на участие.

Объем частных инвестиций, предусмотренных КС, заключенными в 2015 году в 10 раз больше объема частных инвестиций 2014 года и составляет порядка 70,9 млрд. руб. – (7,2 млрд. руб. – в 2014 году).

Приложение 1

Акты, принятые во исполнение Закона о ГЧП

а) Постановления Правительства Российской Федерации

– от 12 декабря 2015 г. № 1366 «Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской федерации, муниципальными правовыми актами»;

– от 3 декабря 2015 г. № 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества»;

– от 30 ноября 2015 г. № 1287 «О внесении изменений в пункт 1 постановления правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909»;

– от 4 декабря 2015 г. № 1322 «Об утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

– от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства»;

– от 19 декабря 2015 г. № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства»;

– от 19 декабря 2015 г. № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

– от 30 декабря 2015 г. № 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определение их сравнительного преимущества»;

– от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

– от 29 декабря 2015 г. № 1461 «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации».

б) Приказы Минэкономразвития России

– от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.);

– от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2015 г.);

– от 30 ноября 2015 г. № 894 «Об утверждении методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2015 г.);

– от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.).

Типичная матрица рисков по проекту ГЧП

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
(А) Предварительный этап и этап разработки				
Конкурсный процесс (структура, сроки, законность) – риск оспаривания законности результатов конкурса	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ / расторжение Соглашения / иски третьих сторон и ответственность перед третьими сторонами	Методичное планирование и четкая организация работ / получение качественных консультаций от специалистов / четкое управление со стороны Правительства.	
Законность заключения соглашения (возможность оспаривания)	Публичная сторона	Невозможность достижения финансового закрытия / расторжение или прекращение Соглашения	Надлежащий правительственный контроль / надлежащая организация процесса получения необходимых разрешений / получение юридического заключения от правового департамента Правительства.	
Достаточность проектных данных и спецификаций	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Публичная сторона может иметь возможность обязать Частного партнера/Частная сторона проверить полноту и точность данных и спецификаций.	
Приобретение строительного участка (земельных участков, необходимых для строительства объекта) и прав на соответствующие земельные участки	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ или даже расторжение Соглашения	Раннее начало процесса приобретения необходимых земельных участков; интенсивное использование права государства на выкуп земельных участков под государственные нужды	
Состояние участка (получение)	Подлежит согласованию,	Задержки в выполнении	Методичный и комплексный подход	С учетом экономической

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
необходимых разрешений и освобождение от прав третьих сторон)	но, как правило, ответственность по такому риску несет Публичная сторона	работ / возникновение дополнительных расходов	к процессу подготовки участка и его очистки от прав третьих сторон.	целесообразность и этот риск должен нести Публичная сторона.
Состояние участка (скрытые дефекты)	Подлежит согласованию, ответственность по такому риску может нести любая из сторон. Как правило, это Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Частная сторона может иметь возможность передать риск Подрядчику и, возможно, воспользоваться договорным пунктом о финансовом балансе.	
Получение разрешений и согласий от государственных органов	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / невозможность реализации проекта	Получение помощи от Правительства в координировании процесса; проведение тщательной юридической проверки на подготовительном этапе; подключение к процессу и координирование действий соответствующих государственных ведомств.	Как правило, такую ответственность несет Частная сторона, но Публичная сторона обычно соглашается оказывать помощь.
Сроки и стоимость работ по предварительной разработке	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов / риск недостижения Финансового Закрытия	Эффективная организация и планирование; четкое определение договорных обязательств; реалистичное определение сроков завершения работ по каждому этапу.	
Возможность получения необходимого страхования (рынки страхования и перестрахования)	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов; в конечном итоге, невозможность достижения Финансового Закрытия или	Тщательный анализ необходимого страхования; получение необходимых заключений от консультантов по страхованию задолго до принятия окончательных обязательств.	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
		выполнения отдельных частей проекта		
Согласование и заключение проектных договоров и связанной с ними документации	Частная сторона	Задержка в достижении Финансового Закрытия и/или в выполнении других предварительных условий, предусмотренных в Соглашении; задержки в реализации проекта	Хорошо организованный и продуманный этап разработки; реалистичное определение сроков завершения работ по каждому этапу и реалистичное планирование; четкое определение ответственности Частной стороны.	
Достижение Финансового Закрытия	Частная сторона	Невозможность реализации Соглашения; риск расторжения Соглашения	Хорошо продуманный и здравый финансовый план; определение реалистичных целей; адекватные оценки рыночных условий; необходимый задел для внесения корректировок в финансовый план в ходе этапа разработки.	
(В) Проектирование и строительство				
Недостаточное/некачественное проектирование (качество проекта)	Частная сторона	Ущерб / задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов / штрафы; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Методичная организация конкурсного процесса; определение реалистичных выходных спецификаций; выбор ведущих мировых проектировщиков и строительных подрядчиков.	
Стоимость проектирования и сроки подготовки проектных документов	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов / штрафы	Методичная организация конкурсного процесса; определение реалистичных выходных спецификаций; выбор ведущих	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
			мировых проектировщиков и строительных подрядчиков.	
Неадекватное/некачественное выполнение строительных работ (качество строительства)	Частная сторона	Ущерб / дефекты (брак) / задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов; штрафы; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Методичная организация конкурсного процесса; определение реалистичных выходных спецификаций; выбор ведущих мировых проектировщиков и строительных подрядчиков.	
Стоимость строительства и сроки завершения (этапы)	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / штрафы / возникновение дополнительных расходов	Методичная организация конкурсного процесса; определение реалистичных выходных спецификаций; выбор ведущих мировых проектировщиков и строительных подрядчиков.	
Качество и наличие оборудования, материалов и рабочей силы	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Методичная организация конкурсного процесса; определение реалистичных выходных спецификаций; выбор ведущих мировых проектировщиков и строительных подрядчиков.	
Внесение изменений Публичной стороной	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Четкое определение порядка внесения изменений; предусмотреть сдерживатели от злоупотребления правом на внесение изменений; четко прописанные	Не столько «риск», сколько «механизм».

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
			выходные спецификации.	
Внесение изменений Частной стороной	Частная сторона (если только это не вызвано изменениями в законодательстве)		Четкое определение выходных спецификаций; выбор ведущего мирового Подрядчика.	Не столько «риск», сколько «механизм».
Изменения в применимых стандартах и критериях	И Частная сторона, и Публичная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	[Смотрите пункт «внесение изменений в законодательство» в разделе «Общие вопросы» ниже]	Частная сторона будет должна соблюдать такие изменения, но, как правило, будет иметь право на получение какой-нибудь компенсации.
Геотехнические проблемы / риски, связанные с состоянием грунта и недостаточностью данных по грунту	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов – возможно, физический ущерб	Получение возможности проверки грунта в ходе конкурсного процесса? Адекватный план обеспечения качества и контроля за качеством.	За Публичной стороной сохраняется часть такого риска; Частная сторона может добиваться получения компенсации, по крайней мере, частичной.
Нанесение ущерба имуществу третьих сторон	Частная сторона	Физический ущерб и ответственность; остановки и задержки в выполнении работ; возникновение дополнительных расходов	Определение соответствующих проектировочных и строительных стандартов в выходных спецификациях и требованиях к проектированию и строительству; выбор соответствующего требованиям Подрядчика.	
Наличие адекватного доступа к строительному участку / сервитуты / права прохода/проезда	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Перспективное планирование и анализ; привлечение к процессу и координирование действий правительственных ведомств.	Часть такого риска может быть передана Частной стороне, но только если он способен контролировать такой риск в

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
				соответствующей части; Подрядчик обычно не принимает на себя такие риски.
Подключение к коммунальным сетям (электро-, водоснабжение и т.п.)	Возможно, Публичная сторона, хотя получение таких услуг может стать ответственностью Частной стороны	Приостановки выполнения обязательств / задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Хорошая организация управления и контроля со стороны Публичного партнера/Публичная сторона; эффективная межведомственная координация и привлечение к процессу другие правительственные ведомства.	
Координирование работ с работами по другим проектам и строительным работам на близлежащих участках (если применимо)	Ответственность определяется в зависимости от конкретных обстоятельств / Совместная ответственность	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных расходов	Составление адекватного плана и графика строительных работ. Оказание помощи со стороны Публичного партнера/Публичная сторона в управлении риском.	Частная сторона будет нести обязательство по планированию и координированию, но только в тех случаях, когда это возможно; при этом Публичная сторона будет нести риски, связанные с помехами / отрицательными последствиями в прочих отношениях, по крайней мере, в части, где приходится иметь дело с другими правительственными органами.
Суровые (исключительные) погодные условия	Частная сторона	Задержки в выполнении работ / возникновение дополнительных	Адекватное планирование и адекватная подготовительная работа; включение	Частная сторона может сослаться на форс-мажорные обстоятельства.

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
		расходов	необходимых положений по форс-мажорным обстоятельствам.	
Скрытые дефекты (брак) в объекте, обнаруживаемые после передачи объекта Публичной стороне	Частная сторона	Ущерб и расходы по восстановлению; упущенная выгода	Четкое определение требований по предварительным проверкам и тестированию; правильный выбор проектировочных и строительных стандартов; четкое определение обязательств по восстановлению по вине частной стороны.	
(С) Эксплуатация и техническое обслуживание				
Качество и эффективность стандартов и деятельности по эксплуатации (низкие эксплуатационные показатели)	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов / приостановки работ; упущенная выгода; штрафы за низкие эксплуатационные показатели; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Надлежащее определение стандартов и процедур; действенная система штрафов за низкие эксплуатационные показатели; стимулы к обеспечению высоких эксплуатационных показателей.	
Качество и эффективность стандартов и деятельности по техническому обслуживанию (низкие показатели по техническому обслуживанию)	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов / приостановки работ / физический ущерб; ответственность перед третьими сторонами; штрафы за низкие эксплуатационные показатели; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Соответствующее определение стандартов и процедур; действенная система штрафов за низкие эксплуатационные показатели; стимулы к обеспечению высоких эксплуатационных показателей.	
Расходы по эксплуатации или техническому	Частная сторона	Снижение дохода; в конечном итоге,	Необходимо предусмотреть надлежащую	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
обслуживанию		банкротство Частной стороны и расторжение Соглашения	коммерческую структуру и систему стимулов, провести необходимый анализ рыночных условий; надлежащим образом организовать конкурсный процесс (как со стороны Публичного партнера/Публичная сторона, так и со стороны Подрядчика).	
Обеспечение безопасности участка	Частная сторона	Ущерб имуществу; нарушение конфиденциальности; увеличение расходов	Эффективные меры по обеспечению безопасности; предоставление Публичной стороне права на проведение проверок.	
Предоставление информации, обмен данными, отчетность	Частная сторона	Приостановки работ / плохое управление проектом	Четко определенные обязательства и процедуры по отчетности; предоставление Публичной стороне права на проведение проверок.	
Существенные изменения в режиме эксплуатации и технического обслуживания (введенные Публичной стороной)	Публичная сторона	Приостановки работ / возникновение дополнительных расходов	Четкие, детально прописанные и адекватные процедуры, позволяющие избежать ущерба; четкое определение стоимостных последствий внесения изменений.	
Чрезвычайные ситуации / аварии / столкновения поездов (и связанная с этим ответственность)	Частная сторона	Приостановки работ / упущенная выгода / потенциальная ответственность перед третьими сторонами	Применение адекватного порядка действий в критических ситуациях; применение надлежащих эксплуатационных стандартов.	
Обеспечение наличия / строительство необходимых подъездных путей	Публичная сторона [хотя Частная сторона может также	Приостановки работ / упущенная выгода	Необходимо проанализировать правильность выбора места строительства	Обычно такое обязательство несет Публичная

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
	нести ответственность по отдельным элементам такого риска, в основном в «пограничных» / пересекающихся областях]		и востребованность объекта у потенциальных пользователей; четкое определение соответствующих обязательств сторон; адекватная предварительная юридическая проверка для определения имеющихся обязанностей по законодательству.	сторона, но это не всегда четко оговорено. Ясно, что отрицательные последствия при возникновении такого риска возникают прежде всего у Частной стороны.
Подключения к коммунальным сетям (электроснабжение и т.п.)	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона / Ответственность определяется в зависимости от конкретных обстоятельств (в основном, такую ответственность несет Публичная сторона)	Приостановки работ / упущенная выгода	Необходимо проанализировать надежность коммунальных служб, четкое определение (соответствующих) обязанностей.	Публичная сторона, как правило, несет обязательство по первоначальному у обеспечению или оказанию помощи в обеспечении необходимых коммунальных услуг; при этом Частная сторона иногда несет, по крайней мере, некоторую долю ответственности по контролю за процессом обеспечения таких услуг.
[Суровые (исключительные) погодные условия]	Частная сторона	Приостановки работ / упущенная выгода; возможно, штрафы за низкие эксплуатационные показатели	Применение надлежащих процедур планирования и эксплуатации; разработка эффективной системы штрафов; включение в соглашение необходимых положений по форс-мажору.	Частная сторона может сослаться на положения о форс-мажоре для снятия с себя ответственности, но нет гарантии, что он сможет получить компенсацию.
(D) Коммерческие и финансовые аспекты				
Достаточность	Либо Частная	Недостаточные	Проведение	Зависит от того,

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
установленных тарифов за проезд (норма прибыли / финансовые обязательства Частной стороны)	сторона, либо Публичная сторона	выручка и доход; нехватка денежных средств; косвенно повлияет на качество работ.	необходимых рыночных исследований и анализов; применение гибких механизмов, позволяющих при необходимости корректировать уровень платы за проезд; получение достаточных экономических данных; применение передовых технологий прогнозирования.	кто несет риск по достаточности трафика и платы за проезд, а также от конкретной структуры платы за проезд (реальная плата или «теневая» / предусмотрены ли выплаты за обеспечение пропускной способности дороги или нет?) В случае использования платежей за обеспечение пропускной способности риски Частной стороны уменьшаются.
Доступность установленных тарифов за проезд для пользователей (способность / желание платить)	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона	Недостаточные выручка и доход; нехватка денежных средств; косвенно повлияет на качество работ.	Проведение необходимых рыночных исследований и анализов; применение гибких механизмов, позволяющих при необходимости корректировать уровень платы за проезд; получение достаточных экономических данных; применение передовых технологий прогнозирования.	Зависит от того, кто несет риск по достаточности трафика и платы за проезд, а также от конкретной структуры платы за проезд (реальная плата или «теневая» / предусмотрены ли выплаты за обеспечение пропускной способности дороги или нет?) В случае использования платежей за обеспечение пропускной способности риски Частной стороны

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
Интенсивность движения (недостижение плановых величин)	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона	Недостаточные выручка и доход; нехватка денежных средств; косвенно повлияет на качество работ; в конечном итоге, банкротство Частной стороны и расторжение Соглашения	Проведение необходимых рыночных исследований и анализов; применение гибких механизмов, позволяющих при необходимости корректировать уровень платы за проезд; получение достаточных экономических данных; применение передовых технологий прогнозирования.	уменьшаются. Зависит от того, кто несет риск по достаточности трафика и платы за проезд, а также от конкретной структуры платы за проезд (реальная плата или «теневая» / предусмотрены ли выплаты за обеспечение пропускной способности дороги или нет?) В случае использования платежей за обеспечение пропускной способности риски Частной стороны уменьшаются.
Недостаточный доход / недостаточные нормы прибыли	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона [в основном, Частная сторона]	Недостаточные выручка и доход; нехватка денежных средств; косвенно повлияет на качество работ; в конечном итоге, банкротство Частной стороны и расторжение Соглашения	Проведение необходимых рыночных исследований и анализов; применение гибких механизмов, позволяющих при необходимости корректировать уровень платы за проезд; получение достаточных экономических данных; применение передовых технологий прогнозирования.	Необходимо учитывать возможные последствия попыток регулирования норм доходности. Чем больше регулирования, тем меньше риски для Частной стороны.
Излишне высокий доход / излишне высокие нормы прибыли	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона [в основном, Публичная]	Риск протестов / политические конфликты; возможно, отрицательные последствия для	Проведение необходимых рыночных исследований и анализов; применение гибких	Необходимо учитывать возможные последствия попыток регулирования

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
	сторона]	программы ГЧП в целом	механизмов, позволяющих при необходимости корректировать уровень платы за проезд; получение достаточных экономических данных; применение передовых технологий прогнозирования. Необходимо предусмотреть механизмы участия в прибылях и получения компенсаций.	норм доходности. Чем больше регулирования, тем меньше риски для Частной стороны.
Строительство и ввод в эксплуатацию конкурирующих объектов	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона (обычно Публичная сторона)	Упущенная выгода (в конечном итоге, пожалуй, будет иметь чрезвычайно отрицательные последствия)	Предусмотреть договорную защиту? Необходимо проанализировать правильность выбора места для реализации проекта и востребованность проекта у потенциальных пользователей.	Зависит от договорных положений. Как правило, Частная сторона желает получить некоторую защиту от конкурирующих объектов.
[Несохранение подключений к коммунальным сетям]	Публичная сторона	Упущенная выгода	Ясность в вопросах распределения рисков; установление хороших взаимоотношений с местными органами власти.	Также зависит от договорных положений, но, скорее всего, будет отнесено к рискам Публичной стороны.
Инфляция	Частная сторона	Увеличение расходов; возможно, повлияет на доход / напряженное финансовое положение	Использование по возможности договоров с фиксированной ценой; использование гибкой индексации стоимости услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию и платы за проезд, если это реализуемо; разработка надлежащей	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
			структуры финансирования.	
Процентные ставки (до финансового закрытия)	Публичная сторона	Увеличение расходов; возможно, задержки в достижении Финансового Закрытия	Структурирование конкурсного процесса и Соглашения таким образом, чтобы уменьшить срок достижения Финансового Закрытия до разумного минимума.	Частная сторона может нести часть такого риска, что будет зависеть от структуры Периода Разработки.
Процентные ставки (после финансового закрытия)	Частная сторона	Увеличение расходов	Надлежащее структурирование договоров по финансированию; включение положений по хеджированию в договоры с кредиторами (финансирование по фиксированной процентной ставке или свопы фиксированных процентных ставок); детальная разработка структуры платы за проезд.	
Достаточность/наличие правительственных грантов или субсидий	Публичная сторона	Увеличение расходов; возможно, задержка в достижении Финансового Закрытия; вероятность отрицательных последствий для рентабельности проекта	Достижение ясности в вопросе о наличии такого финансирования до заключения Соглашения; четкое понимание обязательств, принятых на себя Правительством; проведение тщательной проверки по вопросу эффективности долгосрочных обязательств и целесообразности субсидий; необходимо проанализировать долгосрочные	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
			экономические перспективы проекта.	
Наличие достаточного финансирования для проекта	Частная сторона	Невозможность достижения Финансового Закрытия и реализации Соглашения; риск расторжения Соглашения	Подключение опытных финансовых/коммерческих консультантов к работе на ранних этапах; подготовка здравого технико-экономического обоснования; определение сроков проведения конкурсов с учетом общей экономической ситуации; использование эффективных процедур отбора и утверждения кандидатов; подготовка здравого финансового плана.	
Конъюнктура финансового рынка (после финансового закрытия) / сбои на рынке	Частная сторона	Увеличение расходов; возможно, (незначительный) риск расторжения Соглашения	Четко сформулированные финансовые договоренности; возможно включение общего положения по «финансовому балансу» в Соглашение; готовность всех сторон к проведению повторных переговоров при необходимости внесения изменений.	
Обменные курсы валют	Частная сторона	Возникновение сложностей с выполнением некоторых финансовых обязательств; увеличение расходов; в конечном итоге, банкротство и риск расторжения	Максимальное использование местного финансирования при наличии такой возможности; достижение договоренностей по хеджированию при отсутствии местного финансирования; тщательное	Этот риск существует только в отношении Частной стороны, если Частная сторона имеет какие-либо обязательства по обмену валют.

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
		Соглашения	финансовое планирование; иногда по соглашения о реализации проектов ответственность по такому риску несет Публичная сторона.	
[Возможность обмена валют / репатриации капитала]	Либо Частная сторона, либо Публичная сторона	Возникновение сложностей с выполнением некоторых финансовых обязательств; увеличение расходов; в конечном итоге, банкротство и риск расторжения Соглашения; невозможность выплаты дохода оффшорным инвесторам	Максимальное использование местного финансирования при наличии такой возможности; достижение договоренностей по хеджированию при отсутствии местного финансирования; тщательное финансовое планирование; иногда по соглашениям о реализации проектов ответственность по такому риску несет Публичная сторона.	Если такой риск может иметь серьезные последствия в контексте финансовой / коммерческой структуры в целом, возможно, будет необходимо предусмотреть адекватную защиту от такого риска в положениях Соглашения.
Рефинансирование	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов по финансированию или невозможность получить выгоды от снижения издержек	Здравый финансовый план и анализ рынка; возможно включение положения, предоставляющего Публичной стороне возможность участвовать в прибылях; возможно включение общего положения по «финансовому балансу» в Соглашение; готовность всех сторон к проведению повторных переговоров при необходимости внесения изменений.	Условия рынка за последние пару лет значительно увеличили этот риск; раньше такого риска можно было избежать за счет заключения договоров о долгосрочном финансировании и.
(E) Общие вопросы				
Отзыв / отказ в продлении выданных правительственными	Частная сторона (если невыполнение	Задержки в выполнении работ /	Необходимо четко зафиксировать в Соглашении	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
органами разрешений и согласий	обязательства имеет место с его стороны)/Публичная сторона (в других случаях)	приостановки работ / возникновение дополнительных расходов; невозможность реализации Соглашения; в конечном итоге, расторжение Соглашения	обязательство Публичной стороны оказывать помощь в получении разрешений и согласий; четкое распределение рисков; отнесение ответственности на Публичную сторону, если разрешения или согласия не получены не по вине Частной стороны; привлечение к процессу и надлежащее координирование действий других государственных ведомств.	
Соблюдение требований законодательства	Частная сторона	Задержки в выполнении работ и возникновение дополнительных расходов; судебные процессы; прекращение работ и расторжение Соглашения	Проведение необходимых юридических проверок и получение необходимых юридических консультаций; необходимо проанализировать стабильность и жизнеспособность правовой системы в целом.	
Внесение изменений в законодательство	Совместная ответственность	Увеличение расходов / Задержки в выполнении работ	Адекватные механизмы защиты Частной стороны от отрицательных последствий внесения изменений в законы (например, от новых законов, направленных непосредственно против Частной стороны или являющихся дискриминационным и по отношению к Частной стороне); включение в	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
			соглашение четко прописанного положения по «финансовому балансу»; необходимо проанализировать стабильность и жизнеспособность правовой системы в целом.	
Причинение ущерба третьим сторонам (здоровью и имуществу), включая ущерб пользователям жд ветки	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов и ответственности; заявление исков пользователями; приостановки работ и, возможно, снижение выручки	Применение адекватных стандартов и гарантий по строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию; использование эффективных и действенных эксплуатационных процедур; обеспечение надлежащего обслуживания клиентов.	
Причинение ущерба третьими сторонами (вандализм / хищения)	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов и, возможно, некоторые приостановки работ	Применение надлежащих стандартов и гарантий по строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию; использование эффективных и действенных эксплуатационных процедур; обеспечение надлежащего обслуживания клиентов.	
Нанесение вреда здоровью работников, включая смерть / обеспечение безопасности работников	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов / судебные процессы / ответственность перед третьими	Применение надлежащих стандартов и гарантий по строительству, эксплуатации и техническому	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
		сторонами	обслуживанию; использование эффективных и действенных эксплуатационных процедур.	
Прочие иски со стороны работников	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов / судебные процессы / ответственность перед третьими сторонами	Использование адекватных и эффективных механизмов и процедур внутреннего контроля.	
Вмешательство / создание помех правительственными органами	Публичная сторона	Задержки в выполнении работ и увеличение расходов; приостановки работ; упущенная выгода	Включение в Соглашение действенных механизмов защиты / положений по финансовому балансу; привлечение к процессу другие правительственные органы и координирование их действий.	
Забастовки / трудовые споры	Частная сторона	Приостановки, задержки в выполнении работ и возникновение дополнительных расходов	Хорошая организация и управление отношениями с персоналом; эффективная управленческая команда; необходимо исследовать рынок труда в целом.	Частная сторона может сослаться на положения о форс-мажоре; такая возможность будет зависеть от характера забастовки.
Прекращение предоставления / сбой в предоставлении коммунальных услуг	Совместная ответственность	Возникновение дополнительных расходов / приостановки и задержки в выполнении работ	Справедливое распределение рисков / принятие ответственности Публичной стороной / государственным сектором; здравое технико-экономическое обоснование; надлежащее планирование и размещение проекта.	Очевидно, основные последствия такого риска будут возникать у Частной стороны, но Публичная сторона, как правило, несет часть ответственности в связи с гарантированием подключения

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
				к коммунальным сетям.
Форс-мажор (политические события: войны/террористические акты/экспроприация)	Публичная сторона	Возникновение дополнительных расходов / приостановки и задержки в выполнении работ; риск расторжения Соглашения	Разработка необходимых положений по форс-мажору / по финансовому балансу; необходимо предусмотреть механизм компенсаций, который бы делал такие действия крайне нежелательными для органов власти; необходимо тщательно проанализировать политическую и правовую систему в целом.	
Форс-мажор (стихийные бедствия)	Никто не несет ответственности (но в некоторых отношениях ответственность может возникнуть, по крайней мере, у Публичной стороны)	Возникновение дополнительных расходов / приостановки и задержки в выполнении работ; риск расторжения Соглашения; ущерб / расходы по восстановлению / расходы по устранению дефектов (брака)	Разработка необходимых положений по форс-мажору / по финансовому балансу; необходимо предусмотреть соответствующие права на получение компенсации; положения об освобождении от ответственности.	Обычно предусматривается какая-нибудь компенсация. Освобождение от ответственности фактически перекладывает значительную часть такого риска на Публичную сторону.
Нарушение обязательств / соглашения со стороны Частной стороны	Частная сторона	Возникновение дополнительных расходов; штрафы и прочие санкции; упущенная выгода; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Опытное руководство; проверка адекватности структур «корпоративного управления» и ресурсов Частной стороны; последовательность системы договорных отношений в целом;	
Нарушение обязательств / соглашения со стороны	Публичная сторона	Заявление исков Частной	Права на получение компенсации и	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
Публичного партнера/Публичная сторона		стороной; возникновение дополнительных расходов и задержки в выполнении работ; в конечном итоге, расторжение Соглашения	механизмы корректировок; включение положений о прекращении обязательств; отказ от иммунитета суверена; проведение тщательной юридической проверки.	
Законность и правовая сила соглашения	И Частная сторона, и Публичная сторона	Невозможность достижения Финансового Закрытия; разрыв отношений; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Проведение тщательной юридической проверки; получение необходимых юридических заключений; отказ от иммунитета суверена; необходимо тщательно проанализировать правовую систему в целом; разработка адекватных механизмов разрешения споров.	
Нерешенные споры между сторонами	И Частная сторона, и Публичная сторона	Разрыв отношений; приостановка работ; в конечном итоге, расторжение Соглашения	Разработка адекватных механизмов разрешения споров; необходимо тщательно проанализировать правовую систему в целом; обеспечение справедливости и сбалансированности положений Соглашения и стимулирование конструктивного решения проблем.	
Нарушение прав третьих сторон на интеллектуальную собственность	Частная сторона (если только такое нарушение не возникает из содержания приглашения к представлению	Возникновение ответственности перед третьими сторонами; возникновение дополнительных расходов; возможно даже	Проведение тщательной юридической проверки; четко прописанные положения о принятии обязанностей.	

Риск	Лицо, которое, как правило, несет ответственность по такому риску	Возможные (экономические) последствия	Смягчение последствий от возникновения рисков	Прочие комментарии
	конкурсных заявок и спецификаций)	возникновение необходимости внесения изменений в проект.		
Банкротство Частной стороны	Частная сторона	Серьезные задержки и приостановки в выполнении работ; реализация кредиторами прав по прямому управлению проектом (step-in rights); прекращение соглашения	Надлежащие процедуры отбора кандидатов и установление необходимых требований по капитализации; достижение необходимых договоренностей по финансированию; необходимо предусмотреть механизмы контроля и утверждения сделок.	

СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК

а) Проект – 6-й этап строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (Тверская и Новгородская области)

Основные параметры проекта		Значение
1	Предмет проекта	Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 6 этап км 334 - км 543, Тверская и Новгородская области.
2	Статус проекта	Инвестиционная стадия
3	Форма реализации проекта	Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 543), Тверская и Новгородская области(первая очередь строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454
4	Участники проекта	Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
5	Объекты соглашения	Автомобильная дорога, строительная длина – 217,2 км Категория автомобильной дороги – 1А
6	Срок реализации проекта	с 2013 г. по 2039 г.
7	Периоды реализации проекта	Сроки проведения конкурса – 2013 г.; срок инвестиционной стадии - 4,5 года / 2014 – 2018 гг.; срок эксплуатационной стадии - 21,5 года / 2018 – 2039 гг.
8	Общая стоимость проекта	Стоимость проекта - 144 608 млн. рублей (в ценах соответствующих лет)

9, 10	Предмет соглашения с частным партнером	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка землеустроительной документации и проведение землеустроительных и кадастровых работ; - Разработка рабочей документации, необходимой для осуществления строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на основе имеющейся Проектной Документации; - Выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства в объеме, необходимом для осуществления строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения; - Осуществление иных действий, необходимых для начала строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения; - Выполнение комплекса работ по строительству Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая строительство системы взимания платы (СВП) и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД); - Осуществление софинансирования строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения; - Выполнение комплекса работ (услуг) по эксплуатации Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая его Содержание, Ремонт, Капитальный Ремонт; Выполнение иных работ (услуг) необходимых и (или) связанных с исполнением условий Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. - Механизм возмещения операционных и капитальных затрат инвестора – в форме эксплуатационных и инвестиционных платежей Государственной компании за счет доходов от сбора платы
11	Объем финансирования капитальных затрат	средства федерального бюджета – 88 644 млн. рублей (в ценах соответствующих лет) другие внебюджетные источники финансирования – 55 964 млн. рублей (в ценах соответствующих лет)
12	Объем финансирования операционных затрат	эксплуатационные платежи (без учета НДС) – 27 383 млн. руб. (в ценах 1 квартала 2013 года)

Социально-экономический эффект реализации проекта

NB: параметры и значения показателей социально-экономической эффективности устанавливаются исполнителем самостоятельно. Приводится методика расчета

Километры ввода в эксплуатацию, км	217,2 км
------------------------------------	----------

Показатель социально-экономической эффективности и (интегральный индикатор)	0,3277%
---	---------

Правовая и финансовая структура проекта и распределение основных рисков

Долгосрочное инвестиционное соглашение

Комплексное долгосрочное инвестиционное соглашение близко к идеологии концессии с платой концедента:

- › применяется при относительно небольшом объеме инвестиционных обязательств инвестора
 - › гарантии исполнения проекта несет ГК «Автодор»
- риск трафика на ГК «Автодор»

ИСПОЛНИТЕЛЬ КОНТРАКТА

- Софинансирование проекта на этапе проектирования и строительства за счет собственных и заемных средств
- Проектирование (опционально)
- Подготовка территории строительства (опционально)
- Строительство
- Содержание автомобильной дороги
- Текущий и капитальный ремонт
- Эксплуатация СВП* и АСУДД**
- Агентские услуги по сбору платы в доход ГК «Автодор»

ГК «АВТОДОР»

- Софинансирование проекта на этапе проектирования и строительства
- 100% финансирование на этапе эксплуатации в виде инвестиционного и эксплуатационного платежей
- Определение критериев оценки деятельности исполнителя
- Контроль деятельности исполнителя

До завершения капитального ремонта объекта

Доходность на заемный капитал, закладываемая в финансовую модель – ИПЦ + 2%

Доходность на собственный капитал, закладываемая в финансовую модель – ИПЦ + 5,85%

Этапы реализации проекта

№	Мероприятия по проекту	Период, год.													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	...	2039
1	Прединвестиционный этап														
2	структурирование проекта	июнь-сентябрь													
3	решение о заключении концессионного соглашения (указать реквизиты НПА)	не применимо													
4	конкурсная процедура	сентябрь-декабрь													
5	привлечение долгового финансирования	декабрь													
6	Инвестиционный этап														
7	строительство объектов		январь				апрель								
8	Эксплуатационный этап						май								май
9	Завершение проекта														май

Распределение рисков проекта¹

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер*	Частный партнер*
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+ в части изъятия	
		Обеспечение инженерных коммуникаций		В части переноса коммуникаций
		Подготовка земельных участков		+
		Срыв срока проектирования объекта	Не применимо	Не применимо
		Срыв срока подготовительных мероприятий		+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц	+	+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+		
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного <u>публ. партн.</u>		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции	+	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу	+ в части роста инфляции	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов	+ в части НДС	
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию <u>минимал. доходности</u>	Не применимо	Не применимо
		Падение выручки вследствие снижения объема оказания услуг	+	
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	+	
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг	+	
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения	+	
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+
		Иные риски		

Резюме проекта

Частный партнер/инвестор
ПАО «Мостотрест»

Мощность объекта
217,2 км

Сроки реализации проекта
с 2013 г. по 2039 г.

Общий объем инвестиций в
проект
144 608 млн. рублей

Объем инвестиций частного
партнера
15 964 млн. рублей

Капитальный грант – 128 644 млн.
рублей, эксплуатационные
платежи – 27 383 млн. руб. (в ценах
1 квартала 2013 года без учета
НДС); 2) инвестиционные платежи
– 37 674 млн. руб. (в ценах
соответствующих лет

Индекс бюджетной
эффективности – 1,41

NPV проекта – 16 436 млн.
рублей (WACC – 7,69%) и IRR
проекта – 12,84%

Социально-экономическая эффективность (интегральный
индикатор) - 0,3277%

б) Проект – Создание центра малой авиации (Калужская область)

Основные параметры проекта	Значение
1 Предмет проекта	<i>Создание новых объектов и реконструкция старых объектов, состав и описание которых приведены в Соглашении, в целях создания центра малой авиации в Калужской области, размещения музейного комплекса на территории аэродрома, с возможностью выполнения демонстрационных полетов и организации различных авиационных праздников и мероприятий, создания центра военно-патриотического воспитания молодежи и развития авиационных видов спорта, обучения техническим дисциплинам учащихся школ и кадетских корпусов, а также осуществления деятельности с использованием объектов Соглашения</i>
2 Статус проекта	<i>Реализация проекта</i>
3 Форма реализации проекта	<i>05.05.2016 заключено концессионное соглашение</i>
4 Участники проекта	<i>Концедент: Администрация городского поселения «Поселок Воротынский», Концессионер: региональная общественная организация «Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-Аэро»</i>
5 Объекты соглашения	<i>здания и сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, подлежащие капитальному ремонту и реконструкции (рулежные дорожки, стоянка летательных аппаратов, ИВПП, трансформаторная подстанция, зарядная аккумуляторная станция, здание радиолокационной системы посадки и др.) а также создание новых объектов. Износ объектов, подлежащих реконструкции, составляет более 80%</i>
6 Срок реализации проекта	<i>49 лет</i>
7 Периоды реализации проекта	<i>Было использовано право частной инициативы. Отборочные процедуры: 2016 г. Составление проектной документации: 2016 г. Реконструкция объекта: 2016-2026 гг. Срок ввода в эксплуатацию объекта: не более 15 лет с момента заключения концессионного соглашения</i>
8 Общая стоимость проекта	<i>210 000 000 рублей</i>
9 Участие концедента	<i>Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектами Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения. Земельный участок передается Концессионеру в аренду, о чем заключается договор аренды земельного участка.</i>
10 Участие концессионера	<i>Концессионер обязан реконструировать существующие объекты Соглашения, Концессионер обязан создать новые объекты Соглашения</i>
11 Объем финансирования капитальных затрат	<i>Средства концессионера: 210 000 000 руб.</i>
12 Объем финансирования операционных затрат	<i>Бюджетного финансирования не предусмотрено.</i>


Социально-экономический эффект реализации проекта

Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской обл. от 22.12.2015 № 133-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	создание полноценного центра малой авиации в регионе
	размещение музейного комплекса на территории аэродрома с возможностью выполнения демонстрационных полетов
	создание центра военно-патриотического воспитания молодежи и развития авиационных видов спорта, а так же обучение различным техническим дисциплинам учащихся школ и кадетских корпусов
	проведение межрегиональных и местных военно-патриотических игр и сборов среди молодежи
	организация различных авиационных праздников и мероприятий

Правовая структура проекта



Финансовая структура проекта

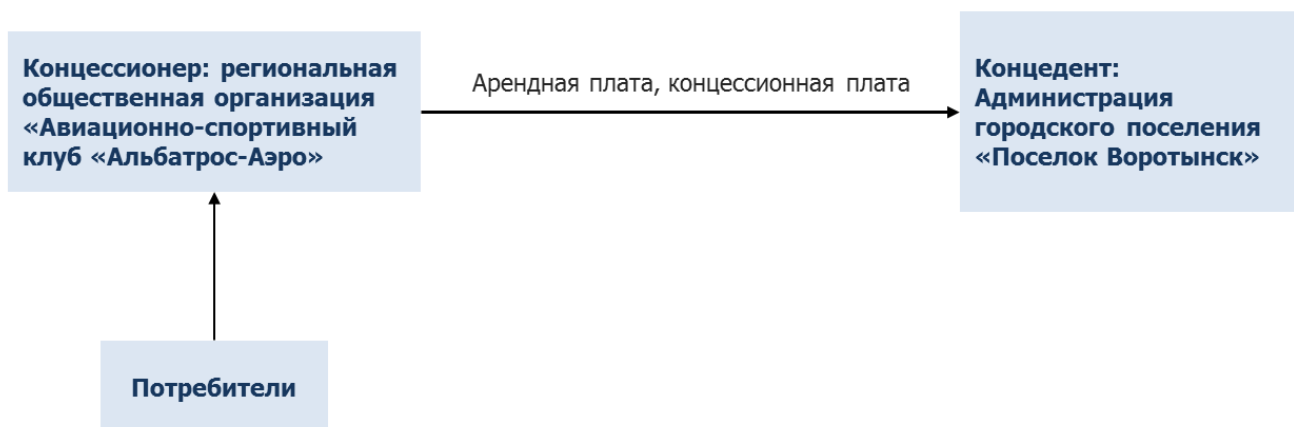

Этапы реализации проекта

№ Мероприятия по проекту	Период, год.																
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2032	2065		
1	Прединвестиционный этап																
2	структурирование проекта																
3	решение о заключении концессионного соглашения (указать реквизиты НПА)																
		Постановление администрации городского поселения пос. Боротынский от 29.04.2016 № 165 «О заключении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса аэродрома «Орешково»															
4	конкурсная процедура																
5	привлечение долгового финансирования																
6	Инвестиционный этап																
7	строительство объектов																
8	Эксплуатационный этап																
9	Завершение проекта																

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	
		Обеспечение инженерных коммуникаций		+
		Подготовка земельных участков		+
		Срыв срока проектирования объекта		+
		Срыв срока подготовительных мероприятий		+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+		
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности		+
		Падение выручки вследствие снижения объема оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие неплательщиков со стороны потребителей услуг		+
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения		+
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+
		Иные риски	+	+

Резюме проекта

Концессионер:
региональная
общественная организация
«Авиационно-спортивный
клуб «Альбатрос-Аэро»

**Общая объем инвестиций в
проект:** 210 000 000 руб.

**Капитальные и
операционные инвестиции
концедента (в т.ч. плата
концедента):** не
предусмотрена

**Количество
предоставляемых льготных
услуг:** Концессионер обязан
предоставлять для
вертолетов и самолетов
МЧС, медицинских
летательных аппаратов 10
стояночных мест,
оборудованных как для
длительной стоянки, так и
временного пребывания
бортов, на льготных
условиях, а именно:
стоимость взлета и посадки
будет составлять 20% от
стоимости, установленной
для остальных летательных
аппаратов, не зависимо от
воздушного судна. В
экстренных случаях плата
не взимается

Срок реализации проекта:
49 лет

**Объем инвестиций
концессионера (в т.ч.
концессионная плата):** 211
500 000 руб.

**Бюджетная эффективность
проекта:** 210 000 000 руб.

Социально-экономическая эффективность:
создание полноценного центра малой авиации в регионе

в) Проект – Создание крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест (Ульяновская область)

О проекте

1


	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	Создание и эксплуатация имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием
2	Статус проекта	эксплуатационная стадия
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение
4	Участники проекта	Концедент - Правительство Ульяновской области, концессионер - ЗАО "Волга-Спорт"
5	Объекты соглашения	Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 5000 мест
6	Срок реализации проекта	18.06.2012-14.03.2024
7	Период реализации проекта	Создание объекта: 18.06.2012-14.03.2014, эксплуатация: 14.03.2014-14.03.2024
8	Общая стоимость проекта	2 023,2 млн. рублей
9	Участие концедента	Передача прав владения и пользования объектами соглашения, предоставление земельных участков, на которых находятся объекты соглашения, на основании договора аренды. Размер арендной платы корректируется на индекс инфляции
10	Участие концессионера	Строительство, оснащение и эксплуатация объекта соглашения. Оказание услуг населению районов Ульяновской области на возмездной и безвозмездной основе
11	Объем финансирования капитальных затрат	2 023,2 млн. рублей - внебюджетные источники
12	Объем выплат концессионеру на этапе эксплуатации	4 704,2 млн. рублей - внебюджетное финансирование (платежи по договору аренды крытого спортивного комплекса, заключённому между ЗАО «Волга-Спорт» и областным государственным автономным учреждением «Волга-спорт-арена»)

Социально-экономический эффект реализации проекта

2

- Обеспечение возможности проведения массовых спортивных мероприятий на льду, в том числе Чемпионата мира по хоккею с мячом - 2016.
- Обеспечение проведения тренировок спортсменов
- Предоставление возможности массового катания населению

Правовая структура проекта

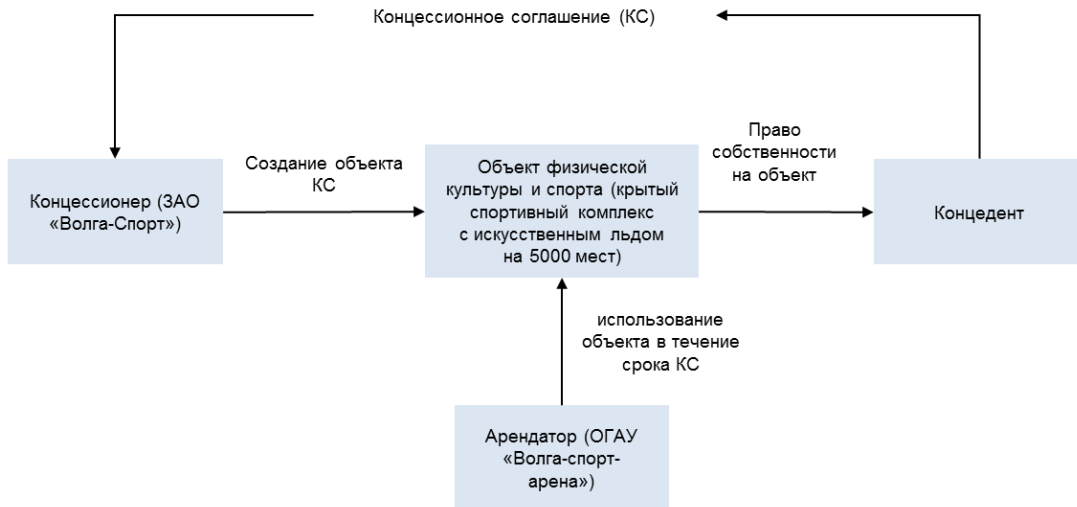


Концессионер обязуется за свой счёт осуществить строительство объекта концессионного соглашения, право собственности на который будет принадлежать Ульяновской области, в соответствии с проектной документацией, полученной от концедента.

Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект КС в пользование третьим лицам, при условии соблюдения третьими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных КЧ.

Критерии конкурса:

- Срок создания объекта концессионного соглашения (ввод объекта концессионного соглашения в эксплуатацию) - не позднее 01.10.2013 (количество дней), значимость критерия 0,6;
- Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением - не позднее 01.11.2013 (количество дней), значимость критерия 0,4.

Финансовая структура проекта

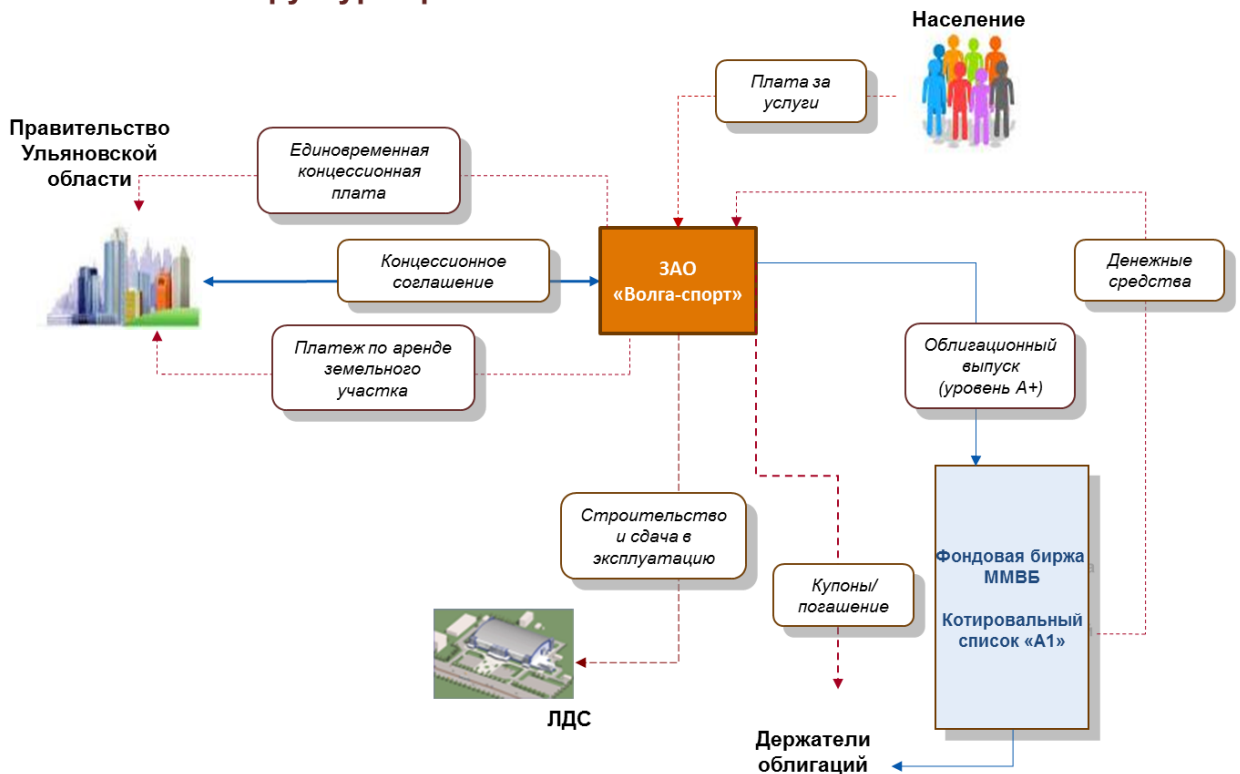

Этапы реализации проекта

№ Мероприятия по проекту	Период, год.													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Прединвестиционный этап													
2	ноябрь	февраль												
3		Февраль (от 29.02.2012 № 95-П)												
4		март-май												
5		август												
6	Инвестиционный этап		сентябрь	март										
7	строительство объектов		сентябрь	март										
8	Эксплуатационный этап			март										март
9	Завершение проекта													март

Распределение рисков проекта¹

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер*	Частный партнер*
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	v	
		Обеспечение инженерных коммуникаций		v
		Подготовка земельных участков		v
		Срыв срока проектирования объекта	v	
2	Риски создания объекта	Срыв срока подготовительных мероприятий		v
		Ликвидация последствий действий третьих лиц		v
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров		v
		Ликвидация экологических последствий		v
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		v
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		v
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют	v	
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции	v	
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу	v	
		Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.	v	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют	v	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции	v	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу	v	
4	Риски получения дохода	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов	v	
		Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности	v	
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг	v	
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	v	
5	Прочие риски	Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг	v	
		Расторжение соглашения по вине публичного партнера	v	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		v
		Утрата объекта соглашения		v
		Форс-мажорные обстоятельства	v	

* Указывается риск, который берет на себя сторона соглашения

Резюме проекта

Концессионер ЗАО «Волга-Спорт»	Мощность объекта соглашения 5000 мест	Срок реализации проекта 18.06.2012 - 14.03.2024 (10 лет со дня ввода в эксплуатацию)
Общая объем инвестиций в проект 2 023 218 тыс. руб.	Объем инвестиций концессионера (в т.ч. концессионная плата) 2 023 218 тыс. руб.	Капитальные и операционные расходы концедента 4 704 246 тыс. руб.

Фотография объекта



г) Проект – Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в городе Отрадное Кировского муниципального района (Ленинградская область)

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	<i>Проектирование – строительство – целевая эксплуатация и техническое обслуживание объекта концессионного соглашения</i>
2	Статус проекта	<i>Подготовка решения о заключении концессионного соглашения (прединвестиционная стадия)</i>
3	Форма реализации проекта	<i>Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)</i>
4	Участники проекта	<i>Публичный партнер – Ленинградская область; Частный партнер – не определен</i>
5	Объекты соглашения	<i>Объект соглашения – плавательный бассейн в г. Отрадное: Площадь объекта - не менее 4 500 м²; Площадь застройки – 1 500 м²; Этажность - 3 + подземный или цокольный этаж; Взрослый бассейн – 1 шт., 25,0 м x 11,0 (5 дорожек), глубина 1,2-1,8 м; Спортивные залы - 2 шт. (учебно-тренировочный зал спортивных игр и тренажерный); Спа-зона - сауна, хамам; Медицинский кабинет; Кафе; Площадь земельного участка – 10 тыс. м²</i>
6	Срок реализации проекта	<i>20 лет (2017 – 2036)</i>
7	Периоды реализации проекта	<i>2017 – заключение концессионного соглашения; 2017 – проектирование; 2017 – финансовое закрытие; 2017 – 2019 – строительство; 2019 – 2037 – целевая эксплуатация и техническое обслуживание</i>
8	Общая стоимость проекта	<i>400 млн рублей</i>
9	Участие концедента	<i>– Передача земельного участка в аренду; – Финансирование 100% затрат (28,5 млн рублей) на техническое подключение объекта; – Софинансирование не более 26,68 % капитальных затрат (87,4 млн рублей) на стадии строительства; – Возмещение не более 60,29% капитальных затрат (197,5 млн рублей) в течение 1 месяца после ввода в эксплуатацию; – Приобретение у концессионера услуг по фиксированной цене в согласованном объеме (услуги по предоставлению дорожек для нужд Ленинградской области на оказание услуг по предоставлению бассейна для проведения занятий по обучению детей плаванию, проведения тренировок сборных команд Ленинградской области и проведения соревнований сборных команд Ленинградской области)</i>
10	Участие концессионера	<i>– Проектирование и строительство объекта; – Техническое обслуживание объекта (содержание объекта, проведение текущих и капитальных ремонтов);</i>


– *Целевая эксплуатация (оказание услуг)*

11	Объем финансирования капитальных затрат	<p><i>Общий объем капитальных затрат – 327,6 млн рублей.</i></p> <p><i>Источники финансирования капитальных затрат:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Концессионер (собственные средства) – 51,4 млн рублей или 15,69%;</i> – <i>Концессионер (заемные средства) – 188,8 млн рублей или 57,63%;</i> – <i>Концедент (капитальный грант) – 87,4 млн рублей или 26,68%</i>
12	Объем финансирования операционных затрат	<p><i>Объем операционных затрат – 2,3 млрд рублей.</i></p> <p><i>Источники финансирования операционных затрат:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Концессионер – 100% операционных затрат.</i>

Социально-экономический эффект реализации проекта

Развитие массового спорта	<p>Повышение уровня доступности спорта для населения (увеличение площади зеркала воды на 275 кв. м.)</p> <hr/> <p>Рост процента населения Ленинградской области, занимающегося спортом (увеличение количества посещений объектов спорта на 230 тыс. посещений в год)</p>
Социальная эффективность	<p>Улучшение состояния здоровья населения</p> <hr/> <p>Повышение уровня занятости населения (создание около 50 рабочих мест)</p>
Экономическая эффективность	<p>Привлечение частных инвестиций в размере около 140 млн. рублей</p> <hr/> <p>Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней</p>

Правовая структура проекта

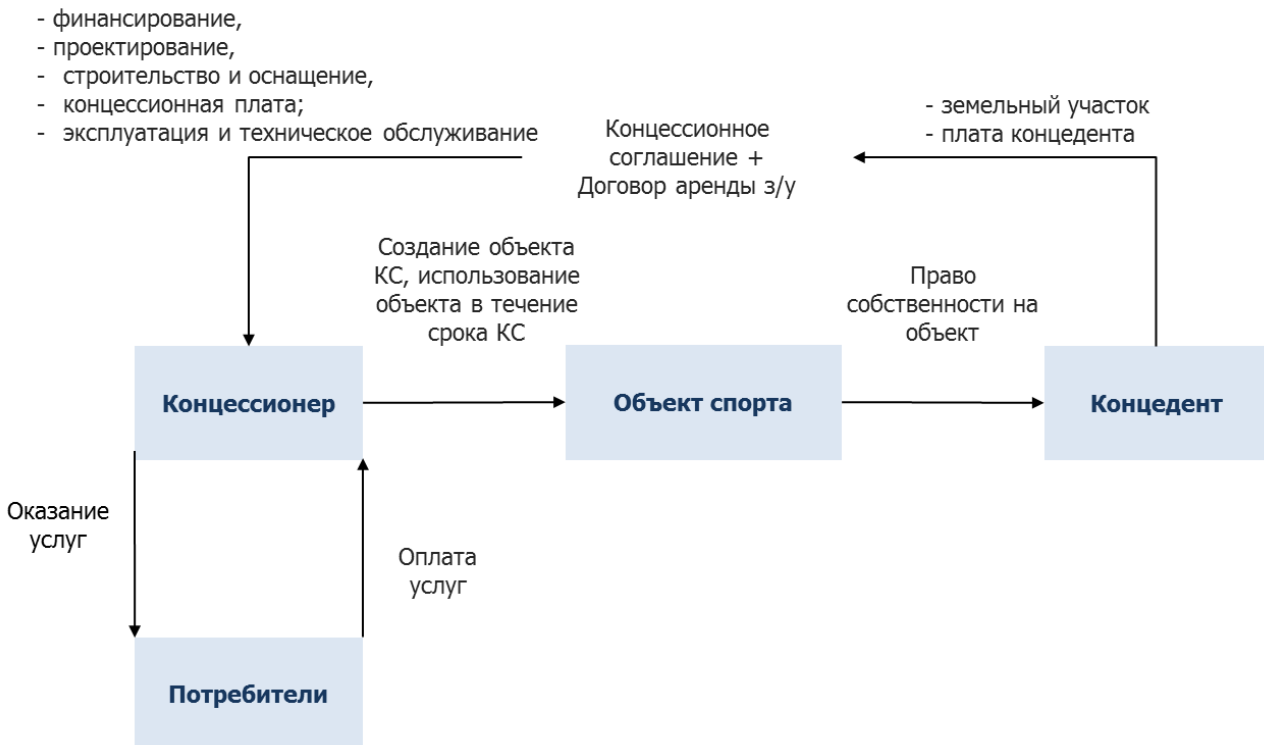

О схеме реализации проекта

Ленинградская область	Концессионер
Передает концессионеру земельный участок под объектами в аренду на весь срок соглашения	Получает от Ленинградской области земельный участок под объектами в аренду на весь срок соглашения
	Осуществляет проектирование строительства объекта за счет собственных средств
После уточнения сметной стоимости строительства объекта уточняет размер платы концедента	После уточнения сметной стоимости строительства объекта осуществляет финансовое закрытие и подтверждает наличие доступа к финансовым ресурсам, необходимым для исполнения соглашения
Обеспечивает объект инженерной инфраструктурой до границ земельного участка и предоставляет часть платы концедента (капитальный грант) в размере не более 26,68%	Осуществляет строительство и техническое оснащение объекта за счет собственных и привлеченных средств и за счет капитального гранта
Передает концессионеру объект концессионного соглашения во владение и пользование	Осуществляет государственную регистрацию созданного объекта концессионного соглашения и прав на него
Приобретает у концессионера услуги по фиксированной цене в согласованном объеме (услуги по предоставлению дорожек для проведения занятий по обучению детей плаванию, проведения тренировок сборных команд Ленинградской области и проведения соревнований сборных команд Ленинградской области)	Осуществляет эксплуатацию объекта и его техническое обслуживание (в том числе осуществляет текущий и капитальный ремонт объекта, реновацию движимого имущества)
В течение 1 месяца выплачивает субсидию на возмещение капитальных затрат в размере не более 60,29%	Получает доходы от оказания услуг и субсидию от Ленинградской области
По окончании соглашения принимает от концессионера объект недвижимости и земельный участок	По окончании соглашения возвращает Ленинградской области объект недвижимости и земельный участок


Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	√	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	√	
		Подготовка земельных участков	√	
		Срыв срока проектирования объекта		√
		Срыв срока подготовительных мероприятий		√
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		√
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	√	
		Ликвидация экологических последствий	√	
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		√
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		√
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		√
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		√
		Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу	√	√
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного <u>публ. партн.</u>		√
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		√
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		√
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		√
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов	√	
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию <u>минимал. доходности</u>	√	
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		√
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг		√
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		√
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	√	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		√
		Утрата объекта соглашения		√
		Форс-мажорные обстоятельства	√	
		Иные риски	√	√

Резюме проекта

Концессионер не определен	1 бассейн (5 дорожек), спортивные залы (универсальный, тренажерный), медицинский кабинет, банный комплекс	Срок реализации проекта – 20 лет
Общая объем инвестиций в проект – 400 млн рублей	Объем инвестиций концессионера (в т.ч. концессионная плата) – 140 млн рублей	Объем оказываемых услуг – 230 тыс. посещений в год
Капитальные и операционные инвестиции публичного партнера / концедента (в т.ч. плата концедента) – 285 млн рублей	Бюджетная эффективность проекта – рассрочка капитальных затрат, экономия на операционных затратах	NPV (при ставке дисконтирования – 17%) – 13,3 млн рублей и IRR проекта – 19%
Социально-экономическая эффективность - повышение доступности объектов спорта, улучшение здоровья населения, создание не менее 50 рабочих мест		

Проект

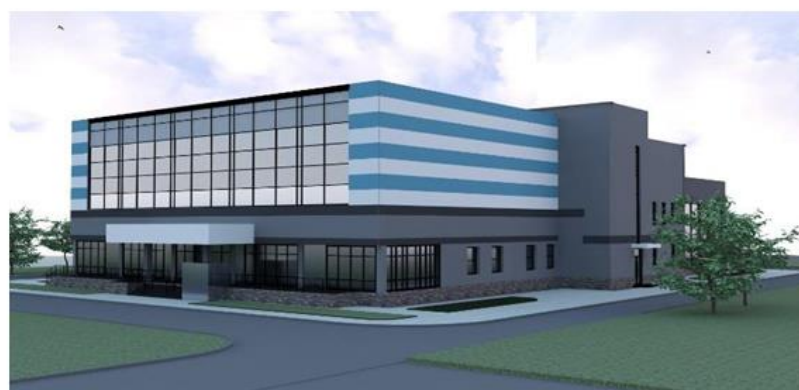

д) Проект – Реконструкция зданий детских комбинатов (Новосибирская область)

О проекте

1

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой, 29, 29/1
2	Статус проекта	Эксплуатация
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение
4	Участники проекта	1. Мэрия города Новосибирска 2. НОУ Детский сад «Жарки»
5	Объекты соглашения	Реконструкция зданий детского комбината площадью 899,3 кв. м и 898,2 кв. м со строительством теплого перехода между зданиями детских комбинатов. Объект эксплуатируется для осуществления деятельности детского сада на 124 воспитанника с реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования
6	Срок реализации проекта	30 лет
7	Периоды реализации проекта	2010 – 2012 – создание; 2012 – 2040 – эксплуатация
8	Общая стоимость проекта	62,5 млн рублей
9	Участие публичного партнера / концедента	0 рублей
10	Участие частного партнера / концессионера	62,5 млн рублей
11	Объем финансирования капитальных затрат	62,5 млн рублей
12	Объем финансирования операционных затрат	н/д

Социально-экономический эффект реализации проекта

2

NB: параметры и значения показателей социально-экономической эффективности устанавливаются исполнителем самостоятельно. Приводится методика расчета

Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска

Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
+ 124 места

Привлечение инвестиций в социальную сферу города Новосибирска

Привлечение частных инвестиций к созданию/реконструкции и содержанию объектов муниципальной собственности
+ 62,5 млн рублей


Обеспечение сбалансированного развития территории города Новосибирска

Создание новых объектов образования на территории города Новосибирска с учетом перспективного роста численности населения
+ 2 объекта

Правовая структура проекта

Объекты концессионного соглашения (здания детского сада) являются собственностью концедента и передаются концессионеру для реконструкции в целях размещения детского дошкольного учреждения. Реконструкцию, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляет концессионер за счет собственных или привлеченных средств.

После ввода в эксплуатацию завершено строительство объектов соглашения концедент приобретает на него право собственности, а концессионер - право владения и пользования. По истечении срока концессионного соглашения объект остается в собственности муниципалитета.

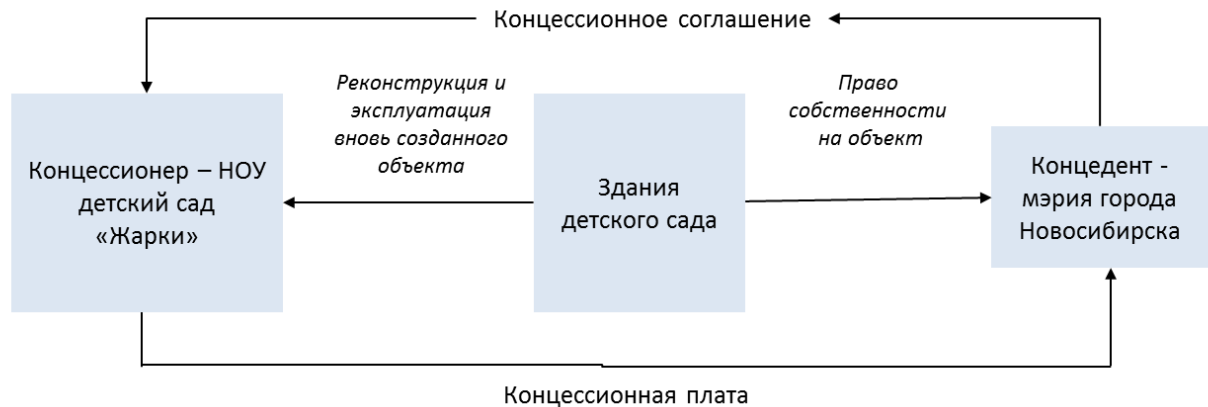

Финансовая структура проекта

Концессионер самостоятельно осуществляет финансирование проекта на инвестиционной и на эксплуатационной стадиях.

Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в одностороннем порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции (индекс потребительских цен) и по иным не противоречащим действующему законодательству основаниям, но не чаще одного раза в год.



Этапы реализации проекта

№ Мероприятия по проекту	Период, год.													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	...	2040
1 Преинвестиционный этап														
2 структурирование проекта														
3 решение о заключении концессионного соглашения (указать реквизиты НПА)														
4 конкурсная процедура														
5 привлечение долгового финансирования														
6 Инвестиционный этап														
7 строительство объектов														
8 Эксплуатационный этап														
9 Завершение проекта														

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	+	
		Подготовка земельных участков		+
		Срыв срока проектирования объекта		+
		Срыв срока подготовительных мероприятий	+	+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+		
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности	+	
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг		+
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		+
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения		+
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+
		Иные риски	+	+

Резюме проекта

НОУ Детский сад «Жарки» / Мэрия города Новосибирска	Здания детских комбинатов площадью 899,3 кв. м и 898,2 кв. м	30 лет
62,5 млн рублей	62,5 млн рублей	Объем оказываемых услуг по тарифам ОМС
Капитальные и операционные инвестиции публичного партнера / концедента (в т.ч. плата концедента)	Бюджетная эффективность проекта	NPV (при ставке дисконтирования -) и IRR проекта

Привлечение частных инвестиций в размере 62,5 млн рублей
Создание 2 объектов дошкольного образования
Создание 124 мест в дошкольных образовательных учреждениях

Фотографии объекта



е) Проект – Реконструкция детского сада (Пермский край)

О проекте

1

Основные параметры проекта		Значение
1	Предмет проекта	<i>«Реконструкция объектов образования на территории г. Перми Пермского края»</i>
2	Статус проекта	<i>Эксплуатационная стадия</i>
3	Форма реализации проекта	<i>Концессионное соглашение от 1 апреля 2010 г. № 3-КСО</i>
4	Участники проекта	<i>Концедент: Муниципальное образование город Пермь от имени которого выступает администрация города Перми в лице уполномоченного органа – Департамента имущественных отношений администрации города Перми; Концессионер: Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский современный социально-гуманитарный колледж»</i>
5	Объекты соглашения	<i>недвижимое имущество, являющееся собственностью муниципального образования город Пермь, состоящее из зданий и сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 12: двухэтажное здание с подвалом (лит. А), общей площадью 1130,60 кв. м, 3 теплых пристроя (лит. А1,А2,А3), 2 сарая (Г,Г2), ледник (лит. Г2), 2 забора (1,2), замощение (лит. I)</i>
6	Срок реализации проекта	<i>1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г.</i>
7	Периоды реализации проекта	<i>конкурсные процедуры (октябрь 2009 г. – март 2010 г.) разработка проектно-сметной документации (октябрь 2010 г.) реконструкция объекта (июнь 2011 г. – сентябрь 2011 г.) срок ввода в эксплуатацию объекта (22 декабря 2011 г.) эксплуатация объекта (22 декабря 2011 г. – 1 апреля 2035 г.)</i>
8	Общая стоимость проекта	<i>не менее 14 млн. руб.</i>
9	Участие публичного партнера / концедента	<i>Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением (1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г.), права владения и пользования объектом соглашения для осуществления деятельности по предоставлению услуг дошкольного образования</i>
10	Участие частного партнера / концессионера	<i>Концессионер обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования с использованием объекта соглашения</i>
11	Объем финансирования капитальных затрат	<i>не менее 14 млн. руб.</i>
12	Объем финансирования операционных затрат	<i>не менее 14 млн. руб.</i>

Социально-экономический эффект реализации проекта

3

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	Дополнительно создано 300 мест для детей в возрасте от 1 до 7 лет;
	Дополнительно создано 92 рабочих места
Увеличение доли негосударственных поставщиков услуг в дошкольном образовании	2014 г. В реестре негосударственных поставщиков услуг, получающих субсидии на возмещение затрат на образовательную услугу – 37 ед.
	В 2015 г.- 75 ед.
Увеличение количества детей получающих образовательную услугу в негосударственном секторе	в 2014 г. количество детей получающих дошкольную образовательную услугу в негосударственном секторе – 3476 чел.;
	В 2015 г. Количество детей получающих дошкольную образовательную услугу- 4722 чел.

Правовая структура проекта


4

Концедент:

обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением (1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г.), права владения и пользования объектом соглашения для осуществления деятельности по предоставлению услуг дошкольного образования

Концессионер:

обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования с использованием объекта соглашения;
обязуется обратиться в департамент земельных отношений администрации г.Перми с заявлением о заключении договора аренды земельного участка, на котором располагается объект соглашения.

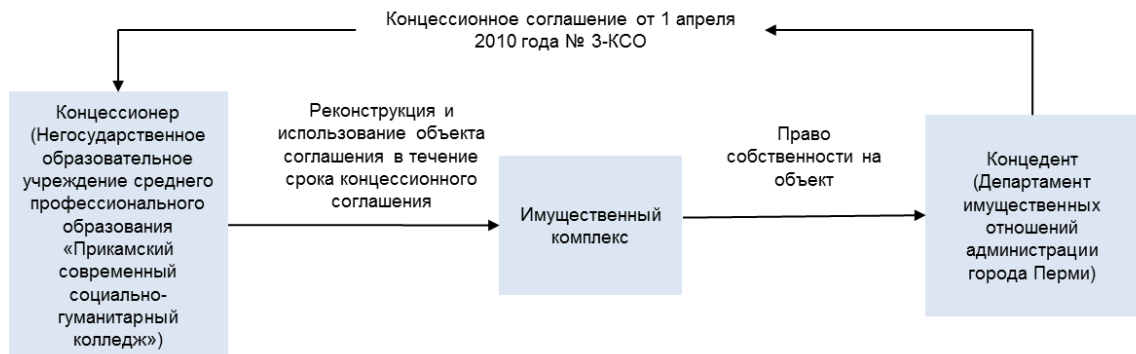

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	+	
		Подготовка земельных участков	+	
		Срыв срока проектирования объекта		+
		Срыв срока подготовительных мероприятий		+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу				
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
4	Риски получения дохода	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
		Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности		
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	+	
5	Прочие риски	Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг	+	+
		Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения	+	
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+
		Иные риски	+	+

Резюме проекта

Концессионер
(НОУ СПО «Прикамский
современный социально-
гуманитарный колледж»)

Мощность объекта
соглашения:
Общая площадь
1 130,6 кв.м

Срок реализации проекта
1 апреля 2010 года –
1 апреля 2035 года

Общий объем инвестиций в
проект (не менее 14 млн.
руб.)

Объем инвестиций
концессионера
(22,75 млн. руб. в том числе
концессионная плата
8,75 млн. руб.)

Объем оказываемых услуг:
7 видов

Капитальные и
операционные инвестиции
концедента
(концессионным
соглашением не
определены)

Бюджетная эффективность
проекта: не определялась

NPV (при ставке
дисконтирования -) и IRR
проекта: не определялись

Социально-экономическая эффективность:
обеспеченность населения услугами дошкольного образования



ж) Проект – Реконструкция помещений в здании роддома (Новосибирская область)

О проекте

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	Реконструкция помещений в здании роддома по ул. Коммунистической, 17
2	Статус проекта	Эксплуатация
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение
4	Участники проекта	1. Мэрия города Новосибирска 2. ЗАО «Медицинский центр «Авиценна»
5	Объекты соглашения	Реконструкция нежилых помещений в подвале, на 1 и 2 этажах в здании роддома площадью 1799,1 кв. м. Минимальный объем ЭКО – 48 чел./год
6	Срок реализации проекта	22 года
7	Периоды реализации проекта	2010 – 2012 – создание; 2012 – 2032 – эксплуатация
8	Общая стоимость проекта	97,5 млн рублей
9	Участие концедента	–
10	Участие концессионера	97,5 млн рублей
11	Объем финансирования капитальных затрат	60,0 млн рублей
12	Объем финансирования операционных затрат	н/д

Социально-экономический эффект реализации проекта

NB: параметры и значения показателей социально-экономической эффективности устанавливаются исполнителем самостоятельно. Приводится методика расчета

Развитие муниципальной системы здравоохранения города Новосибирска

Реконструкция объектов здравоохранения на территории города Новосибирска

1 объект площадью 1799,1 кв. м

Привлечение инвестиций в сферу здравоохранения города Новосибирска


Привлечение частных инвестиций к реконструкции и содержанию объектов муниципальной собственности

+ 97,5 млн рублей

Правовая структура проекта

Объект концессионного соглашения являются собственностью концедента и передаются концессионеру для реконструкции и строительства в целях размещения объекта сферы здравоохранения. Реконструкцию, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляет концессионер за счет собственных или привлеченных средств.

После ввода в эксплуатацию завершено строительство объекта соглашения концедент приобретает на него право собственности, а концессионер - право владения и пользования. По истечении срока концессионного соглашения объект остается в собственности муниципалитета.

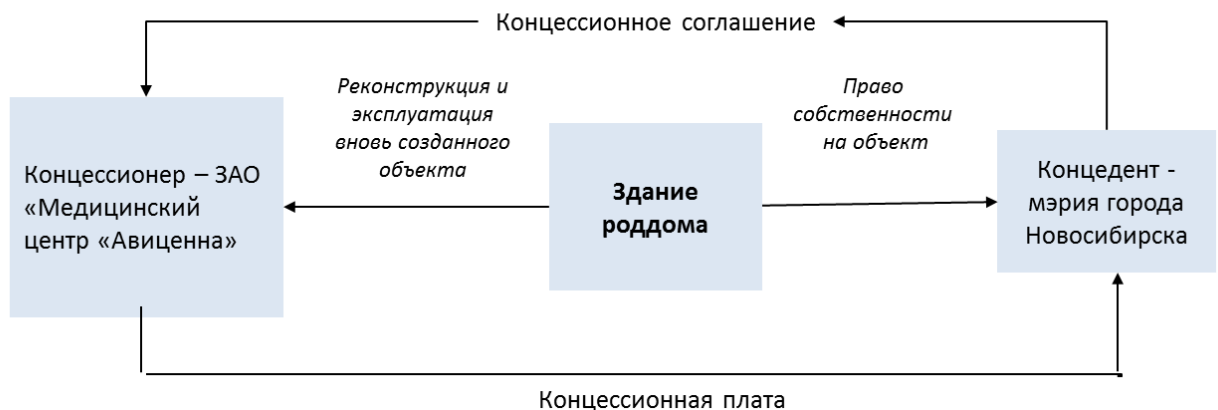

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	+	
		Подготовка земельных участков		+
		Срыв срока проектирования объекта		+
		Срыв срока подготовительных мероприятий	+	+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности	+	
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг		+
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		+
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения		+
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+

Резюме проекта

<p>Концессионер</p> <p>ЗАО «Медицинский центр «Авиценна»</p>	<p>Нежилые помещения в подвале, на 1 и 2 этажах в здании роддома</p>	<p>Срок реализации проекта</p> <p>22 года</p>
<p>Общий объем инвестиций в проект</p> <p>97,5 млн рублей</p>	<p>Объем инвестиций концессионера (в т.ч. концессионная плата)</p> <p>97,5 млн рублей</p>	<p>Минимальный объем проведения ЭКО – 4 чел./мес. (48 чел./год)</p>

Фотографии объекта



3) Проект – Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. Самара

Основные параметры проекта	Значение	
1	Предмет проекта	Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. Самара. Концессионер: проектирование, строительство, оснащение и эксплуатация Центра. Концедент: аренда земельного участка, содействие в реализации проекта.
2	Статус проекта	Ведется строительство Центра
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ, распоряжение Правительства Самарской области от 24.12.2013 № 878-р).
4	Участники проекта	Концедент – Правительство Самарской области, концессионер – ООО «ФАРМ СКД»
5	Объекты соглашения	Создание Центра
6	Срок реализации проекта	15 лет (срок создания и ввода в эксплуатацию Центра – 32 месяца, срок использования (эксплуатации) концессионером Центра – 12 лет 4 месяца с даты государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера Центра).
7	Периоды реализации проекта	Декабрь 2013 года – публикация извещения о проведении конкурсного отбора. Февраль 2014 года – подача заявок на участие в конкурсном отборе. Апрель 2014 года – предварительный отбор участников конкурса, рассмотрение предложения участников конкурса. Июнь 2014 года – заключено концессионное соглашение. Декабрь 2014 года – предоставлен земельный участок. Март 2015 года – зарегистрирован договор аренды на земельный участок. Декабрь 2015 года – получено разрешение на строительство. Февраль 2017 года – ввод в эксплуатацию Центра. Март 2017 года – июнь 2029 года – эксплуатация Центра.
8	Общая стоимость проекта	350,0 млн. рублей
9	Участие концедента	Предоставление земельного участка в аренду
10	Участие концессионера	1. Оснащение современным медицинским оборудованием в количестве 48 аппаратов «Искусственной почки». 2. Строительство здания медицинского учреждения, состоящее из трех блоков (отделения диализа, отделения переливания крови, стационара) общей площадью 4593,77 кв. метров. Отделение диализа

имеет отдельный вход. Центр будет соединен переходом в основной корпус ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина».

3. Организация парковочных мест на 50 автомобилей.


4. Количество оказываемых услуг 280 пациентам и проведение до 52500 процедур гемодиализа в год.

11	Объем финансирования капитальных затрат	Проектирование и строительно-монтажные работы – 250,0 млн. рублей, оснащение Центра – 100,0 млн. рублей. Собственные средства 70%, заемные средства 30%
12	Объем финансирования операционных затрат	2 064,5 млн. рублей


Социально-экономический эффект реализации проекта

Параметр 1	Увеличение емкости существующего центра на 24 диализных места до 48 аппаратов искусственной почки
	Увеличение количества оказываемых услуг более чем на 28 000 гемодиализов в год
Параметр 2	Возможность дополнительно принять на заместительную почечную терапию 180 пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек и увеличит обеспеченность диализными методами ЗПТ с 323 человек на млн. населения до 380 человек на млн. населения
	Введение в строй новых мощностей избавит от четырехсменного режима работы и снизит избыточную нагрузку на персонал ЛПУ и диализное оборудование, приведя работу к нормативным показателям
	Организационно-штатные мероприятия позволят ввести дополнительно 93 рабочих мест
Параметр 3	Расширение коечного фонда до 20 коек по профилю нефрология позволит увеличить качество и доступность медицинской помощью как пациентам находящимся на диализе, так и пациентам вводимых в программу заместительной почечной терапии
	При реализации проекта будет организован единый научно-методический референт центр для подготовки профессиональных кадров как для нужд Самарской области, так и для других регионов РФ

Правовая структура проекта

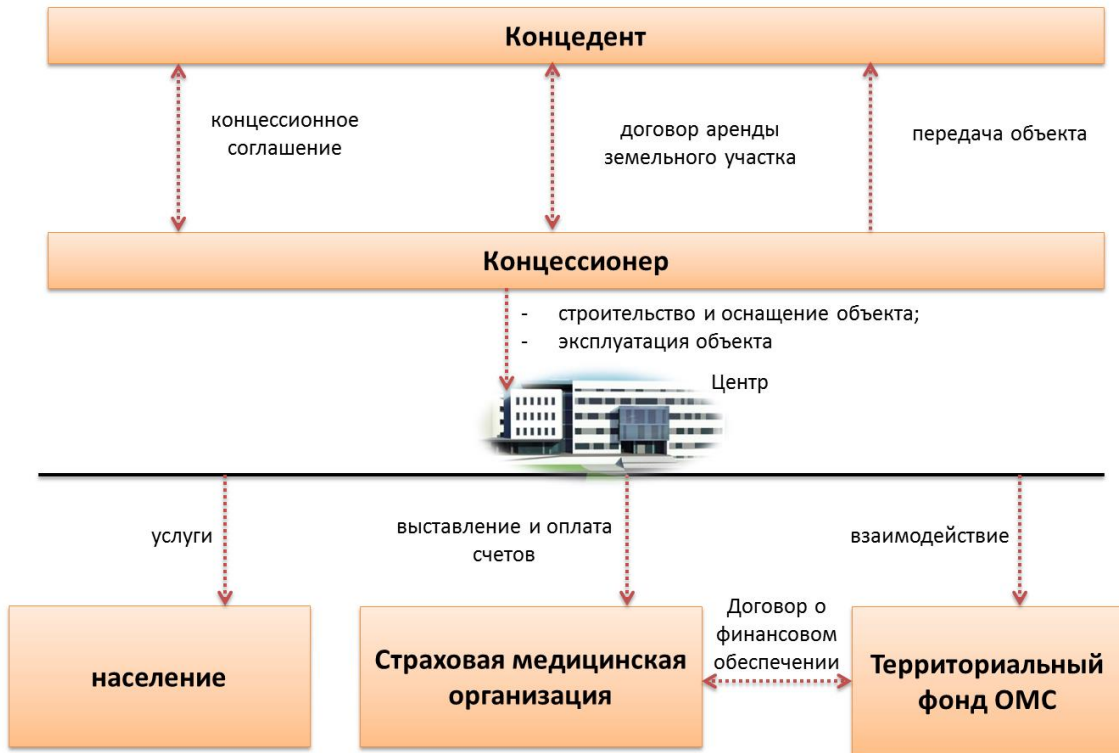

Финансовая структура проекта

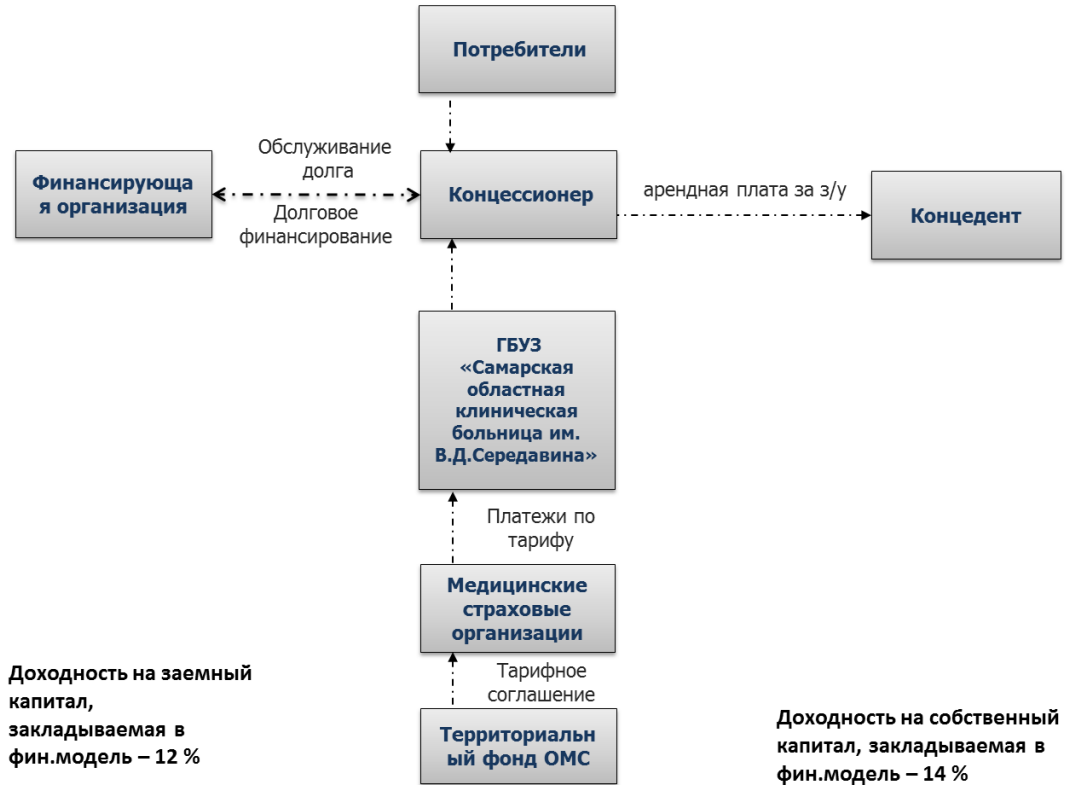

Этапы реализации проекта

Этап	Описание этапа	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год	2029 год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.
1. Прединвестиционный этап																			
1.1.	Структурирование проекта	■	■	■	■														
1.2.	Проведение конкурсных процедур				■	■	■	■											
1.3.	Проведение работ по выбору земельного участка					■	■	■	■	■	■								
1.4.	Проектирование здания Центра					■	■	■	■	■	■	■	■	■					
1.5.	Получение разрешения на строительство												■						
2. Инвестиционный этап																			
2.1.	Строительство здания Центра																	■	■
2.2.	Получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию																		■
3. Эксплуатационный этап																			
4.	Завершение проекта																		■

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	✓	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	✓	
		Подготовка земельных участков		✓
		Срыв срока проектирования объекта		✓
		Срыв срока подготовительных мероприятий	✓	✓
2	Риски создания объекта	Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		✓
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		✓
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют	✓	✓
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		✓
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		✓
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют	✓	✓
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		✓
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		✓
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		✓
4	Риски получения дохода	Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг	✓	✓
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	✓	✓
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		✓
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера		✓
		Расторжение соглашения по вине частного партнера	✓	
		Утрата объекта соглашения	✓	✓
		Форс-мажорные обстоятельства	✓	✓

Резюме проекта

Концессионер –
ООО «ФАРМ СКД»

Мощность объекта соглашения:
площадь 4593,77 кв. метров;
этажность 4-5;
мощность: 48 аппаратов
«Искусственной почки»

Срок реализации проекта –
15 лет

Общий объем инвестиций в проект составляет
350,0 млн. рублей

Объем инвестиций концессионера составляет
350,0 млн. рублей,
концессионная плата отсутствует

Объем оказываемых услуг по тарифам ОМС
85% - предоставление услуг в системе ОМС;
15% - предоставление платных услуг


Капитальные и операционные инвестиции концедента отсутствуют
(в т.ч. плата концедента)

Бюджетная эффективность проекта (НДФЛ (13%), страховые взносы (30,2%), налог на имущество (2,5%), НДС (10%), прибыль после возврата инвестиций (20%)
36,6 млн. рублей в год;
545,5 млн. рублей за время действия проекта

Рентабельность и окупаемость проекта
NPV – 40,4 млн. руб.
IRR – 14%

Социально-экономическая эффективность
снижение смертности, оказание высокотехнологической помощи, улучшение качества предоставления услуг, создание 93 рабочих мест, закрытие очередности

Фотографии объекта

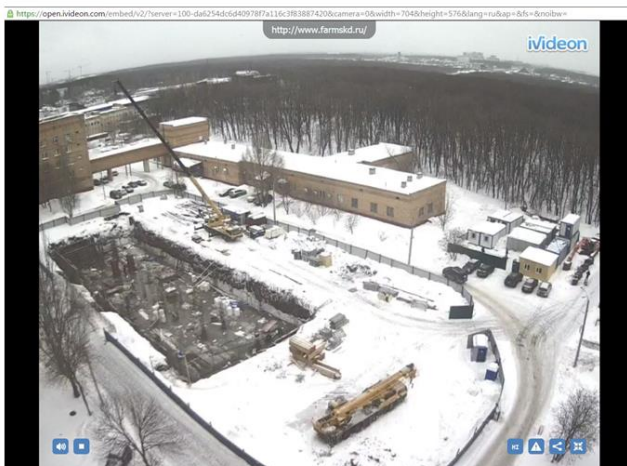

по состоянию на 18.02.2016



по состоянию на 21.04.2016

и) Проект – Реконструкция полотняного завода (Калужская область)

О проекте

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	<i>проект в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. в пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области</i>
2	Статус проекта	<i>реализация проекта</i>
3	Форма реализации проекта	<i>27 августа 2012 года было заключено концессионное соглашение</i>
4	Участники проекта	Концедент: Калужская область, в лице министерства экономического развития Калужской области. Концессионер: закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Альпинэкс Австрия»
5	Объекты соглашения	Здание Каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): проведена частичная реставрация, общее состояние неудовлетворительное, состояние крыши аварийное, требуется завершение ремонтно-реставрационных работ, по назначению не используется, требуется проведение полного комплекса работ по благоустройству территории, отсутствует гидроизоляция объекта. Общая площадь здания: 451,3 кв.м. Износ строения: более 30%. Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев по территории участка проходит ЛЭП. Здание Ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): Состояние: Аварийное, руинирован, по назначению не используется, требуется проведение полного комплекса работ по благоустройству территории. Общая площадь здания: 1062,7 кв.м. Износ строения: более 80%. Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев по территории участка проходит ЛЭП располагается вблизи жилой застройки ул. Трудовая.
6	Срок реализации проекта	49 лет
7	Периоды реализации проекта	Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): Отборочные процедуры: 2012 г. Составление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия: 2012-2014 г. Реконструкция объекта: 2014-2015 г. Эксплуатация объекта: с 2016г. 25.12.2015 г. здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых) было сдано в эксплуатацию. Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): Отборочные процедуры: 2012 г. Составление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия: 2012-2014 г. Реконструкция объекта: 2014-2016 г. Эксплуатация объекта: с 2017г.
8	Общая стоимость проекта	Частные инвестиции – не менее 90 млн. руб. Государственные инвестиции – 0 руб
9	Участие концедента	Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектами соглашения для осуществления деятельности в соответствии с условиями соглашения. Концедент обязуется передать концессионеру, а концессионер обязуется принять объекты


соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами не позднее 30 календарных дней с даты подписания соглашения.

10	Участие концессионера	<p>Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. 2. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 3. Работы по кровле здания и замена временной кровли на металлическую. 4. Ремонтно-реставрационные работы по оконным и дверным блокам, работы по остеклению оконных блоков. 5. Проведение электрической системы, системы водоснабжения, водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям объекта. 6. Завершение работ по фасадам здания. 7. Проведение работ по приспособлению помещений 1-го этажа объекта под современное использование. 8. Проведение работ по приспособлению помещений 2-го этажа объекта под современное использование. 9. Проведение работ по приспособлению помещений цокольного этажа объекта под современное использование. 10. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту. <p>Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составление проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. 2. Проведение работ по санитарной рубке самосевной растительности и уборке территории объекта от строительного мусора. Организация строительной площадки для проведения работ по реставрации объекта культурного наследия. 3. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 4. Усиление фундаментов объекта. 5. Усиление сохранившейся южной и восточной стены здания. 6. Восстановление стен и крыши здания. 7. Проведение инженерных систем. 8. Организация стен и перегородок. 9. Создание внутренних интерьеров, установка оборудования гостиницы и кафе. 10. Проведение электрической системы, системы водоснабжения, водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям объекта. 11. Проведение работ по приспособлению помещений 1-го и 2-ого этажей под современное использование. 12. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту. 13. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту.
11	Объем финансирования капитальных затрат	Частные инвестиции – 90 млн. руб.
12	Объем финансирования операционных затрат	Бюджетного финансирования не предусмотрено.

Социально-экономический эффект реализации проекта

<p>Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской обл. от 22.12.2015 № 133-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"</p>	<p>Формирование социокультурной коммуникации (Полотняный завод как центр взаимодействия)</p> <p>Успешная социализация подрастающего поколения</p>
<p>Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области»</p>	<p>Проект способствует сохранению объекта культурного наследия, увеличению его стоимости более чем на 90 млн. руб.</p> <p>Привлечение дополнительных средств в бюджет за счет развития туристической деятельности</p>

Правовая структура проекта

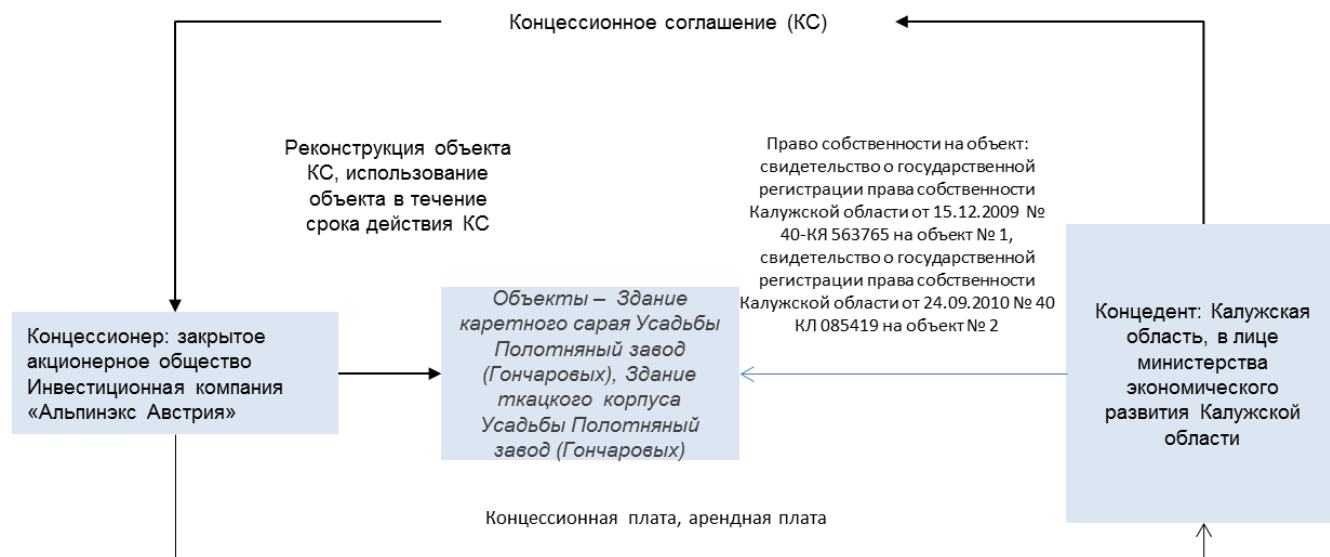

Распределение рисков проекта

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	
		Обеспечение инженерных коммуникаций	+	
		Подготовка земельных участков	+	
		Срыв срока проектирования объекта		+
		Срыв срока подготовительных мероприятий		+
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов		+
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности		+
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг		+
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		+
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения		+
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+
		Иные риски	+	+

Резюме проекта

**Концессионер: закрытое акционерное общество
Инвестиционная компания
«Альпинэкс Австрия»**

Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами и нормативными актами субъекта Российской Федерации льготы, в том числе по оплате товаров, работ, услуг

**Срок реализации проекта:
49 лет**

Общий объем инвестиций в проект: не менее 90 млн. руб.

Социально-экономическая эффективность: осуществление деятельности по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, организация комплексного туристического обслуживания и иной деятельности, связанной с указанной, с использованием объектов Соглашения

Объем инвестиций концессионера (в т.ч. концессионная плата): 92 213 185 руб.

Капитальные и операционные инвестиции концедента (в т.ч. плата концедента): не предусмотрено

Бюджетная эффективность проекта: более 92 млн. руб.

Фотографии объекта



к) Проект – Создание Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества в городе Ижевске (Удмуртская Республика)

О проекте

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	<i>Создание Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества</i>
2	Статус проекта	<i>Частичная реконструкция и ремонт здания; оснащение мебелью, учебным и лабораторным оборудованием, апробация новых образовательных программ и технологий</i>
3	Форма реализации проекта	<i>Соглашение о государственно-частном партнерстве (региональное законодательство)</i>
4	Участники проекта	<i>Министерство образования и науки Удмуртской Республики, АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий»</i>
5	Объекты соглашения	<i>Площади АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», расположенного по адресу: г. Ижевск, пер. Северный д.9а, площадь здания: 2134,9 кв.м, 1931 года постройки.</i>
6	Срок реализации проекта	<i>2015 – 2025 гг.</i>
7	Период реализации проекта	<i><u>Июнь 2015 - май 2016</u>: разработка нормативно-правовой документации; частичная реконструкция и ремонт здания; оснащение мебелью, учебным и лабораторным оборудованием, формирование штата, заключение контрактов и соглашений; апробация новых образовательных программ и технологий; методическое сопровождение и обучение педагогов, реализующих новые учебные программы научно-технической направленности <u>Июнь 2016 - май 2017</u>: реконструкция и ремонт здания и прилегающей территории, оснащение кабинетов учебным и лабораторным оборудованием; продолжение апробации новых образовательных программ и технологий и методического сопровождения и обучения педагогов, реализующих новые учебные программы научно-технической направленности <u>Июнь 2017 -май 2025</u>: расширение сферы услуг доп. образования научно-технической направленности; постоянная модернизация информационно-образовательной среды доп. образования; создание инновационной среды продвижения передовых идей и активных практик дополнительного технического образования детей</i>
8	Общая стоимость проекта	<i>30 млн. рублей</i>
9	Объем финансирования капитальных затрат	<i>Собственные средства инвестора: 1 млн. руб. Привлеченные средства инвестора: 29 млн. руб.</i>

Социально-экономический эффект реализации проекта

Выполнение показателей СЭР региона

Ежегодно в Республиканский центр детского и молодежного инновационного творчества планируется привлечь на образовательные мероприятия более 3 000 обучающихся и воспитанников, что позволит увеличить долю детей, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях к 2020 году до 8%.

Занятость дополнительным образованием детей в Удмуртской Республике к 2020 году составит 71%

Создание единого образовательного пространства научно-технической направленности при сетевом взаимодействии образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального образования в Удмуртской Республике, что позволяет расширить географию участников образовательного процесса

Увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики за 2015 – 2025 гг.

Создание 15 новых рабочих мест

Правовая структура проекта



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРОЕКТА

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер	Частный партнер
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков		
		Обеспечение инженерных коммуникаций		
		Подготовка земельных участков		
		Срыв срока проектирования объекта		+
2	Риски создания объекта	Срыв срока подготовительных мероприятий		+
		Ликвидация последствий действий третьих лиц		+
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта		+
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию		+
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции		+
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.	+	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют		+
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции	+	
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу		+
4	Риски получения дохода	Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов	+	
		Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности		+
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг		+
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг		+
5	Прочие риски	Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг		+
		Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	
		Расторжение соглашения по вине частного партнера		+
		Утрата объекта соглашения		+
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР:
АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий»

МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ:

более 3 000 обучающихся и воспитанников

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

2015-2025 годы

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ:
30 млн. руб.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА:
собственные средства - 1 млн. руб.
привлеченные средства - 29 млн. руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1. Увеличение занятости дополнительным образованием
2. Увеличение налоговых поступлений
3. Создание новых рабочих мест

Фотографии объекта



СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ ЖКХ

Водоснабжение/водоотведение

Характеристики отрасли

- 200 млрд. руб. – годовой оборот водоснабжения
- 34,95 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения
- 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных программ организаций в сфере водоотведения
- 1509 тарифных решений в сфере водоснабжения (что составляет 10,4% от общего числа)
- 571 тыс. км – протяженность сетей

а) Проект - Водоканал в г. Санкт-Петербурге

Организация: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Форма реализации: Концессионное соглашение

Очистка 98,4% всех сточных вод

Система водоснабжения:

- 6938,2 км водопроводных сетей
- 194 повысительных насосных станций
- 9 водопроводных станций
- 2 завода по производству гипохлорита натрия

Система водоотведения:

- 8421,8 км канализационных сетей
- 264,4 км тоннельных коллекторов
- 154 канализационных насосных станций
- 15 очистных канализационных сооружений

Технология глубокого удаления биогенов (азота и фосфора)

Потребитель:

- Население: 5 млн. человек
- Десятки тысяч предприятий и организаций

С 2013 года на территории очистных сооружений поселка Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга проходят реабилитацию ластоногие, попавшие в беду: серые тюлени и кольчатые нерпы (балтийские и ладожские).

Фотографии объекта



б) Проект - Водоканал в г. Тверь

Организация: ООО «Тверь Водоканал»

Форма реализации: Концессионное соглашение

Очистка 100% всех сточных вод

Система водоснабжения:

- 684,7 км водопроводных сетей
- 40 повысительных насосных станций
- 2 водопроводные станции
- 2 электролизные станции мембранного типа для производства хлорной воды, предназначенной для обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод

Система водоотведения:

- 473,6 км канализационных сетей
- 47 канализационных насосных станций
- 1 очистное канализационное сооружение

Технология обратного осмоса для подготовки части питьевой воды

Потребитель:

- Население 0,41 млн. человек
- Тысячи предприятий и организаций

Водоотведение

Характеристики отрасли

- 148,7 млрд. руб. - годовой оборот водоотведения
- 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных программ организаций в сфере водоотведения
- 1020 тарифных решений в сфере водоотведения (что составляет 13,4% от общего числа).
- 192 тыс. км - протяженность сетей

в) Проект - Системы водоснабжения и водоотведения г. Волгограда

Организация: Группа Компаний «МОРТОН»

Форма реализации: Концессионное соглашение

Объект: Водоочистное сооружение, КОС 40 000 м куб./сут.

Сокращение затрат за счет технологий:

- до 30 % от стоимости строительства
- более чем на 45% себестоимость очистки воды

Строящиеся объекты:

- Водоочистное сооружение МО, мкр-н Путилково, КОС 12 500 м куб./сут.
- Водоочистное сооружение МО, мкр-н Дрожжино-Боброво, КОС 40 000 м куб./сут .
- Водоочистное сооружение: МО Балашиха, мкр-н Салтыковка, д. Акатово

Фотографии объекта



Теплоснабжение

Характеристики отрасли

- 1 067 млрд. руб. - годовой оборот теплоснабжения
- 62,29 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения
- 3201 тарифное решение в сфере теплоснабжения (19,1 % от общего числа)
- 168 тыс. км - протяженность сетей

г) Проект - Твердотопливная биокотельная в д. Тургенево Владимирской области

Организация: ОАО «БИОЭНЕРГО»

Форма реализации: Концессионное соглашение

Затраты:

- Проектирование – 2,0 млн рублей
- Оборудование, СМР, теплотрасса-39,0 млн рублей

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Топливо: Торфяной брикет

Длина теплотрасс: 400 м

Технические/эксплуатационные характеристики:

Старая котельная:

- *Выработка тепловой энергии - 2650 Гкал*
- *Установленная мощность - 3,8 МВт/ч*
- *КПД котлов - 55%*
- *Потребление топлива - 1 033 т.у.т./сезон*
- *Затраты на топливо - 11 300 000 руб.*
- *Обслуживающий персонал - 6 чел./сутки*

Новая котельная:

- *Выработка тепловой энергии - 2500 Гкал*
- *Установленная мощность - 3,0 МВт/ч*
- *КПД котлов - 85%*
- *Потребление топлива - 620 т.у.т./сезон*
- *Затраты на топливо - 5 200 000 руб.*
- *Обслуживающий персонал - 1 чел./сутки*

Фотографии объекта



Твердые бытовые отходы

Характеристики отрасли

- 24 млрд. руб – годовой оборот ТБО
- 63 млн. тонн/год – обращение ТБО

д) Проект - Полигон ТБО в г. Новочебоксарск

Организация: ЗАО «Управление отходами»

Форма реализации: Концессионное соглашение

География: Новочебоксарск, Республика Чувашия

Основные технико-экономические показатели:

- Мощность мусороперегрузочной станции – 200 тыс. т/год.
- Мощность мусоросортировочного комплекса – 100 тыс. т/год.
- Объем отходов, укладываемых на участке складирования отходов – 6,28 млн. м3
- Высота складирования ТБО – 40 м.
- Планируемый объем изъятия утилизируемых фракций отходов – 20 %.
- Срок службы полигона – 42 года.
- Сумма вложенных инвестиций составляет (по сост. на 01.10.2015г.) – 987 млн. рублей.
- На строительстве объектов концессионного соглашения задействовано в среднем 185 человек.
- Предполагаемое количество рабочих при эксплуатации объекта концессионного соглашения около 300 человек.

Объекты

1. Полигон ТБО:

1.1. Участок складирования (две карты общей площадью 28,2 га.: 13,8 га, 14,4 га);

1.2. Хозяйственно-бытовая зона (площадь - 2,98 га):

- мусоросортировочный комплекс;
- административно-бытовой корпус;
- входная группа объектов (весовая платформа, дезванна);
- навесы для хранения техники;
- механизированная мойка;
- площадка для складирования дорожных железобетонных плит для строительства временных дорог на участках складирования ТБО;
- котельная;
- трансформаторная подстанция;
- пожарные резервуары.

2. Мусороперегрузочная станция

- административно-бытовой корпус;
- входная группа объектов (весовая платформа, дезванна);
- навесы для хранения техники;
- механизированная мойка;
- котельная;

- трансформаторная подстанция

Фотографии объекта



ВОПРОС-ОТВЕТ

і. Блок вопросов об объектах СГЧП (СМЧП) и КС

Вопрос

Каким образом и каким документом должна определяться обязанность по эксплуатации объекта (осуществлении деятельности с использованием объекта соглашения по его назначению), если предполагается, что её исполнять будет ГУП/МУП, государственное или муниципальное бюджетное учреждение?

Ответ

Обязанность по эксплуатации объекта в соответствии с положениями Закона о ГЧП может быть возложена на публичного партнера, что должно быть прямо предусмотрено в решении о реализации проекта, а также в соглашении о ГЧП/МЧП. Публичный партнер может делегировать эту обязанность лицам, выступающим на его стороне, что также должно быть прямо предусмотрено в решении и соглашении о ГЧП/МЧП.

Во исполнение этого условия соглашения о ГЧП/МЧП между частным партнером и публичным партнером возможно заключение договора аренды объекта или договора безвозмездного пользования

Вопрос

Считается ли наличие технологической связи между движимым и недвижимым имуществом, если под технологической связью понимать такую связь, при которой имущественный комплекс используется в едином технологическом процессе оказания услуг?

Ответ

В качестве одного из ключевых структурных элементов объекта соглашения о ГЧП / МЧП Закон о ГЧП выделяет технологическую связь, которая должна объединять отдельные объекты недвижимого имущества, а также недвижимого и движимого имущества в объект соглашения.

Юридическое значение данной связи состоит в том, чтобы ограничить включение в объект соглашения имущества, которое не является частью технологического цикла соответствующего объекта инфраструктуры и (или) не предназначено для осуществления предусмотренной таким соглашением деятельности, а также ограничить злоупотребления, связанные с возможным предоставлением публичным партнером земельных участков для размещения объектов, не связанных с публичной инфраструктурой.

Вопрос

Каким образом регистрируется обременение права собственности частного партнера?

Ответ

Возникновение права частной собственности на объект соглашения* о ГЧП, соглашения о МЧП (далее – соглашение) является существенным условием соглашения. При этом государственная регистрация права собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности на указанный объект и недвижимое имущество.

Государственная регистрация обременения (ограничения) права собственности частного партнера на объект соглашения, **осуществляется по общим основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»** (далее – Закон о регистрации).

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Кроме того, с 1 января 2017 г. часть 12 статьи 12 Закона о ГЧП действует в следующей редакции:

«12. Предусмотренные соглашением обязательства частного партнера, которые возникают после ввода объекта соглашения в эксплуатацию, являются ограничением права собственности частного партнера на объект соглашения, которое подлежит в установленном федеральным законом порядке государственной регистрации одновременно с государственной регистрацией права собственности частного партнера на объект соглашения.»

Обязательным** условием для осуществления государственной регистрации права собственности на вновь созданный объект является наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земельный участок, подтверждающего, что в период создания объекта недвижимости земельный участок принадлежал лицу, создавшему такой объект, а также был предоставлен для указанных целей.

При этом публичный партнер обязан*** предоставить частному партнеру предназначенные для реализации соглашения объекты недвижимого имущества, в том числе земельный участок (участки). При этом согласно части 1 статьи 33 Закона о ГЧП земельный участок предоставляется частному партнеру в аренду без проведения торгов на срок, не превышающий срок действия соглашения (также предусмотрено пунктом 8 части 8 статьи 39.8 Земельного кодекса).

Учитывая изложенное, а также в целях упрощения деятельности территориальных органов Росреестра по государственной регистрации обременений права собственности частного партнера на объект соглашения в соответствии с частью 12 статьи 12 Закона о ГЧП, при предоставлении публичным партнером в аренду частному партнеру земельных участков для целей строительства и (или) реконструкции объектов недвижимости необходимо в тексте договора аренды земельных участков указывать соглашение о ГЧП / МЧП в качестве основания заключения договора аренды.

* В соответствии с частями 2 и 12 статьи 12 Закона о ГЧП

** В соответствии со статьей 25 Закона о регистрации

*** В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП

ii. Блок вопросов о полномочиях публичной стороны**Вопрос**

Согласно части 5 статьи 5 Закона о ГЧП «Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.»

Каким образом и в каком документе определять эти права и обязанности, если они реализуются до заключения соглашения (разработка предложения, участие в предварительных переговорах и т.п.)?

Ответ

Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1366.

Права и обязанности, в том числе те, которые могут быть реализованы до заключения соглашения, полагаем возможным закрепить за конкретными органами и юридическими лицами отдельным актом субъекта Российской Федерации*.

* Данное предложение также относится к концессионному законодательству.

iii. Блок вопросов об участии в проектах ГУП и МУП**Вопрос**

Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие (далее – ГУП, МУП) участвовать в концессионном соглашении в качестве концессионера?

Ответ

МУПы и ГУПы могут участвовать на стороне концедента в обязательствах по КС и осуществлять отдельные полномочия концедента (часть 1.1 ст. 5 Закона). Следовательно, поскольку Закон прямо предусматривает участие МУПов и ГУПов в концессионных соглашениях на стороне концедента, они не могут выступать в качестве концессионеров.

Исключение – проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства!

Вопрос

Можно ли создать объект на земельном участке, принадлежащем на праве постоянного (бессрочного) пользования подведомственной организации

Ответ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 288-ФЗ «О государственном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соглашение должно включать в себя в том числе обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой.

Также в соответствии со статьей 33 вышеуказанного Федерального закона, земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах без проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия такого соглашения.

Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного партнера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц.

Более того, указанное положение не противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, в соответствии со статьей 269 ГК Российской Федерации лица, которым земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными участками, за исключением случаев заключения соглашения об установлении сервитута и передачи земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Таким образом, государственные предприятия, а также учреждения не вправе каким-либо образом распоряжаться земельным участком, переданным им в пользование.

Исходя из вышеизложенного, следует, что при реализации соглашения, земельный участок должен находиться в казне Российской Федерации и быть свободен от обременений прав третьих лиц.

iv. Блок вопросов о частной инициативе**Вопрос**

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о ГЧП инициатор проекта одновременно с направлением публичному партнеру предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП предоставляет ему выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.

Какие организации могут рассматриваться в качестве «иных кредитных организаций» в целях реализации положений указанной статьи Закона о ГЧП? В том числе, может ли в качестве независимой гарантии (банковской гарантии) выступить гарантия, выданная микрофинансовой организацией?

Ответ

Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП независимую гарантию (банковскую гарантию) инициатору проекта выдаёт банк или иная кредитная организация. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (далее – Закон № 395-1) «О банках и банковской деятельности» к кредитным организациям отнесены банки и небанковские кредитные организации.

Статьей 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» микрофинансовые организации отнесены к категории некредитных финансовых организаций, поэтому с учетом положений Закона о ГЧП микрофинансовые организации выдавать независимую гарантию (банковскую гарантию) не могут.

Вопрос

Можно ли наделить несколько региональных органов исполнительной власти правом выступать от имени публичного партнера при рассмотрении и обеспечении разработки предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП в зависимости от отраслевой принадлежности объекта?

Ответ

Согласно части 2 статьи 4 Закона о ГЧП лицо, которое может быть частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру. При этом до направления указанного предложения между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, в порядке, установленном уполномоченным органом.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1388, в случае если предложение о реализации проекта направлено инициатором в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, получатель предложения о реализации проекта определяет региональный орган исполнительной власти (далее – РОИВ), уполномоченный в рамках своей компетенции на рассмотрение данного предложения, и направляет его в указанный орган.

Таким образом, РОИВ, который будет являться публичным партнером, должен быть уполномочен в установленном порядке на рассмотрение предложения о реализации проекта и проведение публичных переговоров.

В этой связи в целях упрощения указанной процедуры полагаем целесообразным Правительству субъекта Российской Федерации принять нормативный правовой акт, определяющий полномочия РОИВ (как вариант – внесение изменений в положения соответствующих РОИВ) по рассмотрению предложений о реализации проекта ГЧП/МЧП и проведению предварительных переговоров с инициатором проекта.

Вопрос

ООО «Инфраструктура» в качестве концессионера планирует выйти с инициативой в рамках Закона о КС по проекту реконструкции спортивного объекта. Объект расположен на территории ФГБОУ ВПО «Академия» в гор. N (федеральная собственность). В то же время теплогенерирующее оборудование, обеспечивающее ФГБОУ ВПО «Академия» сильно изношено и имеет низкий КПД. Вместе с тем теплоснабжение воздухоопорного сооружения требует реконструкции котельной (муниципальная собственность).

Насколько целесообразно выводить котельную в отдельное концессионное соглашение, подавать отдельное предложение частной инициативы. Или же все-таки заключать общий договор концессии?

Ответ

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о КС концессионное соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов концессионных соглашений за исключением случаев, если объектами концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений допускается, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Таким образом, заключение концессионного соглашения в отношении котельной и футбольного поля считаем невозможным.

Вопрос

Для обращения частного партнера от него должен быть проект и положительное заключение экспертизы или достаточно задания на проектирование объекта?

Ответ

Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП лицо, которое в соответствии с Законом о ГЧП может быть частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 утверждена форма, пунктами 29 и 30 которой предусмотрено соответственно представление задания на проектирование объекта и проектной документации на объект.

Согласно пункту 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

Таким образом, в зависимости от этапа направления предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства лицо, которое в соответствии с Законом может быть частным партнером, должно направить публичному партнеру проектную документацию и положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае их наличия. В случае их отсутствия необходимо представить задание на проектирование объекта.

Вопрос

Согласно пункту 4 части 4.11 статьи 37.7 Закона о КС инициатор должен соответствовать, в том числе, следующему требованию: наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015г. № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения» содержится лишь общая формулировка, что в случае привлечения заявителем заемных средств предоставляется копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией.

Какими документами может подтверждаться соответствие указанному требованию? Верно ли, что заемные средства могут быть привлечены только от кредитной организации?

Ответ

Если иное не установлено нормативными правовыми актами, соответствие указанному требованию может подтверждаться различными документами по выбору заявителя, в том числе выпиской по расчетному счету или письмом кредитной организации. В случае привлечения заемных средств, соответствие указанному требованию подтверждается документом, выданным кредитной организацией.

Вопрос

Статьей 37 Закона о КС предусмотрена возможность частной концессионной инициативы.

Представляется возможной ситуация, в которой с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении одного и того же объекта с разницей в несколько дней обратятся два лица.

Возможе ли отказ от рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения о случае наличия ранее поступившего предложения в отношении того же объекта? Возможен ли отказ от заключения концессионного соглашения по предложению, поступившему позднее?

Ответ

Согласно части 4.4 статьи 37 Закона о КС орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, (далее – уполномоченный орган) рассматривает такое предложение и принимает решение о возможности (невозможности) заключения концессионного соглашения. При этом основания для отказа в заключении концессионного соглашения поименованы в части 4.6 статьи 37 Закона о КС.

Решение, принимаемое уполномоченным органом, не является окончательным решением по проекту и не может служить основанием для проведения конкурса (или заключения концессионного соглашения без конкурса).

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о КС решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством:

- 1) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат Российской Федерации, за исключением объектов концессионного соглашения, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, - Правительством Российской Федерации;
- 2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации;
- 3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
- 4) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат муниципальному образованию, - органом местного самоуправления.

Таким образом, в указанной ситуации при поступлении нескольких «частных концессионных инициатив» в отношении одного объекта уполномоченный орган лишь оценивает такие предложения и вправе принять решения о возможности заключения концессионных соглашений по всем поступившим предложениям, однако окончательное решение заключать ли концессионное соглашение в отношении объекта и на каких условиях принимается Правительством Российской Федерации (органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления).

v. Блок вопросов о конкурсных процедурах

Вопрос

Конкурс объявляется в связи с поступившими публичному партнеру заявлениями иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП, решение о заключении которого принято на основании предложения инициатора проекта. Допустимо ли включать в условия проведения конкурса обязанность победителя конкурса компенсировать инициатору проекта затраты на подготовку предложения о реализации предложения?

Ответ

В решении о заключении соглашения о ГЧП/МЧП рекомендуем указывать размер расходов инициатора проекта на подготовку предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015г. № 1387, в заявлении о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП заявитель обязан указать предлагаемый им порядок компенсации затрат инициатора проекта. При принятии решения о проведении конкурса (в случае отсутствия специальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или муниципальных правовых актов) публичный партнер может определить в конкурсной документации порядок исполнения победителем обязанности по возмещению инициатору проектов понесенных им расходов.

Вопрос

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О концессионных соглашениях» концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложениях не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений

Означает ли указанное положение, что даже в случае если оставшийся срок предоставления заявок превышает 30 рабочих дней, то в любом случае срок подачи заявок должен быть продлен на 30 рабочих дней со дня внесения изменений?

Кроме того, распространяется ли правило о продлении срока предоставления конкурсных предложений на случай если, например, изменения вносятся в день подписания протокола проведения предварительного отбора (т.е. когда срок на подачу конкурсных предложений еще не начал течь)?

Ответ

При внесении изменений в конкурсную документацию срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений в обязательном порядке должен быть продлен только в случае, если оставшийся срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений составляет менее 30 рабочих дней.

В рассматриваемой ситуации (внесение изменений в конкурсную документацию в день подписания протокола предварительного отбора) минимальный срок представления конкурсных предложений (не менее 60 рабочих дней) превышает минимально установленный частью 6 статьи 23 Закона срок 30 рабочих дней, что делает продление срока представления конкурсных предложений нецелесообразным.
